Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

Dirección de Programación Presupuestal
Núm. Oficio AMPP/0569/22
Aguascalientes, Ags. 8 de Diciembre del 2022
Asunto: Validación de Expediente Técnico

C.P. SERGIO ARTURO LOZANO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 17 fracción XV, 60 fracción XVI y 76 fracción VI del Reglamento del Sistema Integral de Desarrollo Municipal y del Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes, hago referencia al oficio **SOPMA/2697/2022** recibido por este Instituto el día 8 de Diciembre del 2022 por parte de la **Secretaría de Obras Públicas Municipales**, mediante el cual remiten el expediente técnico original de la siguiente obra para su análisis, registro y priorización, conforme al Programa Anual de Obra Pública y Programas Sociales para el ejercicio presupuestal 2022:

DEPENDENCIA EJECUTORA:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO:	SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE
UBICACIÓN:	BLVD. JOSÉ MARÍA CHÁVEZ, ENTRE LÍMITE SUR TEATRO AGUASCALIENTES Y CALLE VALENTE QUINTANA, VARIAS COLONIAS, AGUASCALIENTES, AGS.
FONDO DE INVERSIÓN:	PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL
IMPORTE:	$2,579,346.25 (ET FINAL)
No. DE OBRA:	2022-PDM-0100-UR-0104
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
EJE:	MUNICIPIO SOBRESALIENTE
ESTRATEGIA:	OBRA PÚBLICA INTELIGENTE
POLITICA:	5.8.1.REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIALIDADES, CAMINOS, CALLES, ÁREAS DE TERRACERÍA Y CAUCES (COM.

Al respecto, hago de su conocimiento que dicho expediente ha sido analizado en su integración técnica y documental, con base en el artículo 168 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Asimismo, le comento que este Instituto valida dicha obra acorde a lo establecido en los artículos 14, 22 párrafo segundo y 23 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la cual se encuentra alineada al Plan de Desarrollo Municipal vigente, para dar cumplimiento a las metas establecidas en el mismo.

Cabe hacer mención que los recursos solicitados para este proyecto de inversión, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal para el presente ejercicio fiscal que determine la Secretaría a su digno cargo. Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ARQ. AUSTRIA GABRIELA DÁVILA DE LA LLAVE
DIRECTORA GENERAL DEL IMPLAN

CAAR / JDBC
C.c.p. I.C. ING. MIGUEL ÁNGEL HUIZAR BOTELLO .- Secretaría de Obras Públicas Municipales .Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes

Antonio Acevedo Escobedo 103 A. Col. Centro
Aguascalientes. Ags. C.P. 20000

(449) 9101010 Ext. 3117

www.implanags.gob.mx

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

IMPLAN

ANÁLISIS INTEGRAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO

No. DE OBRA (PAOP 2020):	2022-PDM-0100-UR-0104	REGISTRO No.	208
OFICIO DE VALIDACIÓN:	AMPP/0569/22	FECHA RECIBIDO PARA REVISIÓN:	8 de Diciembre del 2022
PROGRAMA:	URBANIZACIÓN	LOCALIDAD O COLONIA:	VARIAS COLONIAS
SUB-PROGRAMA:	Pavimentación (Const., Ampliación y Rehabilitación)	DELEGACIÓN:	Aguascalientes
DEPENDENCIA:	Secretaría de Obras Públicas Municipales	MOD. DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
NOMBRE DE LA OBRA:	SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSÉ MARÍA CHÁVEZ, ENTRE LÍMITE SUR TEATRO AGUASCALIENTES Y CALLE VALENTE QUINTANA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL, PDM		
INVERSIÓN:	$2,579,346.25	CLASIFICACIÓN DE OBRA:	BIENES DE DOMINIO PUBLICA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	DIFERENCIA ENTRE MOD.
$2,579,346.25	0.00	0.00	$2,579,346.25	0.00	0.00	*$120.524,61*

TIPO DE EXPENDIENTE:	ET FINAL	AÑO: 2022	AÑO:	AÑO:		
AVANCES:	Financiero: 30 %	Físico: 90 %				
FECHA DE INICIO:	5 de Octubre del 2022	FECHA DE TÉRMINO:	18 de Noviembre del 2022	REGISTRO SIMA:	100	

CHEK LIST DE LOS ANEXOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

CÉDULA DE REGISTRO DE OBRA	✓
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	✓
MEMORIA DESCRIPTIVA	✓
PRESUPUESTO BASE	✓
FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES	✓
PLANOS O ESTUDIOS TÉCNICOS	✓
PADRÓN DE BENEFICIARIOS	N/A
ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO	N/A
DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL	N/A
CONVENIO DE CONCERTACIÓN	N/A
ACTA CONSTITUTIVA	N/A

METAS		BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		OBRA PROPUESTA		CLAVE SISCO
UNIDAD DE MEDIDA	CANT	TIPO DE BENEFICIARIOS	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	CONCEPTO	JORNALES A GENERAR	
M2	4013.50	Personas	400	2022-10-05	2022-11-18	Todos los Campos Anteriores, exceptuando Gastos Indirectos y PRODIM	6706	2369

INCLUIDO EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES

RECIBIO: ING. JOSÉ DAVID BURGUETE CLAUSTRO

Analista de Programación e Inversión de Obra Pública

8 de Diciembre del 2022

Fecha de validación

8 de Diciembre del 2022

Fecha de validación Expediente

PROCEDE Si ✓ No

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

CEDULA DE REGISTRO POR OBRA

Aguascalientes

050400-001E00E05-05-2-2-1-00-1-E-0510-0-17-0100-21-1111-6144

-2022-PDM-0100-UR-01-017	Obra **SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ**
Tipo DEFINITIVO I 2022 Folio SISCO **2369**	Ubic. TRAMO: ENTRE LÍMITE SUR TEATRO AGUASCALIENTES Y CALLE VALENTE QUINTANA, AGUASCALIENTES Mpio.

Ent. Ejecutora : **050400001E00E05**

Eje: **05**	MUNICIPIO SOBRESALIENTE
Finalidad: **2**	DESARROLLO SOCIAL
Función: **2**	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Subfunción: **1**	URBANIZACIÓN
Tema: **00**	SIN TEMA
Cuenta del Gasto **1**	GASTO PROGRAMABLE
Clasif. Programatica: **E**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Programa: **0510**	Movilidad Urbana
SubPrograma: **0**	SUBPROGRAMA GENÉRICO
Proyecto: **17**	
Tipo de Gasto: **21**	GASTO INVERSIÓN / OBRA PÚBLICA

I N V E R S I O N 2022

Municipal	1111	RECURSO PROPIO 2022	$1,376,545.27
Municipal	1521	EXCEDENTES PARTICIPACIONES 2022 2022	$1,202,800.98

Folio SIMA 100 Total $2,579,346.25

M E T A S

Unidad de Medida	Cantidad	Descripción
M2	4013.5	SOBRECARPETA ASFÁLTICA SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ

Inversión Ejercida Total al 31 de Diciembre de 2021 $0.00

Avance Fisico Acumulado al 31 de Diciembre de 2021

Avance Fisico Acumulado Programado al 31 de Diciembre de 2022 100 %

Fecha de Inicio 05 Oct 2022 Fecha de Terminación 18 Nov 2022

Jornales a Generar en 2022 6706

Modalidad de ejecución CONTRATO

Clasificación de la Obra Bienes de Dominio Público

Registro del Patrimonio: Obras del dominio público

OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

GENERALES

Nombre del Proyecto : SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ

TRAMO: ENTRE LÍMITE SUR TEATRO AGUASCALIENTES Y CALLE VALENTE QUINTANA, AGUASCALIENTES Mpio.

Programa : UR URBANIZACIÓN

Subprograma : 01 PAVIMENTACIÓN (CONST., AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN) (d).- Sobrecarpeta)

Clave del Municipio : AGUASCALIENTES

Localidad :

Barrio, Colonia o Ejido : AGUASCALIENTES Mpio.

Tipo de Obra : NUEVA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ

PRELIMINARES 4,013.50 M2
DEMOLICIONES 4,013.50 M2
BACHEO PROFUNDO 165.21 M3
SOBRECARPETA ASFÁLTICA 4,013.50 M2
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 1.00 OBRA

Beneficiarios (No. y Tipo) :

400	PERSONAS

Hombres: 200 Mujeres: 200

OBRAS PÚBLICAS

No. Folio SISCO 2369

Los abajo firmantes, hacen constar que el presente proyecto :

SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ

TRAMO: ENTRE LÍMITE SUR TEATRO AGUASCALIENTES Y CALLE VALENTE QUINTANA, AGUASCALIENTES Mpio.

cumple con los Requisitos y Normas Técnicas establecidas por la Dependencia Normativa, por lo que es viable su ejecución. Comprometiéndose la misma a proporcionar la supervisión y asistencia técnica necesaria durante el proceso administrativo.

Por la Dependencia Ejecutora

Ing. Miguel Angel Huizar Botello
Secretario de Obras Públicas

Lic. Jaime Gallo Camacho
Secretario de Desarrollo Urbano

LUGAR :AGUASCALIENTES, AGS.

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

No. Folio SISCO 2369

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

Aguascalientes LA CIUDAD DE TU VIDA

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

LOCALIZACION: TRAMO: ENTRE LÍMITE SUR TEATRO AGUASCALIENTES Y CALLE VALENTE QUINTANA, AGUASCALIENTES Mpio.

PROGRAMA: URBANIZACIÓN

SUBPROGRAMA: PAVIMENTACIÓN (CONST., AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN) (d).- Sobrecarpeta)

OBRA A REALIZAR: SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

FORMA DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA: NUEVA

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ

CARACTERISTICAS DE LA OBRA: Bueno

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE REQUIERE PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

PROCEDE: SI [X] NO [ ]

REVISÓ: Jefa del Departamento de Expedientes Tecnicos y Costos

NOMBRE: Arq. Blanca Margarita Martinez Amador

FIRMA:

FECHA: 29 Nov 2022

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

No. Folio SISCO 2369

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021 2024

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


MACRO LOCALIZACIÓN

APROBACIÓN 2022-PDM-0100-UR-01-017

NOMBRE DE LA OBRA: SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ

UBICACIÓN: TRAMO: ENTRE LÍMITE SUR TEATRO AGUASCALIENTES Y CALLE VALENTE QUINTANA, AGUASCALIENTES Mpio.

PROGRAMA: UR - URBANIZACIÓN

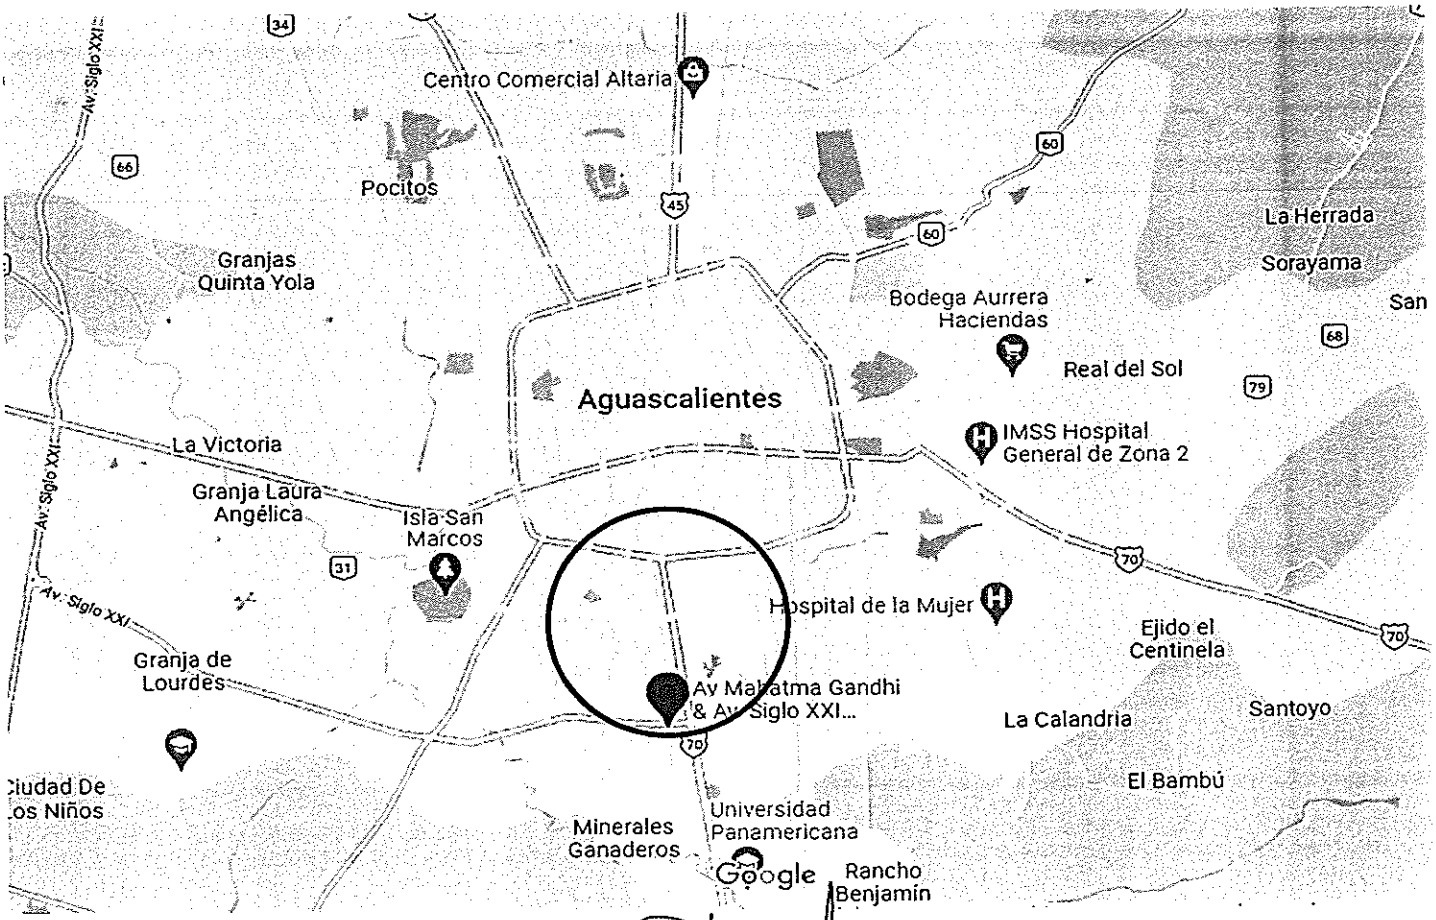

I.C. LAURA CECILIA MARTÍNEZ ALBA
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021 2024

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


MICRO LOCALIZACIÓN

APROBACIÓN 2022-PDM-0100-UR-01-017

NOMBRE DE LA OBRA: SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ

UBICACIÓN: TRAMO: ENTRE LÍMITE SUR TEATRO AGUASCALIENTES Y CALLE VALENTE QUINTANA, AGUASCALIENTES Mpio.

PROGRAMA: UR - URBANIZACIÓN

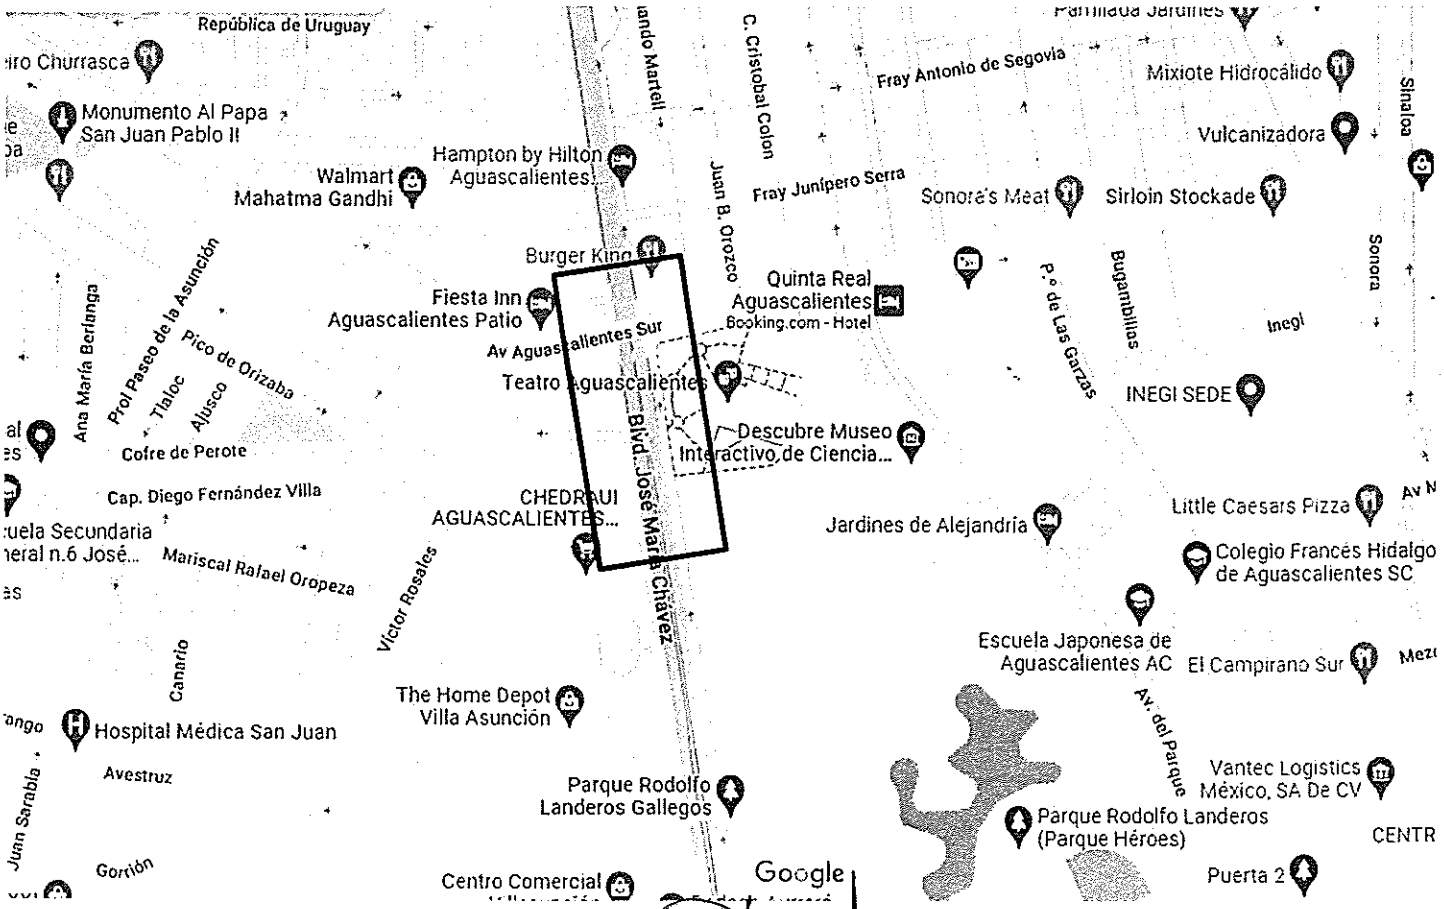

I.C. LAURA CECILIA MARTÍNEZ ALBA
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

PROGRAMA DE OBRA DEFINITIVO

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

No. DE CONTRATO : DM-0100-2022

PROGRAMA: UR - URBANIZACIÓN

INICIO VIGENTE: 05-octubre-22

No. OBRA Y NOMBRE DE LA OBRA: 2022-PDM-0100-UR-01-017 SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ, TRAMO: ENTRE LIMITE SUR TEATRO AGUASCALIENTES Y CALLE VALENTE QUINTANA, AGUASCALIENTES Mpio.

TERMINO REAL: 18-noviembre-22

RECURSO 2022

CONCEPTO				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	PONDERACIÓN %	
				2021																	
				OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FINANCIERO	FÍSICO
																				%	%
DESCRIPCION	INVERSION															5	18				
SOBRECARPETA ASFALTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSE MA. CHAVEZ																					
TRAMO: ENTRE LIMITE SUR TEATRO AGUASCALIENTES Y CALLE VALENTE QUINTANA																					
PRELIMINARES	$ 23,500.02	100														100				1.06	9.09
DEMOLICIONES	$ 247,392.14	100														50	50			11.13	18.18
BACHEO PROFUNDO	$ 217,931.82	100														50	50			9.80	18.18
SOBRE CARPETA ASFALTICA	$ 1,698,852.69	100														25	25	25	25	76.40	36.36
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	$ 35,897.70	100															50	50		1.61	18.18
SUBTOTAL SIN IVA	$ 2,223,574.36			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	1		
AVANCE SEMANAL %				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	27%	27%	9%	9%		
AVANCE SEMANAL ACUMULADO %				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	27%	54%	64%	73%	100.00	100
EJERCIDO SEMANAL $																256,152.03	697,775.15	424,713.17	424,713.17	$ 2,223,574.36	
EJERCIDO MENSUAL $				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,762,053.60	$460,612.87	$0.00	$0.00	$ 355,771.89	IVA
EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO $				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,762,053.60	2,223,574.37	2,223,574.37	2,223,574.37		
EJERCIDO SEMANAL %				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	11%	31%	19%	19%		
EJERCIDO MENSUAL %				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	79%	21%	0%	0%	GRAN TOTAL EJERCIDO	
EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO %				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	79%	100%	100%	100%	$	2,579,34

ING. LAURA CECILIA MARTÍNEZ ALBA
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

GENERALES

LOCALIDAD: SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ, TRAMO: ENTRE LÍMITE SUR TEATRO AGUASCALIENTES Y CALLE VALENTE QUINTANA, AGUASCALIENTES Mpio.

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

PROGRAMA: UR - URBANIZACIÓN

SUB-PROGRAMA:

OBRA A REALIZARSE: SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)

FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA

NUEVA CREACIÓN	X	CONSOLIDACIÓN	
COMPLEMENTARIA		AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN		EQUIPAMIENTO	

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

BUEN ESTADO	X	REGULAR		PESIMO ESTADO	

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

SE HACE ENTREGA DE LA OBRA DE ACUERDO A LAS METAS INICIALES, ATENDIENDO EL CONTRATISTA LOS DETALLES MARCADOS PREVIOS A LA ENTREGA.

PROCEDE	SI	X	NO		

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

I.C. LAURA CECILIA MARTINEZ ALBA
SUPERVISOR

PRESUPUESTO MODIFICADO

Obra: **SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE LÍMITE SUR TEATRO AGUASCALIENTES Y CALLE VALENTE QUINTANA, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (716)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **PAVIMENTO ASFALTICO**				
	PARTIDA: **PRELIMINARES**				
1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: BARRIDO, CARGA, ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO.	M2	4013.5	$5.56	$22,315.06
2	SONDEO A MANO O A MAQUINA PARA LOCALIZACION DE TUBERIAS CUALQUIER PROFUNDIDAD Y MATERIAL PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICO SANITARIAS CUIDANDO NO DAÑARLAS PARA NO INTERFERIR EN LOS SERVICIOS, INCLUYE: EXCAVACION, EQUIPO, MANO DE OBRA, REPORTE A LA SUPERVISION, RELLENOS, COMPACTACIONES, TRABAJO TERMINADO.	SONDE	1	$1,184.96	$1,184.96
			Totales por Partida		**$23,500.02**
	PARTIDA: **DEMOLICIONES**				
6	FRESADO UNIFORME DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO 5 CM MEDIANTE FRESADORA EN FRIO COMPACTA, EQUIPADA CON BANDA TRANSPORTADORA PARA CARGA DIRECTA SOBRE CAMION DE VOLTEO, INCLUYE: TRAMO DE PRUEBA AL INICIO DEL FRESADO PARA AUTORIZACION DE SUPERVISION (SUPERFICIE FRESADA UNIFORME Y SIN PROTUBERANCIAS NI ONDEOS), ACARREOS LOCALES, CARGA Y ACARREO A KM SUBSECUENTES (11 A 15 KM APROX) DE MATERIAL PRODUCTO DEL FRESADO DE CARPETA ASFALTICA EL TRASLADO SERA A PARQUE DE MAQUINARIA DE LA SOPMA, PIEZAS DE DESGASTE, COMBUSTIBLES, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, CUALQUIER VOLUMEN Y AREA,EQUIPO NECESARIO, LIMPIEZA FINA Y GRUESA, TRABAJO TERMINADO.	M2	4013.5	$61.64	$247,392.14
			Totales por Partida		**$247,392.14**
	PARTIDA: **BACHEO PROFUNDO**				
7	BACHEO PROFUNDO AISLADO UTILIZANDO MATERIAL CALIDAD BASE HIDRAULICA PARA MAS DE UN MILLON DE EJES EQUIVALENTES DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA, INCISO N.CSV.CAR.1.02.004/03 DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARR. DE LA SCT, INCLUYE: PREPARACION, PERFILADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO NECESARIO QUE SE REQUIERA PARA LOGRAR LA COMPACTACION DE 100% PVSM, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, PREPARACION DE MATERIAL, HUMEDECIDO, NIVELADO, TRASLADO DE UN PUNTO A OTRO DENTRO DE LA OBRA, EN CUALQUIER VOLUMEN, MOVIMIENTO DE MAQUINARIA P.U.O.T	M3	165.21	$1,319.12	$217,931.82
			Totales por Partida		**$217,931.82**
	PARTIDA: **SOBRE CARPETA ASFALTICA**				
8	PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE CONTACTO EN LOS EXTREMOS DONDE LA PERFILADORA NO ALCANCE POR LIMITES CON LA GUARNICIÓN, DE LA BASE EXISTENTE CON UN RASPADO SUPERFICIAL CON RETROEXCAVADORA, ELIMINANDO TECATAS QUE HAYAN QUEDADO PARA RENIVELADO, BARRIDOS ENTRE PASADA DE MOTOCONFORMADORA Y EN REMATES DE EMPATES A DETALLE A MANO INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRADERO OFICIAL INDICADO	M2	445	$30.68	$13,652.60

Obra: **SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE LÍMITE SUR TEATRO AGUASCALIENTES Y CALLE VALENTE QUINTANA, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (716)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **PAVIMENTO ASFALTICO**				
	PARTIDA: **SOBRE CARPETA ASFALTICA**				
9	RENIVELACIONES CON CONCRETO ASFALTICO MEZCLA EN PLANTA EN CALIENTE ASFALTO MODIFICADO CON POLIMERO TIPO I, CUMPLIENDO LAS NORMAS SCT REFERENTES DE CONSTRUCCCION Y CONSERVACION, GRANULOMETRIA DENSA 3/4" A FINOS, MEDIDO COMPACTO AL NOVENTA Y CINCO PORCIENTO (95%), INCLUYE CARGA Y ACARREO EN TRAMOS AISLADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES, Y MAQUINARIA Y EQUIPO AL SIGUIENTE PUNTO EN CUALQUIER VOLUEN, PERFILADO, LIMPIEZA DE HUESO Y GRAVA SUELTA, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	M3	51.8	$4,820.30	$249,691.54
10	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION DE ROMPIMIENTO LENTO (ECL-60 %), INCLUYE BARRIDO DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA A DETALLE, SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, Y APLICACION DE LA EMULSION CON EQUIPO ESPECIAL PARA ESA ACTIVIDAD, ESPREAS LIMPIAS Y ALINEADAS, EN CASO DE RECOMENDARLO EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL CONTRATISTA SE DEBERÁ DAR UN RIEGO MATAPOLVO ANTES DE COLOCAR LA CAPA DE IMPREGNACION, A RAZON DE 1.5 LT DE EMULSION POR M2, O LO QUE INDIQUE EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, NO SE ACEPTAN LEVANTAMIENTO DEL RIEGO, TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T.	M2	4013.5	$29.76	$119,441.76
11	RIEGO DE LIGA CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-65 %), INCLUYE, SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, Y APLICACION DE LA EMULSION CON EQUIPO ESPECIAL PARA ESA ACTIVIDAD, ESPREAS O BACHADOR LIMPIAS Y ALINEADAS, CONTROL DE CALIDAD A CADA DOS REMESAS EN OBRA (INDEPENDIENTEMENTE DE LA CANTIDAD A UTILIZAR) EN LA PETROLIZADORA, A RAZON DE 0.8 LT DE EMULSION POR M2, O LO QUE INDIQUE EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, NO SE ACEPTAN "IMPREGNALIGA", TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T.	M2	4013.5	$17.65	$70,838.27
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA ELABORADA CON ASFALTO PG 64-22 , AGREGADO 3/4" A FINOS, DE 5 CM DE ESPESOR TOTAL, FORMADA Y COMPACTADO AL 95%, INCLUYE MATERIALES, QUE CUMPLAN LA NORMATIVA SCT-N-CMT-04-04, SCT-CMT- 4-05-002, SCT-CMT-4-05-003, SCT-CMT-4-05-004, SCT-CTR-CAR-1-04-006-14 APLICADAS AL DIA DE HOY, DISEÑO MARSHALL (DEVERÁ SER AUTORIZADO POR EL LABORATORIO DE CALIDAD DE SOPMA AL MENOS 3 DIAS ANTES DE INICIO DE TENDIDO DE LA MEZCLA ASFALTICA), INCUYE: TRAMO DE PRUEBA AL INICIO PARA REVISION Y AUTORIZACION DEL ESPESOR POR PARTE DEL SUPERVISOR, EL CONTRATISTA DEBERÁ PREVEER EL SUMINISTRO Y TIEMPOS MUERTOS POR MOVIMIENTOS DEL TREN DE MAQUINAS DE TRABAJO EN TRAMOS AISLADOS. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. Y LIMPIEZAS DE GRANZON Y HUESO LATERAL.	M2	4013.5	$310.26	$1,245,228.51
			Totales por Partida		**$1,698,852.69**
	PARTIDA: **SEÑALIZACION HORIZONTAL**				
23	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA MARCAS DE SEÑALAMIENTO DE TRAFICO APLICADA SOBRE GUARNICIONES Y CAMELLONES DE CUALQUIER COLOR, SEGUN SE REQUIERA Y SEGUN NORMA S.C.T. SECADO AL TACTO EN 5 MIN Y AL DURO EN 30 MIN CON MICROESFERA MCA. COMEX O SIMILAR, DESARROLLO DE 35 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZAS PREVIAS I POSTERIORES DE	ML	897.8	$34.52	$30,992.06

Obra: **SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE LÍMITE SUR TEATRO AGUASCALIENTES Y CALLE VALENTE QUINTANA, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (716)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **PAVIMENTO ASFALTICO**				
	PARTIDA: **SEÑALIZACION HORIZONTAL**				
24	SUMINISTRO Y APLICACION DE LINEA CONTINUA DIVISION DE CARRILES DE FRENTE EN PISO, DE 10 CM DE ANCHO, A BASE DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR BLANCO CON MICROESFERA SEGUN NORMA SCT, MCA. COMEX O SIMILAR, SECADO AL TACTO EN 5 MIN Y AL DURO EN 30 MIN. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, TRAZO, ENMASCARILLADO, LIMPIEZAS PREVIAS Y POSTERIORES A LA SUPERFICIE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO.	ML	448.9	$8.70	$3,905.43
25	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA M - 7.1, RAYA PARA INDICAR CRUCE PEATONAL, COLOR AMARILLO REFLEJANTE, CON MICROESFERA DE VIDRIO SOBRE LA PELICULA HUMEDA EN PROPORCION DE 700g/litro SEGÚN NORMA SCT DE 0.40 MTS DE ANCHO Y 3.5 MTS. DE LONGITUD POR EL ANCHO DE LA VIALIDAD, CON UNA SEPARACION DE 0.40 MTS. DE SEPARACIÓN ENTRE ELLAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMIEZA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCCIÓN, LIMPIEZA, TRABAJO TERMINADO.	M2	13.5	$74.09	$1,000.22

Totales por Partida		**$35,897.70**
Totales por Grupo		**$2,223,574.36**
Totales Presup.		**$2,223,574.36**
Anticipo	+	**$686,744.50**
Amortizac. Ant.	-	**$686,744.50**
SubTotal. Ant.	=	**$2,223,574.36**
IVA	+	**$355,771.89**
Total	=	**$2,579,346.25**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

PRESUPUESTO MODIFICADO

Aguascalientes

Obra: **SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE LÍMITE SUR TEATRO AGUASCALIENTES Y CALLE VALENTE QUINTANA, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (716)**

Grupo	Partida	Importe
PAVIMENTO ASFALTICO		
	PRELIMINARES	$23,500.02
	DEMOLICIONES	$247,392.14
	BACHEO PROFUNDO	$217,931.82
	SOBRE CARPETA ASFALTICA	$1,698,852.69
	SEÑALIZACION HORIZONTAL	$35,897.70
	Subtotal por Grupo	**$2,223,574.36**

Totales Presup.		$2,223,574.36
Anticipo	+	$686,744.50
Amortizac. Ant.	-	$686,744.50
SubTotal. Ant.	=	$2,223,574.36
IVA	+	$355,771.89
Total	=	$2,579,346.25

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MEMORIA FOTOGRÁFICA


OBRA:	SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ, TRAMO: ENTRE LÍMITE SUR TEATRO AGUASCALIENTES Y CALLE VALENTE QUINTANA, AGUASCALIENTES Mpio.		
NO. DE CONTRATO:	DM-0100-2022	CONTRATISTA:	ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

INICIO



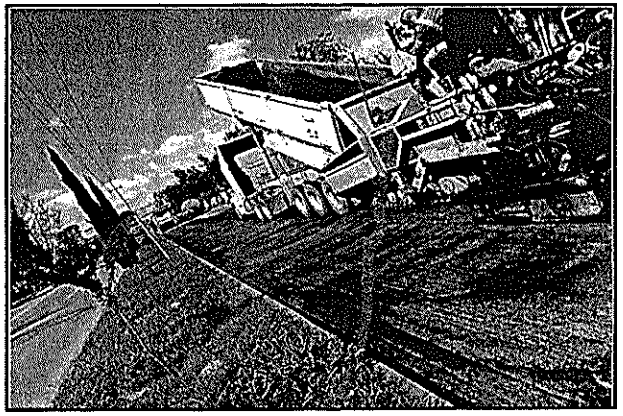



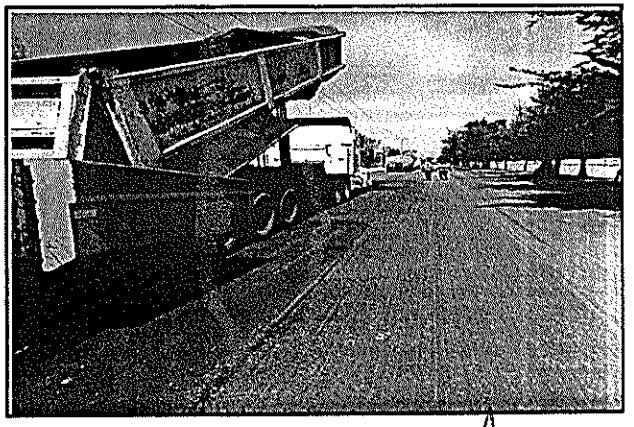

I.C. LAURA CECILIA MARTINEZ ALBA
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021 2024

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MEMORIA FOTOGRÁFICA


OBRA:	SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ, TRAMO: ENTRE LÍMITE SUR TEATRO AGUASCALIENTES Y CALLE VALENTE QUINTANA, AGUASCALIENTES Mpio.		
NO. DE CONTRATO:	DM-0100-2022	CONTRATISTA:	ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

PROCESO







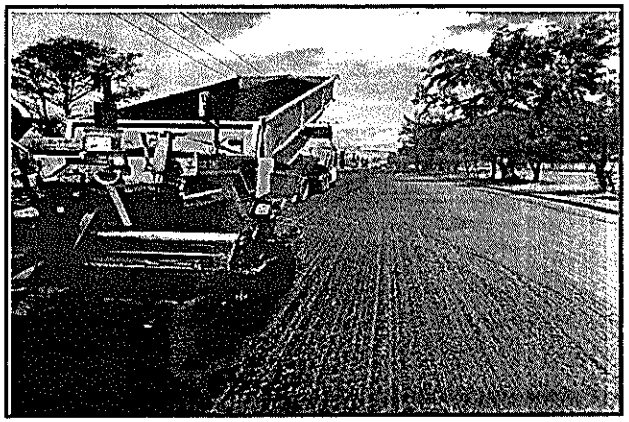

I.C. LAURA CECILIA MARTINEZ ALBA
RESIDENTE DE SUPERVISION

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


MEMORIA FOTOGRÁFICA


OBRA:	**SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ, TRAMO: ENTRE LÍMITE SUR TEATRO AGUASCALIENTES Y CALLE VALENTE QUINTANA, AGUASCALIENTES Mpio.**		
NO. DE CONTRATO:	**DM-0100-2022**	CONTRATISTA:	**ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

FINAL



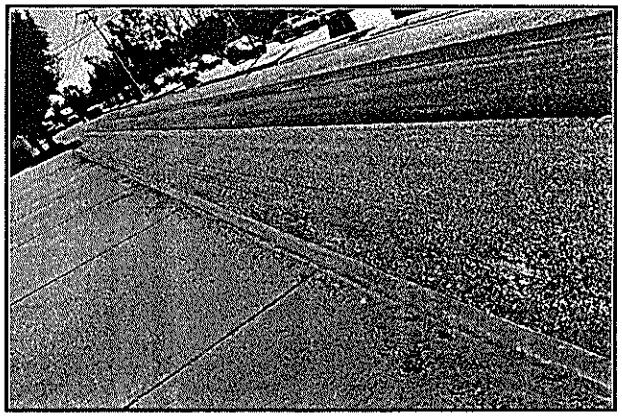

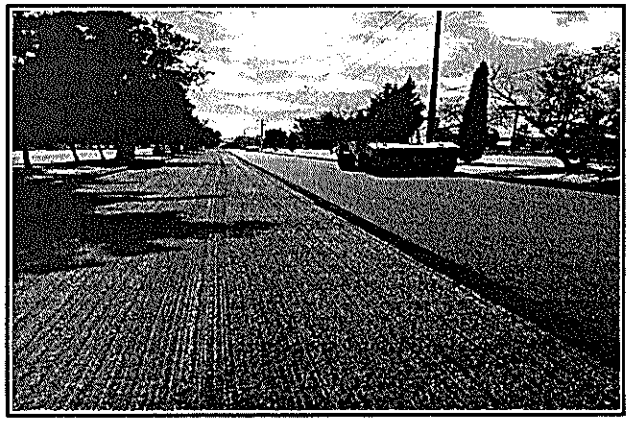

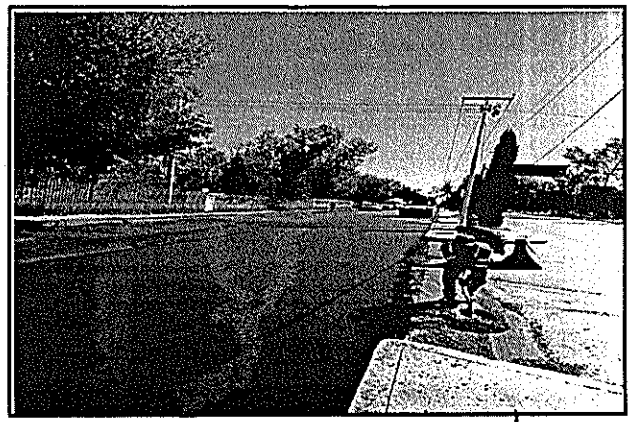

I.C. LAURA CECILIA MARTINEZ ALBA
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

EXPEDIENTE MODIFICADO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

EJERCICIO: 2022

N° DE CONTRATO: DM-0100-2022

NOMBRE DE LA OBRA: SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ, TRAMO: ENTRE LÍMITE SUR TEATRO AGUASCALIENTES Y CALLE VALENTE QUINTANA, AGUASCALIENTES Mpio.

MONTO MODIFICADO FINAL: $2,579,346.25

VOLUMEN	UNIDAD	COMPONENTE DE LA OBRA	MONTO
4013.50	M2	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: BARRIDO, CARGA, ACARREOS	$ 23,500.02
4013.50	M2	FRESADO UNIFORME DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN PAVIMENTO	$ 247,392.14
165.21	M3	BACHEO PROFUNDO AISLADO UTILIZANDO MATERIAL CALIDAD BASE	$ 217,931.82
4013.50	M2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE	$ 1,698,852.69
897.80	ML	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA MARCAS DE	$ 35,897.70

MONTO BASE:	$	2,223,574.36
IVA:	$	355,771.89
TOTAL:	$	2,579,346.25

I.C. Laura Cecilia Martínez Alba
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

DM-0100-2022

Ceey Mtz.

INICIAL $ 2'699,870.86

1521 $ 1'306,488.15

1111 $ 1'393,382.71

FINAL $ 2,579,346.25


1521 $ 765,267.89 Estimación 01


$ 437,533.09 Estimación 03 FINIQUITO } $ 1'202,800.98

1111 $ 796,623.62 Anticipo

$ 579,921.65 Estimación 02 } $ 1'376,545.27

I.C. Ceey Martínez.

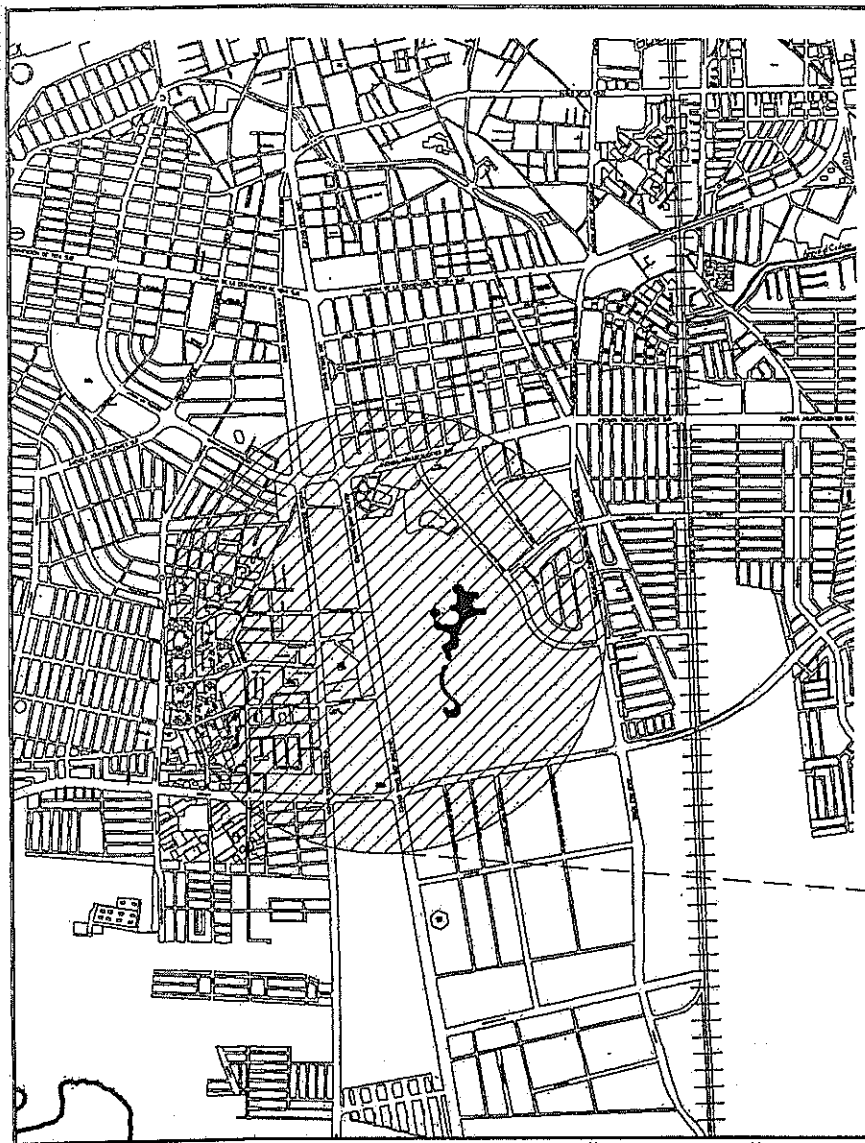


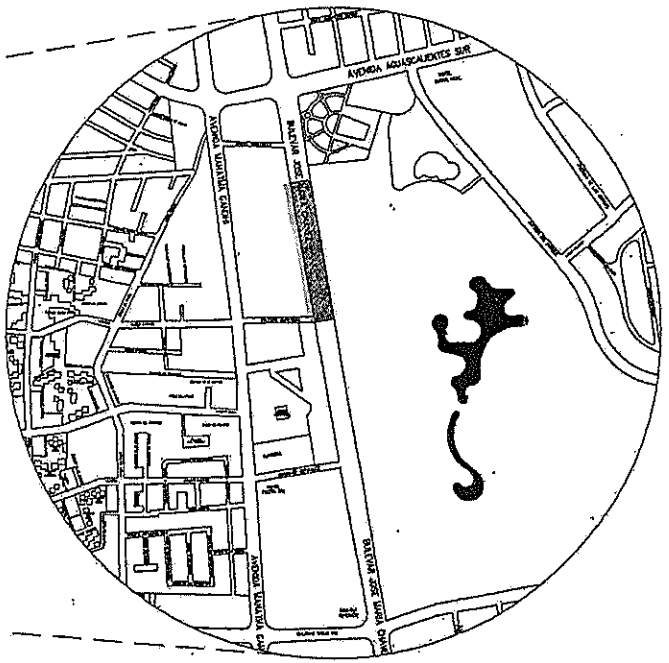

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

SIN ESCALA — LATERAL ORIENTE BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ

LOCALIZACIÓN:



SIMBOLOGÍA

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPSMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV.	FECHA	OBSERVACIONES:

RESP. DE PROY. EXTERNO		LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL		
PROYECTÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra — Secretaría de Obras Públicas

PROYECTISTA	COORDINADOR
ARQ. BLANCA ESTELA DE JESUS PÉREZ	ARQ. ALEJANDRO LABAE LEAL
JEFE DE DEPTO.	DIRECTOR
ARQ. L. JESÚS PALAFOX GONZÁLEZ	M. en ARQ. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ GARCÍA

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE SOBRE CARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ

UBICACIÓN
LATERAL ORIENTE BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ ENTRE LIMITE SUR Y ENTRONQUE AGUASCALIENTES Y CALLE VALENTE QUINTANA

CONTENIDO
LOCALIZACIÓN


CLAVE	No. PLANO
LOC 01	01
FECHA: ABRIL 2022	ESCALA INDICADA:
ACOTACIÓN METROS	Jm. EXP. E-005-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

www.ags.gob.mx (449) 978 92 01 Ext. 2615
Obras Públicas Aguascalientes
Antes de excavar llame a Ditstalle (55) 5449 9700 Ext. 5018 o 800 00 123 45

OBRAS PÚBLICAS

SIMBOLOGIA




a) BACHEO PROFUNDO AISLADO UTILIZANDO MATERIAL CALIDAD BASE HIDRAULICA PARA MAS DE UN MILLON DE EJES EQUIVALENTES DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA, INCISO N.CSV.CAR.1.02.004/01 DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARR. DE LA SCT.

b) RENIVELACIONES CON CONCRETO ASFALTICO MEZCLA EN PLANTA EN CALIENTE ASFALTO MODIFICADO CON POLIMERO TIPO I, CUMPLIENDO CON LAS NORMAS SCT REFERENTES DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION , GRANULOMETRIA DENSA 3/4" A FINOS, MEDIDO COMPACTO AL NOVENTA Y CINCO PORCIENTO (95%)

c) RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION DE ROMPIMIENTO LENTO (ECL-60 %), INCLUYE BARRIDO DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA A DETALLE, SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, Y APLICACION DE LA EMULSION CON EQUIPO ESPECIAL PARA ESA ACTIVIDAD, ESPREAS LIMPIAS Y ALINEADAS, EN CASO DE RECOMENDARLO EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL CONTRATISTA SE DEBERA DAR UN RIEGO MATAPOLVO ANTES DE COLOCAR LA CAPA DE IMPREGNACION, A RAZON DE 1.5 LT DE EMULSION POR M2, O LO QUE INDIQUE EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL CONTRATISTA


d) RIEGO DE LIGA CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-65 %), INCLUYE, SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, Y APLICACION DE LA EMULSION CON EQUIPO ESPECIAL PARA ESA ACTIVIDAD, ESPREAS O BACHADOR LIMPIAS Y ALINEADAS, EN LA PETROLIZADORA, A RAZON DE 0.6 LT DE EMULSION POR M2, O LO QUE INDIQUE EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, NO SE ACEPTAN "IMPREGNALIGA"

e) CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA ELABORADA CON ASFALTO PG 64-22, AGREGADO 3/4" A FINOS, DE 5 CM DE ESPESOR TOTAL, FORMADA Y COMPACTADO AL 95%, INCLUYE MATERIALES, QUE CUMPLAN LA NORMATIVA SCT-N-CMT-04-04, SCT-CMT-4-05-002, SCT-CMT-4-05-003, SCT-CMT-4-05-004, SCT-CTR-CAR-1-04-006-14 APLICADAS AL DIA DE HOY, DISEÑO MARSHALL (DEVERÁ SER AUTORIZADO POR EL LABORATORIO DE CALIDAD DE SOPMA AL MENOS 3 DIAS ANTES DE INICIO DE TENDIDO DE LA MEZCLA ASFALTICA)

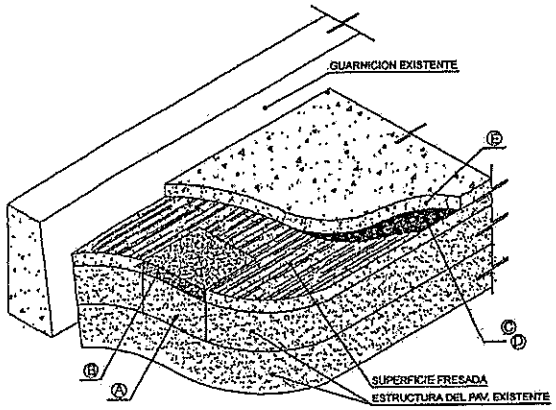

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO


ESCALA S/E LATERAL OTE BLVD. JOSE MA. CHAVEZ

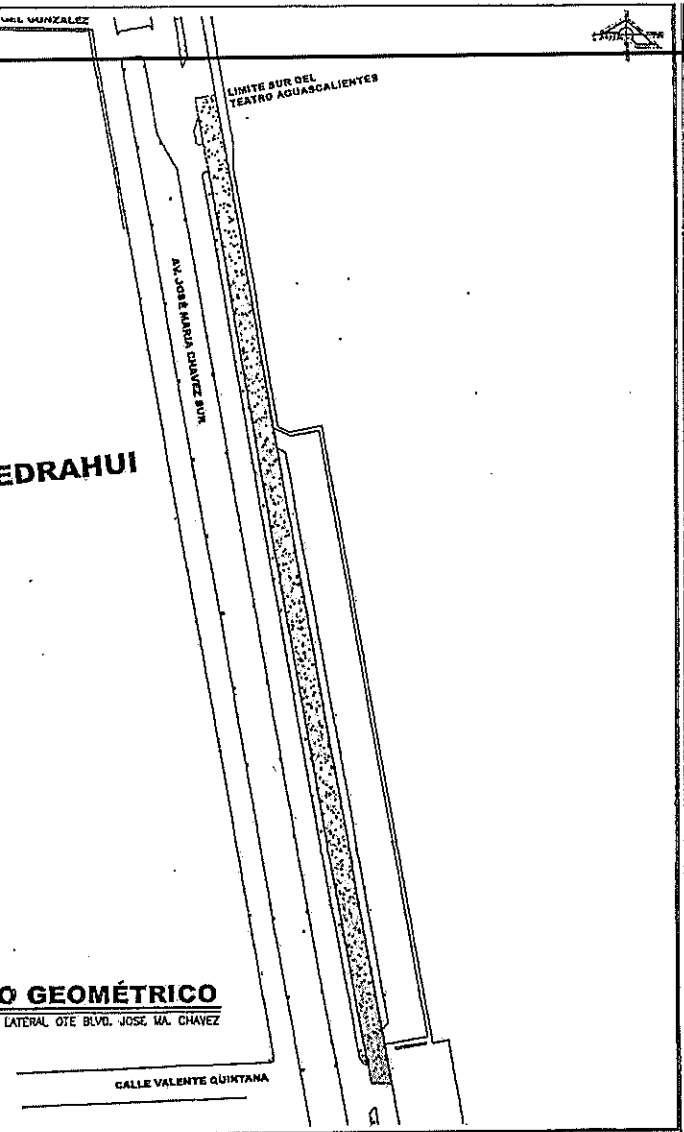

PROYECTO GEOMÉTRICO

ESCALA 1:500 LATERAL OTE BLVD. JOSE MA. CHAVEZ

LOCALIZACION



SIMBOLOGIA

SIMBOLOGÍA

LIMITE DE PROYECTO

BANQUETAS

PARAMENTO

CAMÁN

CAJA VALVULAS

TOMA HIDRAULICA

POZO DE VISITA EXISTENTE

PAVIMENTO ASFALTICO AREA A INTERVENIR 4,013.50 M2

REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE MEDIANTE FRESADO Y COLOCACION DE SOBRE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA ELABORADA CON ASFALTO PG 64-22, AGREGADO 3/4" A FINOS, DE 5 CM DE ESPESOR TOTAL, FORMADA Y COMPACTADO AL 95%, MATERIALES QUE CUMPLAN LA NORMATIVA SCT-N-CMT-04-04, SCT-CMT-4-05-002, SCT-CMT-4-05-003, SCT-CMT-4-05-004, SCT-CTR-1-04-006-14 APLICADAS AL DIA DE HOY, DISEÑO MARSHALL (DEVERÁ SER AUTORIZADO POR EL LABORATORIO DE CALIDAD DE SOPMA AL MENOS 3 DIAS ANTES DE INICIO DE TENDIDO DE LA MEZCLA ASFALTICA).

BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 5.0 CM COMPACTOS.

BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS, EN UN ESPESOR DE 6.0 CM COMPACTOS Y MATERIAL DE BASE HIDRAULICA DE 20 CM. DE ESPESOR COMPACTOS.

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: BARRIDO, CARGA, ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO, EN TODA LA SUPERFICIE A INTERVENIR.

NOTA: EL BACHEO PROFUNDO Y EL BACHEO AISLADO SE DETERMINARA EN SITIO A TRAVES DEL AREA DE CALIDAD DE LA SOPMA.

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como las sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL	M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA	Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV	FECHA	OBSERVACIONES

RESP. DE PROY. EXTERNO	LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL	
PROYECTÓ / REVISO / AUTORIZO	

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra — Secretaría de Obras Públicas

PROYECTISTA: ARQ. BURCELIS HERCASHYO PÉREZ — COORDINADOR: ARQ. ALEJANDRO JAIME LEAL

JEFE DE DEPTO: ARQ. [illegible] — DIRECTOR: M. ARQ. JOSÉ LUIS MÉNDEZ GARCÍA

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE SOBRE CARPETAS ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE BLVD. JOSE MA. CHAVEZ

UBICACION: LATERAL ORIENTE BLVD. JOSÉ MA. CHAVEZ ENTRE LIMITE SUR TEATRO AGUASCALIENTES Y CALLE VALENTE QUINTANA

CONTENIDO: PLANO GEOMETRICO

CLAVE	No. PLANO
GEO 01	02
FECHA: ABRIL 2022	ESCALA INDICADA
ACOTACIÓN METROS	No. EXP. IS-000-22

Aguascalientes — LA CIUDAD DE TU VIDA

Folio SISCO 2368
