Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

Dirección de Programación Presupuestal
Núm. Oficio AMPP/0666/22
Aguascalientes, Ags. 29 de Diciembre del 2022
Asunto: Validación de Expediente Técnico

C.P. SERGIO ARTURO LOZANO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 17 fracción XV, 60 fracción XVI y 76 fracción VI del Reglamento del Sistema Integral de Desarrollo Municipal y del Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes, hago referencia al oficio SOPMA/3018/2022 recibido por este Instituto el día 29 de Diciembre del 2022 por parte de la Secretaría de Obras Públicas Municipales, mediante el cual remiten el expediente técnico original de la siguiente obra para su análisis, registro y priorización, conforme al Programa Anual de Obra Pública y Programas Sociales para el ejercicio presupuestal 2022:

DEPENDENCIA EJECUTORA:	SOPMA
NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO:	SOBRECARPETA ASFÁLTICA
UBICACIÓN:	AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE TRAMO 2: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE TENIENTE JUAN DE LA BARRERA Y LATERAL CALZADA PONIENTE TRAMO 4: DE CALLE NARANJO A AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALZADA NORTE, JARDINES DE LA CRUZ, AGUASCALIENTES, AGS.
FONDO DE INVERSIÓN:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
IMPORTE:	$2,778,001.98 (ET FINAL)
No. DE OBRA:	2022-FISMDF-0129-04-1101
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
EJE:	MUNICIPIO SOBRESALIENTE
ESTRATEGIA:	OBRA PÚBLICA INTELIGENTE
POLITICA:	5.8.1.REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIALIDADES, CAMINOS, CALLES, ÁREAS DE TERRACERÍA Y CAUCES (C

Al respecto, hago de su conocimiento que dicho expediente ha sido analizado en su integración técnica y documental, con base en el artículo 168 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Asimismo, le comento que este Instituto valida dicha obra acorde a lo establecido en los artículos 14, 22 párrafo segundo y 23 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la cual se encuentra alineada al Plan de Desarrollo Municipal vigente, para dar cumplimiento a las metas establecidas en el mismo, y a los Lineamientos Generales para la Operación de este Fondo de Inversión, toda vez que la misma cuente con la autorización del CODEMUN. De igual manera, se hace de su conocimiento que deberá cumplir con lo establecido en los ordenamientos aplicables en lo que respecta al ejercicio, control e información de los recursos de este Fondo. Cabe hacer mención que los recursos solicitados para este proyecto de inversión, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal para el presente ejercicio fiscal que determine la Secretaría a su digno cargo. Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ARQ. AUSTRIA GABRIELA DÁVILA DE LA LLAVE
DIRECTORA GENERAL DEL IMPLAN

SEDR/ CAAR / JDBC
C.c.p. I.C. ING. MIGUEL ÁNGEL HUIZAR BOTELLO .- Secretaría de Obras Públicas Municipales .Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes
Antonio Acevedo Escobedo 103 A. Col. Centro
Aguascalientes. Ags. C.P. 20000
(449) 9101010 Ext. 3117
www.implanags.gob.mx

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

IMPLAN

ANÁLISIS INTEGRAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO

No. DE OBRA (PAOP 2020):	2022-FISMDF-0129-04-1101	REGISTRO No.	296
OFICIO DE VALIDACIÓN:	AMPP/0666/22	FECHA RECIBIDO PARA REVISIÓN:	29 de Noviembre del 2022
PROGRAMA:	URBANIZACION MUNICIPAL	LOCALIDAD O COLONIA:	JARDINES DE LA CRUZ
SUB-PROGRAMA:	0411- Calles y Caminos	DELEGACIÓN:	Centro Oriente
DEPENDENCIA:	Secretaría de Obras Públicas Municipales	MOD. DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
NOMBRE DE LA OBRA:	SOBRECARPETA ASFÁLTICA, AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE TRAMO 2: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE TENIENTE JUAN DE LA BARRERA Y LATERAL CALZADA PONIENTE TRAMO 4: DE CALLE NARANJO A AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALZADA NORTE		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, FISMDF		
INVERSIÓN:	$2,778,001.98	CLASIFICACIÓN DE OBRA:	BIENES DE DOMINIO PUBLICA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	DIFERENCIA ENTRE MOD.
$2,778,001.98	$2,778,001.98	0.00	0.00	0.00	0.00	*$0,00*

TIPO DE EXPENDIENTE:	ET FINAL	AÑO: 2022	AÑO:	AÑO:
AVANCES:	Financiero: 100 %	Físico: 100 %		
FECHA DE INICIO:	8 de Diciembre del 2022	FECHA DE TÉRMINO:	22 de Diciembre del 2022	REGISTRO SIMA: 129

CHEK LIST DE LOS ANEXOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

CÉDULA DE REGISTRO DE OBRA	✓
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	✓
MEMORIA DESCRIPTIVA	✓
PRESUPUESTO BASE	✓
FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES	✓
PLANOS O ESTUDIOS TÉCNICOS	✓
PADRÓN DE BENEFICIARIOS	N/A
ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO	N/A
DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL	N/A
CONVENIO DE CONCERTACIÓN	N/A
ACTA CONSTITUTIVA	N/A

METAS		BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		OBRA PROPUESTA		CLAVE SISCO
UNIDAD DE MEDIDA	CANT	TIPO DE BENEFICIARIOS	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	CONCEPTO	JORNALES A GENERAR	
M2	2213.49	Personas	200	2022-12-08	2022-12-22	Sobrecarpeta Asfáltica	7222	2388

INCLUIDO EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES

RECIBIO: ING. JOSE DAVID BURGUETE CLAUSTRO
Analista de Programación e Inversión de Obra Pública

29 de Noviembre del 2022
Fecha de validación

29 de Noviembre del 2022
Fecha de validación Expediente

PROCEDE Si ✓ No

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

CEDULA DE REGISTRO POR OBRA

Aguascalientes

050400-001E00E05-05-2-2-1-00-1-E-0510-0-17-0129-21-2502-6144

2022-FISMDF-0129-0411102-066	Obra **CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE TRAMO 2 Y EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE TRAMO 4**
Tipo DEFINITIVO 1 2022 Folio SISCO **2388**	Ubic. TRAMO 2: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE TENIENTE JUAN DE LA BARRERA, COL. HÉROES Y TRAMO 4: DE CALLE NARANJO A AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE, FRACC. JARDINES DE LA CRUZ, AGUASCALIENTES Mpio.

Ent. Ejecutora : **050400001E00E05**

Eje: **05**	MUNICIPIO SOBRESALIENTE
Finalidad: **2**	DESARROLLO SOCIAL
Función: **2**	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Subfunción: **1**	URBANIZACIÓN
Tema: **00**	SIN TEMA
Cuenta del Gasto **1**	GASTO PROGRAMABLE
Clasif. Programatica: **E**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Programa: **0510**	Movilidad Urbana
SubPrograma: **0**	SUBPROGRAMA GENÉRICO
Proyecto: **17**	
Tipo de Gasto: **21**	GASTO INVERSIÓN / OBRA PÚBLICA

I N V E R S I O N 2022

Municipal	2502	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022	$2,778,001.98

Folio SIMA 129 Total $2,778,001.98

M E T A S

Unidad de Medida	Cantidad	Descripción
M2	2213.49	SOBRECARPETA ASFÁLTICA CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE TRA

Inversión Ejercida Total al 31 de Diciembre de 2021 $0.00

Avance Fisico Acumulado al 31 de Diciembre de 2021

Avance Fisico Acumulado Programado al 31 de Diciembre de 2022 100 %

Fecha de Inicio 08 Dic 2022 Fecha de Terminación 22 Dic 2022

Jornales a Generar en 2022 7222

Modalidad de ejecución CONTRATO

Clasificación de la Obra Bienes de Dominio Público

Registro del Patrimonio: Obras del dominio público

OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

GENERALES

Nombre del Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE TRAMO 2 Y EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE TRAMO 4

TRAMO 2: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE TENIENTE JUAN DE LA BARRERA, COL. HÉROES Y TRAMO 4: DE CALLE NARANJO A AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE, FRACC. JARDINES DE LA CRUZ, AGUASCALIENTES Mpio.

Programa : 04 URBANIZACION MUNICIPAL

Subprograma : 11 Calles y caminos (2.- Construcción; 02- Concreto Asfáltico)

Clave del Municipio : AGUASCALIENTES

Localidad :

Barrio, Colonia o Ejido : AGUASCALIENTES Mpio.

Tipo de Obra : NUEVA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE TRAMO 2 Y EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE TRAMO 4

TRAMO 2
-PRELIMINARES Y DEMOLICIONES 965.43 M2
-BACHEO PROFUNDO 65.16 M3
-SOBRECARPETA ASFÁLTICA 965.43 M2
-OBRA COMPLEMENTARIA 1.00 OBRA
-GUARNICIONES 9.25M2
-BANQUETA 4.16 M2 Y RAMPA 1.20 M2
-LIMPIEZAS 969.63 M2
SEÑALIZACIÓN HORIZONTA Y VERTICAL 1.00 OBRA

TRAMO 4
-PRELIMINARES Y DEMOLICIONES 1,248.06 M2
-BACHEO PROFUNDO 72.18 M3
-SOBRECARPETA ASFÁLTICA 1,248.06 M2
-OBRA COMPLEMENTARIA 1.00 OBRA
-GUARNICIONES 45.00 ML
-BANQUETA Y RAMPA 12.50 M2
-LIMPIEZAS 1,248.06 M2
SEÑALIZACIÓN HORIZONTA Y VERTICAL 1.00 OBRA

Beneficiarios (No. y Tipo) :

200	PERSONAS

Hombres: 100 Mujeres: 100

OBRAS PÚBLICAS

No. Folio SISCO 2388

Los abajo firmantes, hacen constar que el presente proyecto :

CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE TRAMO 2 Y EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE TRAMO 4

TRAMO 2: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE TENIENTE JUAN DE LA BARRERA, COL. HÉROES Y TRAMO 4: DE CALLE NARANJO A AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE, FRACC. JARDINES DE LA CRUZ, AGUASCALIENTES Mpio.

cumple con los Requisitos y Normas Técnicas establecidas por la Dependencia Normativa, por lo que es viable su ejecución. Comprometiéndose la misma a proporcionar la supervisión y asistencia técnica necesaria durante el proceso administrativo.

Por la Dependencia Ejecutora

Ing. Miguel Angel Huizar Botello
Secretario de Obras Públicas

Lic. Jaime Gallo Camacho
Secretario de Desarrollo Urbano

LUGAR : AGUASCALIENTES, AGS.

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

No. Folio SISCO 2388

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

LOCALIZACION: TRAMO 2: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE TENIENTE JUAN DE LA BARRERA, COL. HÉROES Y TRAMO 4: DE CALLE NARANJO A AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE, FRACC. JARDINES DE LA CRUZ, AGUASCALIENTES Mpio.

PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL

SUBPROGRAMA: Calles y caminos (2.- Construcción; 02- Concreto Asfáltico)

OBRA A REALIZAR: CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE TRAMO 2 Y EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE TRAMO 4

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

FORMA DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA: NUEVA

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE TRAMO 2 Y EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE TRAMO 4

CARACTERISTICAS DE LA OBRA: Pesimo

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE REQUIERE PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

PROCEDE: SI [X] NO [ ]

REVISÓ: Jefa del Departamento de Expedientes Tecnicos y Costos

NOMBRE: Arq. Blanca Margarita Martinez Amador

FIRMA:

FECHA: 29 Dic 2022

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS


No. Folio SISCO 2388

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA
LOCALIZACION

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

Aguascalientes LA CIUDAD DE TU VIDA

OBRA:	CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA EN AV. DE LA CONVENCION DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE TRAMO 2, LATERAL CALZADA PONIENTE TRAMO 4 (TRAMO 2-4)					
NO. DE CONT	FISMDF-0129-2022		CONTRATISTA:	RODCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		

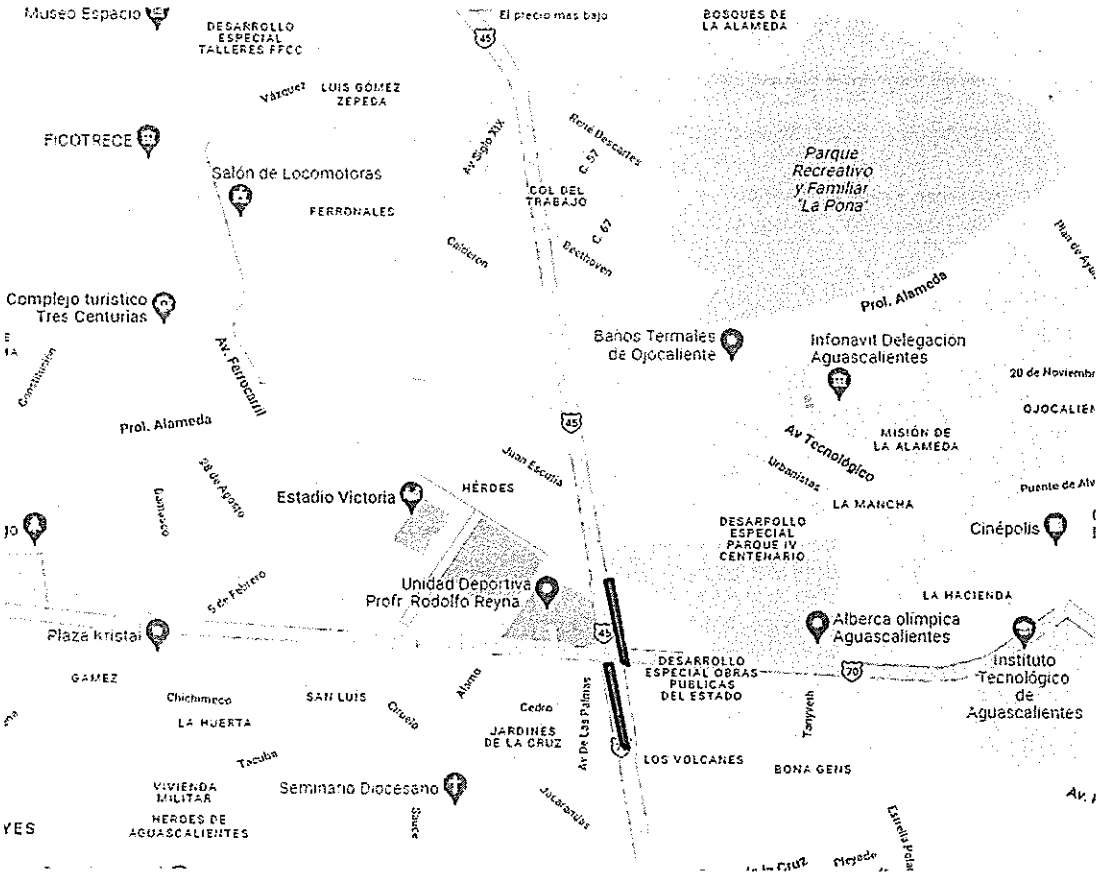


ARQ. CESAR RODOLFO ROMO RIVAS
SUPERVISOR DE OBRA.

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA
LOCALIZACION

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

OBRA:	CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA EN AV. DE LA CONVENCION DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE TRAMO 2, LATERAL CALZADA PONIENTE TRAMO 4 (TRAMO 2-4)					
NO. DE CONT	FISMDF-0129-2022	CONTRATISTA:	RODCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			

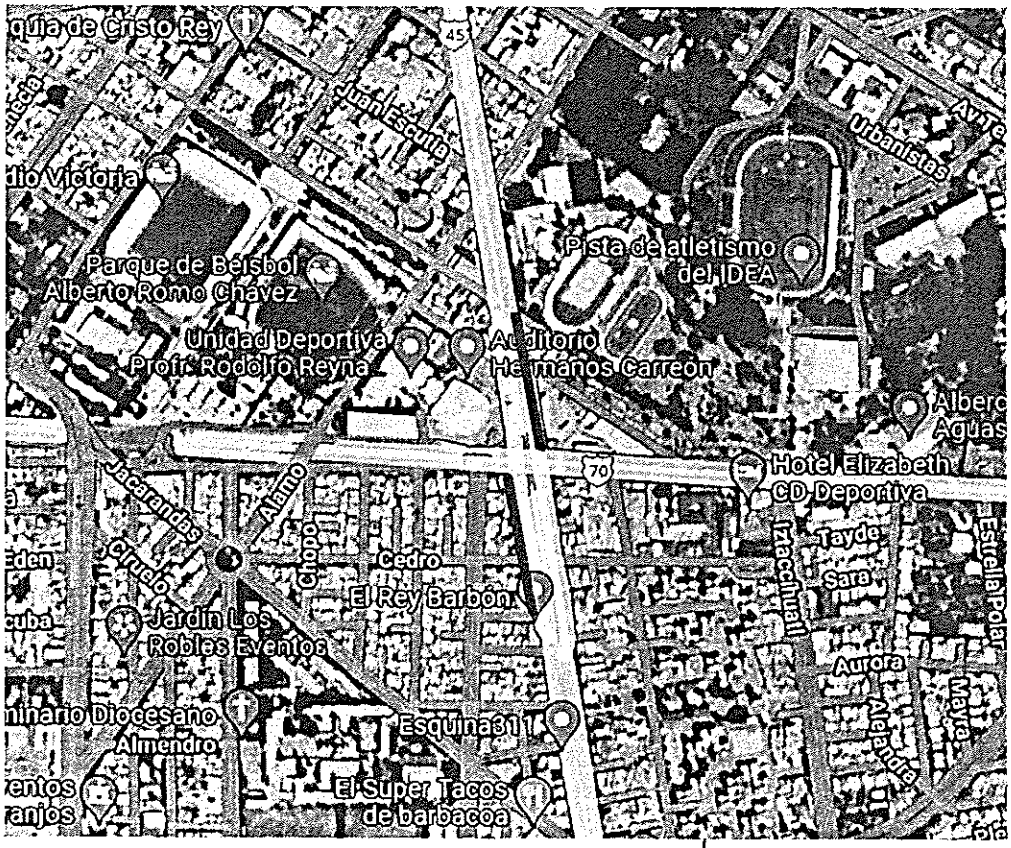

ARQ. CESAR RODOLFO ROMO RIVAS
SUPERVISOR DE OBRA.

RC3-POS-SOS-7.5.1-04	
REVISION:	05
FECHA DE REVISION:	
RESPONSABLE:	SUPERVISOR DE OBRA
TIEMPO DE RET:	02 AÑOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

PROGRAMA DE OBRA DEFINITIVO

DE CONTRATO : FISMDF-0129-2022

PROGRAMA: 04 URBANIZACION MUNICIPAL

INICIO VIGENTE: 08-diciembre-22

Y NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA EN AV. DE LA CONVENCION DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE TRAMO 2, LATERAL CALZADA PONIENTE TRAMO 4 (TRAMO 2-4)

TERMINO REAL: 22-diciembre-22

RECURSO 2022

CONCEPTO			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	PONDERACIÓN %	
			2022																FINANCIERO	FÍSICO
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	%	%
INVERSION																				
OBRECARPETA ASFALTICA EN AV. DE LA I, LATERAL CALZADA ORIENTE TRAMO 2, ONIENTE TRAMO 4 (TRAMO 2-4)																				
IO A. ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE A BARRERA / 4to TRAMO CALLE HARNAJO A																				
	$ 177,911.23	100			100														7.43	7.14
NDO	$ 351,353.50	100			10 70 20														14.67	21.43
ASFALTICA	$ 1,325,115.26	100			80 20														55.33	14.29
ENTARIA	$ 140,025.78	100			100														5.85	7.14
	$ 16,654.90	100			30 70														0.78	14.29
MPA	$ 12,286.22	100			30 70														0.51	14.29
	$ 38,410.39	100			100														1.60	7.14
HORIZONTAL	$ 315,465.86	100			100														13.17	7.14
VERTICAL	$ 15,606.15	100			100														0.65	7.14
		-																		
		-																		
		-																		
		-																		
		-																		
VA	$ 2,394,829.29		0 0 0 0	0 0 0 0	0 2 4 3	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
	AVACE SEMANAL %		0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	8% 14% 13% 57%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%		
	AVANCE SEMANAL ACUMULADO %		0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	8% 14% 43% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100.00	100.00
	EJERCIDO SEMANAL $		- - - -	- - - -	213,045.58 1,315,321.99 866,459.72	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	$ 2,394,829.29	
	EJERCIDO MENSUAL $		$0.00	$0.00	$2,394,829.29	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ 383,172.69	IVA 16%
	JERCIDO MENSUAL ACUMULADO $		0.00	0.00	2,394,829.29	2,394,829.29	2,394,829.29	2,394,829.29	2,394,829.29	2,394,829.29	2,394,829.29	2,394,829.29	2,394,829.29	2,394,829.29	2,394,829.29	2,394,829.29	2,394,829.29	2,394,829.29		
	EJERCIDO SEMANAL %		0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	9% 55% 36%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%		
	EJERCIDO MENSUAL %		0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GRAN TOTAL EJERCIDO	
	ERCIDO MENSUAL ACUMULADO %		0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	$ 2,778,001.98	

PRE

ARQ. CESAR EDGUARDO ROMO RIVAS
SUPERVISOR

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

GENERALES

EJERCICIO:	2022	APROBACION No:	2022-FISMDF-0129-0411102-066
LOCALIDAD:	TRAMO: DE 2do TRAMO A. ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE TENIENTE JUAN DE LA		
MUNICIPIO:	AGUASCALIENTES, Mpio.		
TIPO DE INVERSION	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (100%) (MUNICIPAL)		
PROGRAMA:	04 URBANIZACION MUNICIPAL		
SUB-PROGRAMA:	11 Calles y caminos		
OBRA A REALIZARSE:	CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA EN AV. DE LA CONVENCION DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE TRAMO 2, LATERAL CALZADA PONIENTE TRAMO 4 (TRAMO 2-4)		
DEPENDENCIA EJECUTOR	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)		
FORMACIÓN DE EJECUCI	CONTRATO	NO. DE CONTRATO:	FISMDF-0129-2022
NOMBRE CONTRATISTA:	RODCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		
REPRESENTANTE:	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO		
MONTO CONT. ORIGEN	$ 2,674,419.82	ANTICIPO: $ 1,337,209.91	PLAZO 15 DIAS
1A AMPLIACION $:	$ 103,582.16	1 AMPL DIAS	
2A AMPLIACION $:		2 AMPL DIAS	
FIRMA CONTRATO:	01/12/2022		
INICIO CONT: dd/mm/aa	02/12/2022	TERMINO CONT:	22/12/2022
INICIO REAL: dd/mm/aa	08/12/2022	TERMINO REAL:	22/12/2022

TIPO DE OBRA PROPUESTA

NUEVA CREACIÓN		CONSOLIDACIÓN	
COMPLEMENTARIA	X	AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN		EQUIPAMIENTO	

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA EN AV. DE LA CONVENCION DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE TRAMO 2, LATERAL CALZADA PONIENTE TRAMO 4 (TRAMO 2-4)

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA: (SELECCIONAR UNO OBLIGATORIO)

BUEN ESTADO X REGULAR PESIMO ESTADO

FACTIBILIDAD DE LA OBRA: (CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA)

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA OPERARSE

PROCEDE: SI: X NO:
MARQUE SOLO UNA

ARQ. CESAR RODOLFO ROMO RIVAS
SUPERVISOR

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

GENERALES

LOCALIDAD: TRAMO: DE 2do TRAMO A. ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE TENIENTE JUAN DE LA BARRERA / 4to TRAMO CALLE NARNAJO A AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS
MUNICIPIO: AGUASCALIENTES, Mpio.
PROGRAMA: 04 URBANIZACION MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA: 11 Calles y caminos
OBRA A REALIZARSE: CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA EN AV. DE LA CONVENCION DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE TRAMO 2, LATERAL CALZADA PONIENTE TRAMO 4 (TRAMO 2-4)
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)
FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA

NUEVA CREACIÓN		CONSOLIDACIÓN	
COMPLEMENTARIA	X	AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN		EQUIPAMIENTO	

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA EN AV. DE LA CONVENCION DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE TRAMO 2, LATERAL CALZADA PONIENTE TRAMO 4 (TRAMO 2-4)

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

BUEN ESTADO: X REGULAR: PESIMO ESTADO:

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA OPERARSE

PROCEDE **SI:** X **NO:**

ARQ. CESAR RODOLFO ROMO RIVAS
SUPERVISOR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

PRESUPUESTO MODIFICADO

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

Obra: **CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE TRAMO 2 Y EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE TRAMO 4**

Ubicación: **TRAMO 2: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE TENIENTE JUAN DE LA BARRERA, COL. HÉROES Y TRAMO 4: DE CALLE NARANJO A AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE, FRACC. JARDINES DE LA CRUZ, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **RODCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (629)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **TRAMO 2**				
	PARTIDA: **PRELIMINARES Y DEMOLICIONES**				
1	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN PAVIMENTOS, CALLES Y VIALIDADES CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: EJES, BANCO DE NIVEL, RENIVELACIONES LAS VECES NECESARIAS, CORRECCION DE RASANTE A PUNTOS OBLIGADOS (AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION), ESTACAS, VARILLAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPO DE PRECISION CALIBRADO, TRABAJO TERMINADO.P.U.O.T.	M2	965.43	$4.63	$4,469.94
2	SONDEO A MANO O A MAQUINA PARA LOCALIZACION DE TUBERIAS CUALQUIER PROFUNDIDAD Y MATERIAL PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICO SANITARIAS CUIDANDO NO DAÑARLAS PARA NO INTERFERIR EN LOS SERVICIOS, INCLUYE: EXCAVACION, EQUIPO, MANO DE OBRA, REPORTE A LA SUPERVISION, RELLENOS, COMPACTACIONES, TRABAJO TERMINADO.	SONDE	4	$1,742.88	$6,971.52
3	DESMONTAJE MANUAL Y RECUPERACIÓN DE BOYA METALICA EXISTENTE, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CARGAS Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZAS, EL TRASLADO PRODUCTO DEL DESMONTAJE SERA A PARQUE DE MAQUINARIA DE LA SOPMA	PZA	180	$55.82	$10,047.60
4	CORTE CON DISCO DIAMANTADO DE 14" EN PISOS DE CONCRETO ASFALTICO DE HASTA 8.00 cm. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: TRAZO, EQUIPO Y OPERACION, LIMPIEZAS.	ML	12	$34.16	$409.92
5	DEMOLICION PARCIAL DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y/O ASFALTICO DE HASTA 15 CM. DE ESPESOR PROMEDIO EN PAVIMENTOS Y (BANQUETAS, LOSAS DIAMANTE Y CAJAS DE VALVULAS, TOPES) CON O SIN ARMADO DE ACERO, SIN RECUPERACION, MUROS, MOJONERAS, ANCLAJES, ETC, DE FORMA MANUAL Y MECANICA, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL AL LUGAR DE ACOPIO, HERRAMIENTA NECESARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LIMPIEZA, TRABAJO TERMINADO	M3	1.28	$271.66	$347.73
6	FRESADO UNIFORME DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO 3-7 CM (5 cm de espesor promedio) MEDIANTE FRESADORA EN FRIO COMPACTA, EQUIPADA CON BANDA TRANSPORTADORA PARA CARGA DIRECTA SOBRE CAMION DE VOLTEO, INCLUYE: TRAMO DE PRUEBA AL INICIO DEL FRESADO PARA AUTORIZACION DE SUPERVISION (SUPERFICIE FRESADA UNIFORME Y SIN PROTUBERANCIAS NI ONDEOS), ACARREOS LOCALES, CARGA Y ACARREO A KM SUBSECUENTES (11 A 15 KM APROX) DE MATERIAL PRODUCTO DEL FRESADO DE CARPETA ASFALTICA EL TRASLADO SERA A PARQUE DE MAQUINARIA DE LA SOPMA, PIEZAS DE DESGASTE, COMBUSTIBLES, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, CUALQUIER VOLUMEN Y AREA,EQUIPO NECESARIO, LIMPIEZA FINA Y GRUESA, TRABAJO TERMINADO.	M3	40	$1,150.82	$46,032.80
7	REMOCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA SOBRE CONCRETO HIDRÁULICO EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS (MOTO CONFORMADORA), DE HASTA 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, EQUIPO, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE REMOCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A LUGAR DE ACOPIO, PIEZAS DE DESGASTE, COMBUSTIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO, ACARREOS LOCALES, CARGA Y ACARREO A KM SUBSECUENTES (11 A 15 KM APROX) DE MATERIAL PRODUCTO DE REMOCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, EL TRASLADO SERA A PARQUE DE MAQUINARIA DE LA SOPMA	M3	10	$356.84	$3,568.40
8	DEMOLICION CONTROLADA DE CONCRETO HIDRAULICO EN DENTELLONES Y GUARNICIONES DE 15 x 20 x 40 CM. DE FORMA MANUAL Y MECÁNICA, INCLUYE: CORTES CON DISCO, ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE ACOPIO PARA SU CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.	ML	9.25	$26.36	$243.83

Obra: **CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE TRAMO 2 Y EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE TRAMO 4**

Ubicación: **TRAMO 2: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE TENIENTE JUAN DE LA BARRERA, COL. HÉROES Y TRAMO 4: DE CALLE NARANJO A AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE, FRACC. JARDINES DE LA CRUZ, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **RODCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (629)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **TRAMO 2**				
	PARTIDA: **PRELIMINARES Y DEMOLICIONES**				
9	CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO AL 1er. KM, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	2.02	$59.26	$119.70
10	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES, AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MAS CERCANO AUTORIZADO POR LA SUPERVISION, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3-KM	60.49	$9.97	$603.09
			Totales por Partida		**$72,814.53**
	PARTIDA: **BACHEO PROFUNDO**				
11	BACHEO PROFUNDO AISLADO UTILIZANDO MATERIAL CALIDAD BASE HIDRAULICA PARA MAS DE UN MILLON DE EJES EQUIVALENTES DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA, INCISO N.CSV.CAR.1.02.004/03 DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARR. DE LA SCT, INCLUYE: PREPARACION, PERFILADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO NECESARIO QUE SE REQUIERA PARA LOGRAR LA COMPACTACION DE 100% PVSM, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, PREPARACION DE MATERIAL, HUMEDECIDO, NIVELADO, TRASLADO DE UN PUNTO A OTRO DENTRO DE LA OBRA, EN CUALQUIER VOLUMEN, MOVIMIENTO DE MAQUINARIA P.U.O.T	M3	65.167392	$1,194.07	$77,814.43
12	BACHEO PROFUNDO AISLADO UTILIZANDO MATERIAL CALIDAD BASE HIDRAULICA PARA MAS DE UN MILLON DE EJES EQUIVALENTES DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA, INCISO N.CSV.CAR-1.02.004/03 DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARR. DE LA SCT, BASE HIDRAULICA MEJORADA CON CEMENTO EN PROPORCION DE 40 KILOS DE CEMENTO POR CADA M3, INCLUYE: PREPARACION, PERFILADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO NECESARIO QUE SE REQUIERA PARA LOGRAR LA COMPACTACION DE 100 %, PVSM, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, PREPARACION DE MATERIAL, HUMEDECIDO, NIVELADO, TRASLADO DE UN PUNTO A OTRO DENTRO DE LA OBRA EN CUALQUIER VOLUMEN, MOVIMIENTO DE MAQUINARIA P.U.O.T	M3	20	$1,366.11	$27,322.20
			Totales por Partida		**$105,136.63**
	PARTIDA: **SOBRE CARPETA ASFALTICA**				
13	CALAFATEO EN GRIETAS Y/O JUNTAS CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO EN CALIENTE A RAZÓN DE 0.60 LITRO POR M2, EN PROMEDIO, INCLUYE: BARRIDO DE LA GRIETA HASTA DEJAR LA SUPERFICIE LIMPIA Y LIBRE DE POLVO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CALAFATEO DE LA JUNTA CON EMULSIÓN Y ARENA EN GRIETAS EXISTENTES, TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T.	M2	50	$36.74	$1,837.00
14	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE CONTACTO EN LOS EXTREMOS DONDE LA PERFILADORA NO ALCANCE POR LÍMITES CON LA GUARNICIÓN, CON UN RASPADO SUPERFICIAL CON RETROEXCAVADORA, ELIMINANDO TECATAS QUE HAYAN QUEDADO PARA RENIVELADO, BARRIDOS ENTRE PASADA DE MOTOCONFORMADORA Y EN REMATES DE EMPATES A DETALLE A MANO, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRADERO OFICIAL INDICADO.	M2	50	$32.26	$1,613.00

Obra: **CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE TRAMO 2 Y EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE TRAMO 4**

Ubicación: **TRAMO 2: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE TENIENTE JUAN DE LA BARRERA, COL. HÉROES Y TRAMO 4: DE CALLE NARANJO A AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE, FRACC. JARDINES DE LA CRUZ, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **RODCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (629)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **TRAMO 2**				
	PARTIDA: **SOBRE CARPETA ASFALTICA**				
15	RENIVELACIONES CON CONCRETO ASFALTICO MEZCLA EN PLANTA EN CALIENTE ASFALTO MODIFICADO CON POLIMERO TIPO I, CUMPLIENDO LAS NORMAS SCT REFERENTES DE CONSTRUCCCION Y CONSERVACION, GRANULOMETRIA DENSA 3/4" A FINOS, MEDIDO COMPACTO AL NOVENTA Y CINCO PORCIENTO (95%), INCLUYE CARGA Y ACARREO EN TRAMOS AISLADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES, Y MAQUINARIA Y EQUIPO AL SIGUIENTE PUNTO EN CUALQUIER VOLUEN, PERFILADO, LIMPIEZA DE HUESO Y GRAVA SUELTA, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	M3	30	$6,492.80	$194,784.00
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMULSIONASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (RIEGO DE SELLADO NEGRO) EN CALIENTE A RAZON DE 1.5 LT/M2 (60% EMULSUON - 40% AGUA) EN TRAMOS AISLADOS O CONTINUO, (DOS CAPAS) Y O SELLADO DE CARPETA ASFALTICA EN REMATES CON GUARNICION EN EL ANCHO QUE LA SUPERVICION INDIQUE, CON USO DE BACHADOR O DE ESPREAS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE (CALAFATEO DE JUNTAS CON EMULSION Y ARENA Y GRIETAS EXISTENTES) NO SE ACEPTA LEVENTAMIENTO DEL RIEGO, TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T.	M2	965.43	$32.34	$31,222.01
17	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION DE ROMPIMIENTO LENTO (ECL-60 %), INCLUYE BARRIDO DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA A DETALLE, SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, Y APLICACION DE LA EMULSION CON EQUIPO ESPECIAL PARA ESA ACTIVIDAD, ESPREAS LIMPIAS Y ALINEADAS, EN CASO DE RECOMENDARLO EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL CONTRATISTA SE DEBERÁ DAR UN RIEGO MATAPOLVO ANTES DE COLOCAR LA CAPA DE IMPREGNACION, A RAZON DE 1.5 LT DE EMULSION POR M2, O LO QUE INDIQUE EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, NO SE ACEPTAN LEVANTAMIENTO DEL RIEGO, TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T.	M2	965.43	$24.19	$23,353.75
18	RIEGO DE LIGA CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-65 %), INCLUYE, SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, Y APLICACION DE LA EMULSION CON EQUIPO ESPECIAL PARA ESA ACTIVIDAD, ESPREAS O BACHADOR LIMPIAS Y ALINEADAS, CONTROL DE CALIDAD A CADA DOS REMESAS EN OBRA (INDEPENDIENTEMENTE DE LA CANTIDAD A UTILIZAR) EN LA PETROLIZADORA, A RAZON DE 0.8 LT DE EMULSION POR M2, O LO QUE INDIQUE EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, NO SE ACEPTAN "IMPREGNALIGA", TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T.	M2	965.43	$14.29	$13,796.00
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA ELABORADA CON ASFALTO MODIFICADO TIPO I, AGREGADO 3/4" A FINOS, DE 5 CM DE ESPESOR, FORMADA Y COMPACTADO AL 95%, INCLUYE MATERIALES, QUE CUMPLAN LA NORMATIVA SCT-N-CMT-04-04, SCT-CMT-4-05-002, SCT-CMT-4-05-003, SCT-CMT-4-05-004, SCT-CTR-CAR-1-04-006-14 APLICADAS AL DIA DE HOY, DISEÑO MARSHALL (DEVERÁ SER AUTORIZADO POR EL LABORATORIO DE CALIDAD DE SOPMA AL MENOS 3 DIAS ANTES DE INICIO DE TENDIDO DE LA MEZCLA ASFALTICA), INCUYE: TRAMO DE PRUEBA AL INICIO PARA REVISION Y AUTORIZACION DEL ESPESOR POR PARTE DEL SUPERVISOR, EL CONTRATISTA DEBERÁ PREVEER EL SUMINISTRO Y TIEMPOS MUERTOS POR MOVIMIENTOS DEL TREN DE MAQUINAS DE TRABAJO EN TRAMOS AISLADOS. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. Y LIMPIEZAS DE GRANZON Y HUESO LATERAL.	M2	965.43	$282.72	$272,946.37
20	COMPACTACION SOBRE MORTERO ASFALTICO TENDIDO EN APROCHES CON GUARNICIONES CON EQUIPO LIGERO (PLANCHITA), INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO, TRABAJO TERMINADO.	M2	74	$11.99	$887.26
				Totales por Partida	**$540,439.38**

Obra: **CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE TRAMO 2 Y EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE TRAMO 4**

Ubicación: **TRAMO 2: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE TENIENTE JUAN DE LA BARRERA, COL. HÉROES Y TRAMO 4: DE CALLE NARANJO A AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE, FRACC. JARDINES DE LA CRUZ, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **RODCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (629)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **TRAMO 2**				
	PARTIDA: **OBRA COMPLEMENTARIA**				
21	RE NIVELACIÓN DE POZO DE VISITA HASTA 30 cm DE ALTURA. INCLUYE: RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE BROCAL EXISTENTE, DEMOLICIONES, NIVELADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 28 cm DE ESPESOR, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 , PLOMEADO, NIVELADO, DEMOLICIONES, CARGAS Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	2	$2,951.30	$5,902.60
22	CONSTRUCCION DE LOSA DE DIAMANTE DE CONCRETO MR= 45 , T.M.A. DE 3/4" (19MM), GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 8+-2.5CM CM, FRAGUADO RAPIDOA A 3 DIAS, DE 25 CM DE ESPESOR, EN POZO DE VISITA, Y 1.50 M POR LADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD EN TODO EL PERIMETRO EXTERIOR DE 1/2" ASI COMO DE LAS JUNTAS DIAGONALES PARA FORMAR 4 PARTES, BROCAL Y TAPA DE Fo. Fo. TIPO PESADO, (165 KG), CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA QUIMICA BASE AGUA, APLANADO FINO EN RECEPCION DE BROCAL, CORTES CON CORTADORA DE DISCO DE 5 CM ENTRE JUNTAS DIAGONALES FORMADO 8 PIEZAS Y SELLADO DE JUNTAS Y CORTES CON MATERIAL PREFORMADO Y SELLADOR AUTONIVELANTE, MANO DE OBRA, ACARREOS DE MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	2	$7,676.12	$15,352.24
23	LIMPIEZA Y DESASOLVE DE POZOS DE VISITA Y LINEAS DE ALCANTARILLADO EXISTENTE CON CAMION TIPO VACTOR. INCLUYE: RESANE INTERIOR DEL POZO Y REMTE DE POZO CO TUBO CON SELLADOR, FESTER Y MORTERO 1:3, MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LIMPIEZAS, RENTA DE CAMION VACTOR HASTA LA CORRECTA LIMPIEZA DE LAS LINEAS EXISTENTES DE POZO A POZO, ASI COMO EL TRASLADO DE LOS DESECHOS HASTA TIRADERO AUTORIZADO MEDIDO POZO A POZO.	LOTE	3	$4,152.59	$12,457.77
			Totales por Partida		**$33,712.61**
	PARTIDA: **GUARNICIONES**				
24	EXCAVACION A MAQUINA Y/O A MANO EN MATERIAL TIPO II, EN SECO O PRESENCIA DE AGUA, INCLUYE. CORTE DE RAIZ DE CUALQUIER TAMAÑO Y GROSOR, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 40 CM DESPUES DE DESMONTE, DESPALME Y/O DEMOLICION DE SUPERFICIE O ELEMENTO ESTRUCTURAL O DE ACABADO, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, SIN DAÑAR AREAS ALEDAÑAS, CARGA Y ACARREO A TIRADERO OFICIAL, CONSERVACION DE LA MISMA, TRABAJO TERMINADO, LIMPIEZAS.	M3	0.74	$274.25	$202.94
25	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% DE SU P.V.S.M EN SU COMPACTACION., INCLUYE ESCARIFICADO, TENDIDO, HOMOGENIZADO, HUMEDECIDO OPTIMO NIVELADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM, CALIDAD Limite liquido máximo 50%, Valor de Soporte California (CBR) mínimo 15%, Expansión máxima 5%, Grado de Compactación mínimo 90% ± 2, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M2	3.7	$27.85	$103.05

Obra: **CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE TRAMO 2 Y EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE TRAMO 4**

Ubicación: **TRAMO 2: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE TENIENTE JUAN DE LA BARRERA, COL. HÉROES Y TRAMO 4: DE CALLE NARANJO A AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE, FRACC. JARDINES DE LA CRUZ, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **RODCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (629)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **TRAMO 2**				
	PARTIDA: **GUARNICIONES**				
26	CONSTRUCCION DE GUARNICION RECTA Y/O CURVA TRAPEZOIDAL 15-20X40 CM DE SECCION CON CONCRETO PREMEZCLADO MR=38 KGF/CM2, R.N.REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, T.M.A. 3/4", GRAVA TRITURADA, ACABADO PULIDO EN PARTE DE SUPERIOR Y DOBLADOR EN ARISTAS, INCLUYE: COMPACTADO DE PLANTILLA, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ACABADO, DESCIMBRADO, ALINEADO, NIVELADO, Y CURADO EN SU PARTE SUPERIOR CON MEMBRANA BASE AGUA A RAZON DE 1 LTO/M2, JUNTA DE AISLAMIENTO LONGITUDINAL AL COMBINAR CON OTRO ELEMENTO Y TRANSVERSAL @ 30 MT MAXIMO, SELLADO CON SELLADOR AUTONIVELANTE LONGITUDINAL, TRABAJO TERMINADO, .P.U.O.T.	ML	9.25	$288.66	$2,670.11
27	RELLENO COMPACTADO AL 90% CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM UTILIZANDO BAILARINA. INCLUYE: SUMINISTRO DE TEPETATE (MATERIAL DE BANCO) EN LA OBRA, ABUNDAMIENTO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CRIBADO, RETIRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	M3	0.28	$358.54	$100.39
28	CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO AL 1er. KM, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	0.46	$48.14	$22.14
29	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES, AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MAS CERCANO AUTORIZADO POR LA SUPERVISION, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3-KM	13.88	$8.11	$112.57
				Totales por Partida	**$3,211.20**
	PARTIDA: **BANQUETA Y RAMPA**				
30	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN PAVIMENTOS, CALLES Y VIALIDADES CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: EJES, BANCO DE NIVEL, RENIVELACIONES LAS VECES NECESARIAS, CORRECCION DE RASANTE A PUNTOS OBLIGADOS (AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION), ESTACAS, VARILLAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPO DE PRECISION CALIBRADO, TRABAJO TERMINADO.P.U.O.T.	M2	5.36	$4.63	$24.82
31	EXCAVACION A MAQUINA Y/O A MANO EN MATERIAL TIPO II, EN SECO O PRESENCIA DE AGUA, INCLUYE. CORTE DE RAIZ DE CUALQUIER TAMAÑO Y GROSOR, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 40 CM DESPUES DE DESMONTE, DESPALME Y/O DEMOLICION DE SUPERFICIE O ELEMENTO ESTRUCTURAL O DE ACABADO, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, SIN DAÑAR AREAS ALEDAÑAS, CARGA Y ACARREO A TIRADERO OFICIAL, CONSERVACION DE LA MISMA, TRABAJO TERMINADO, LIMPIEZAS.	M3	1.07	$274.25	$293.45
32	CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO AL 1er. KM, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	1.07	$48.14	$51.51
33	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES, AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MAS CERCANO AUTORIZADO POR LA SUPERVISION, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3-KM	32.18	$8.11	$260.98
34	COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS DEL TERRENO NATURAL AL 95% DE SU PVSM EN UN ESPESOR DE 20 cm. INCLUYE: ESCARIFICACION, MANIOBRAS, HUMEDECIDO, SELECCION DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO, LIMPIEZAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION, TRABAJO TERMINADO.	M2	5.36	$27.85	$149.28

Obra: **CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE TRAMO 2 Y EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE TRAMO 4**

Ubicación: **TRAMO 2: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE TENIENTE JUAN DE LA BARRERA, COL. HÉROES Y TRAMO 4: DE CALLE NARANJO A AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE, FRACC. JARDINES DE LA CRUZ, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **RODCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (629)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **TRAMO 2**				
	PARTIDA: **BANQUETA Y RAMPA**				
35	RELLENO COMPACTADO AL 90% CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM UTILIZANDO BAILARINA. INCLUYE: SUMINISTRO DE TEPETATE (MATERIAL DE BANCO) EN LA OBRA, ABUNDAMIENTO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CRIBADO, RETIRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	M3	1.07	$358.54	$383.64
36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE DE POLIETILENO CAL 600 PARA IMPERMEABILIZAR, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL A LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, P.U.O.T. SEGUN FICHA TECNICA FT-206	M2	5.36	$19.27	$103.29
37	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", R.N. GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTI DE 10+-2 CM, ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2" SECCION DE LOSAS COMO INDIQUE PROYECTO, INCLUYE: JUNTA A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CELDAS CERRADAS DE 1/2" EN JUNTAS FRIAS LONGITUDINALES CON MUROS Y TRANSVERSALES DEL ELEMENTO, ASI COMO SU UNION CON ELEMENTOS VIEJOS O CAMBIO DE ELEMENTO, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CORTES CON CORTADORA DE DISCO, SELLADO DE CORTES CON SELLADOR AUTONIVELANTE Y TIRA DE RELLENO PREFORMADA NO ADHERENTE DE 1/8" (EN TODAS LAS JUNTAS DE CONTRACCCION Y CONSTRUCCION TRANSVERSALES), CURADO CON MEMBRANA QUIMICA APLICADA CON ASPERSOR, TRABAJO TERMINADO	M2	4.16	$424.02	$1,763.92
38	CONSTRUCCION DE rampa para personas con discapacidad DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", R.N. GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTI DE 10+-2 CM, ACABADO RAYADO tipo lavadero, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2" SECCION DE LOSAS COMO INDIQUE PROYECTO, INCLUYE: JUNTA A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CELDAS CERRADAS DE 1/2" EN JUNTAS FRIAS LONGITUDINALES CON MUROS Y TRANSVERSALES DEL ELEMENTO, ASI COMO SU UNION CON ELEMENTOS VIEJOS O CAMBIO DE ELEMENTO, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CORTES CON CORTADORA DE DISCO, SELLADO DE CORTES CON SELLADOR AUTONIVELANTE Y TIRA DE RELLENO PREFORMADA NO ADHERENTE DE 1/8" (EN TODAS LAS JUNTAS DE CONTRACCCION Y CONSTRUCCION TRANSVERSALES), CURADO CON MEMBRANA QUIMICA APLICADA CON ASPERSOR, TRABAJO TERMINADO	M2	1.2	$459.70	$551.64
			Totales por Partida		**$3,582.52**
	PARTIDA: **LIMPIEZAS**				
39	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: BARRIDO, CARGA, ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO.	M2	969.63	$17.32	$16,793.99
			Totales por Partida		**$16,793.99**
	PARTIDA: **SEÑALIZACION HORIZONTAL**				
40	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE COLOR AZUL (PANTONE 294) EN RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CUALQUIER SECCIÓN SEGÚN PLANOS. INCLUYE: TRAZO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	M2	4.8	$305.08	$1,464.38

Obra: **CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE TRAMO 2 Y EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE TRAMO 4**

Ubicación: **TRAMO 2: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE TENIENTE JUAN DE LA BARRERA, COL. HÉROES Y TRAMO 4: DE CALLE NARANJO A AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE, FRACC. JARDINES DE LA CRUZ, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **RODCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (629)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **TRAMO 2**				
	PARTIDA: **SEÑALIZACION HORIZONTAL**				
41	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LOGOTIPO A (SILLA DE RUEDAS) EN PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE COLOR BLANCO EN RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD TAMAÑO Y DISEÑO SEGÚN PLANOS. INCLUYE: TRAZO, ENMASCARILLADO, PLANTILLA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	PZA	4	$396.34	$1,585.36
42	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE PARA MARCAS EN GUARNICIONES CLASIFICACION M-12.1, M12.2 APLICADA SOBRE GUARNICIONES Y DENTELLONES DE CUALQUIER COLOR, SEGÚN SE REQUIERA Y SEGÚN NORMA S.C.T. SECADO AL TACTO EN 5 MIN Y AL DURO EN 30 MIN CON MICRO ESFERA , DESARROLLO DE 35 CM. INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, TRAZO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	ML	185	$69.69	$12,892.65
43	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACION CLASIFICACIÓN M - 1.1, LÍNEA CONTINUA SENCILLA DE DIVISIÓN DE CARRILES DE FRENTE EN PISO, DE 10 CM DE ANCHO, COLOR BLANCO Y/O AMARILLO CON MICRO ESFERA SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT, SECADO AL TACTO EN 5 MIN Y AL DURO EN 30 MIN. INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/13, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, ;TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	ML	30	$57.09	$1,712.70
44	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACION CLASIFICACIÓN M - 1.2, RAYA DISCONTINUA SENCILLA, DE DIVISIÓN DE CARRILES PARA VELOCIDADES MENORES A 60 KM/HR DE FRENTE EN PISO, DESARROLLO DE 2.50 ML X 0.10 MTS DE ANCHO, CON UNA SEPARACIÓN DE 5.00 MTS ENTRE SI PROMEDIO, A BASE DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR BLANCO CON MICRO ESFERA SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT (S.C.T). INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/13, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, ;TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	ML	115	$57.09	$6,565.35

Obra: **CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE TRAMO 2 Y EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE TRAMO 4**

Ubicación: **TRAMO 2: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE TENIENTE JUAN DE LA BARRERA, COL. HÉROES Y TRAMO 4: DE CALLE NARANJO A AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE, FRACC. JARDINES DE LA CRUZ, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **RODCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (629)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **TRAMO 2**				
	PARTIDA: **SEÑALIZACION HORIZONTAL**				
45	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN RAYA EN LA ORILLA DEL ARROYO VIAL CLASIFICACIÓN M - 3.3, CONTINUA IZQUIERDA, PARA VIALIDADES URBANAS DE FRENTE EN PISO, DE 10 CM DE ANCHO Y SEPARADA 15 CM. DE LA GUARNICION, A BASE DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR BLANCO CON MICRO ESFERA SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT (S.C.T)., INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/13, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, ;TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	ML	185	$57.09	$10,561.65
46	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN RAYA CANALIZADORA CLASIFICACIÓN M - 5, PARA INDICAR ENTRADA Y SALIDA EN BIFURCACIONES, COLOR BLANCO O AMARILLO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT (S.C.T). DE 0.20 MTS DE ANCHO DE LONGITUD Y TRAZO VARIABLE (SEGUN PROYECTO), INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/13, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, ;TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	ML	190	$114.17	$21,692.30
47	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN RAYA PARA CRUCE PEATONAL CLASIFICACIÓN M - 7.1, PARA INDICAR " CRUCE PEATONAL EN VIAS PRIMARIAS", COLOR AMARILLO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT (S.C.T). DE 0.40 MTS DE ANCHO Y 3.5 MTS. DE LONGITUD POR EL ANCHO DE LA VIALIDAD, CON UNA SEPARACIÓN DE 0.40 MTS. ENTRE ELLAS, INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/13, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, ;TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	M2	10	$475.66	$4,756.60

Obra: **CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE TRAMO 2 Y EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE TRAMO 4**

Ubicación: **TRAMO 2: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE TENIENTE JUAN DE LA BARRERA, COL. HÉROES Y TRAMO 4: DE CALLE NARANJO A AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE, FRACC. JARDINES DE LA CRUZ, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **RODCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (629)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **TRAMO 2**				
	PARTIDA: **SEÑALIZACION HORIZONTAL**				
48	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN FLECHAS CLASIFICACIÓN M - 11.1, "FLECHA SENCILLA" PARA INDICAR SENTIDO DE CIRCULACIÓN , EN VIALIDADES PARA VELOCIDAD MENOR A 60KM POR HORA DIMENSION NORMATIVA SEGUN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT (SCT) Y/O (VER PLANO DE SEÑALAMIENTOS), COLOR BLANCO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN NORMA SCT, INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/13, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, ;TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	PZA	5	$1,189.17	$5,945.85
49	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA STANDARD (S-200) DE 10X10CM. COLOR: CUERPO AMARILLO Y REFLEJANTE AMARILLO 1 CARA MARCA SEA O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE FICHA TECNICA, ANCLADO EN PAVIMENTO SISTEMA DE SUJECION DE ALTO AGARRE BASE CUÑAS CON AB PEGAMENTO EPOXICO 50/50 RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (VER PLANO DE DETALLES DE SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL Y VERTICAL). INCLUYE: TRAZO, ALINEACION, ELEVACION CUALQUIER ALTURA, TRABAJO TERMINADO, LIMPIEZAS.	PZA	30	$62.22	$1,866.60
50	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYA DE PLASTICO OJO DE GATO (VT-38), MARCA CREATIVAL O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, CON REFLEJANTE COLOR BLANCO, GRADO ALTA INTENSIDAD, FIJACION A SUPERFICIE CON CLAVOS DE ACERO ALTA RESISTENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, ALINEADO, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJEUCION, TRABAJO TERMINADO.	PZA	180	$464.73	$83,651.40
51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA SOLAR DE 10X10CM. COLOR: CUERPO ALUMINIO 3 LED DOS CARAS REFLEJANTES MARCA CREATIVAL VT-29 O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE FICHA TÉCNICA, FIJADO EN PAVIMENTO CON SISTEMA DE SUJECIÓN DE ALTO AGARRE PEGAMENTO EPOXICO 100 A/B (RESINA EPÓXICA/RESINA POLIAMIDA MODIFICADA), RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (VER PLANO DE DETALLES DE SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL), INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE+C92, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZO, ALINEACIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	PZA	10	$616.92	$6,169.20
				Totales por Partida	**$158,864.04**

Obra: **CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE TRAMO 2 Y EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE TRAMO 4**

Ubicación: **TRAMO 2: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE TENIENTE JUAN DE LA BARRERA, COL. HÉROES Y TRAMO 4: DE CALLE NARANJO A AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE, FRACC. JARDINES DE LA CRUZ, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **RODCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (629)**


GRUPO: **TRAMO 2**

PARTIDA: **SEÑALAMIENTO VERTICAL**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
52	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL DE RESTRICCION SR-9 (VELOCIDAD MAXIMA), DISEÑO NORMATIVO SCT, HECHO A ABASE DE LAMINA GALVANIZADA CON CEJA DE 72 X 72 CM CALIBRE 16, CON TERMINADO GRADO INGENIERIA EN SU TOTALIDAD, EL COLOR SERA REFLEJANTE GRADO INGENIERIA Y SIMBOLOS EN COLOR REFLEJANTE, TODOS LOS COLORES RESISTENTES A LA INTEMPERIE, FIJADA MEDIANTE BARRENADO Y TORNILLOS DE 2 1/2" X 5/16" A UN POSTE DE PTR DE 2 X 2" CALIBRE 14 EN ACABADO GALVANIZADO Y CON UNA ALTURA DE 2.5 MTS AL NIVEL DE BANQUETA A LA PARTE INFERIOR DE LA LAMINA MAS EL EXCEDENTE REQUERIDO PARA FIJAR LAS LAMINAS Y ANCLADO DE 50 CM DE PROFUNDIDAD CON ANGULO TRANSVERSAL DE 1 X 1" DE 25 CM, EN DADO DE CONCRETO F´c=150 KG/CM2 DE 30 CM DE LADO (VER PLANO DE DETALLES CRITERIOS DE ANCLAJE DE SEÑALAMIENTO VERTICAL, DETALLE SEÑ-02 Y SEÑ 03), MCA ASEA O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LIMPIEZAS Y RETIRO DEL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO OFICIAL, TRABAJO TERMINADO.	PZA	1	$3,113.23	$3,113.23
53	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVO SR-22 "PROHIBIDO ESTACIONARSE" DISEÑO NORMATIVO SCT , HECHO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA (CON CEJA) 72 cm x 72 cm CALIBRE 16 CON TERMINADO GRADO DE INGENIERÍA EN SU TOTALIDAD, EL COLOR SERA REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA Y SÍMBOLO EN COLOR REFLEJANTE , TODOS LOS COLORES RESISTENTES A LA INTEMPERIE, FIJADA MEDIANTE BARRENADO Y TORNILLOS DE 2 1/2" x 5/16" A UN POSTE DE PTR O DE 2"x2" CALIBRE 14 EN ACABADO GALVANIZADO Y CON ALTURA DE 2.50 m AL NIVEL DE LA BANQUETA A LA PARTE INFERIOR DE LA LAMINA MAS EL EXCEDENTE REQUERIDO PARA FIJAR LAS LAMINAS Y ANCLADO DE 50 cm DE PROFUNDIDAD CON ANGULO TRANSVERSAL DE 1" x 1" DE 25 cm EN DADO DE CONCRETO F'C=150kg/cm2 DE 30 cm POR LADO (VER PLANO DE DETALLES CRITERIOS DE ANCLAJE DE SEÑALAMIENTO VERTICAL DETALLE SEÑ-02 Y SEÑ-03). MCA. SEA O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-02-002/05 Y N-PRY-CAR-10-01-008/13 APLICADAS AL DIA DE HOY MANO DE OBRA, EXCAVACIONES, Y/O DEMOLICIONES, PREPARACIONES, ANCLADO, NIVELADO, COLADO, FLETES, MANIOBRAS LIMPIEZA Y CARGA Y ACARREOS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO OFICIAL, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	PZA	2	$3,133.23	$6,266.46

Totales por Partida **$9,379.69**

Totales por Grupo **$943,934.59**



Obra: **CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE TRAMO 2 Y EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE TRAMO 4**

Ubicación: **TRAMO 2: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE TENIENTE JUAN DE LA BARRERA, COL. HÉROES Y TRAMO 4: DE CALLE NARANJO A AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE, FRACC. JARDINES DE LA CRUZ, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **RODCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (629)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **TRAMO 4**				
	PARTIDA: **PRELIMINARES Y DEMOLICIONES**				
54	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN PAVIMENTOS, CALLES Y VIALIDADES CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: EJES, BANCO DE NIVEL, RENIVELACIONES LAS VECES NECESARIAS, CORRECCION DE RASANTE A PUNTOS OBLIGADOS (AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION), ESTACAS, VARILLAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPO DE PRECISION CALIBRADO, TRABAJO TERMINADO.P.U.O.T.	M2	1248.06	$4.63	$5,778.52
55	SONDEO A MANO O A MAQUINA PARA LOCALIZACION DE TUBERIAS CUALQUIER PROFUNDIDAD Y MATERIAL PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICO SANITARIAS CUIDANDO NO DAÑARLAS PARA NO INTERFERIR EN LOS SERVICIOS, INCLUYE: EXCAVACION, EQUIPO, MANO DE OBRA, REPORTE A LA SUPERVISION, RELLENOS, COMPACTACIONES, TRABAJO TERMINADO.	SONDE	8	$1,742.88	$13,943.04
56	CORTE CON DISCO DIAMANTADO DE 14" EN PISOS DE CONCRETO ASFALTICO DE HASTA 8.00 cm. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: TRAZO, EQUIPO Y OPERACION, LIMPIEZAS.	ML	45	$34.16	$1,537.20
57	DEMOLICION PARCIAL DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y/O ASFALTICO DE HASTA 15 CM. DE ESPESOR PROMEDIO EN PAVIMENTOS Y (BANQUETAS, LOSAS DIAMANTE Y CAJAS DE VALVULAS, TOPES) CON O SIN ARMADO DE ACERO, SIN RECUPERACION, MUROS, MOJONERAS, ANCLAJES, ETC, DE FORMA MANUAL Y MECANICA, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL AL LUGAR DE ACOPIO, HERRAMIENTA NECESARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LIMPIEZA, TRABAJO TERMINADO	M3	4.8	$271.66	$1,303.97
58	FRESADO UNIFORME DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO 3-7 CM (5 cm de espesor promedio) MEDIANTE FRESADORA EN FRIO COMPACTA, EQUIPADA CON BANDA TRANSPORTADORA PARA CARGA DIRECTA SOBRE CAMION DE VOLTEO, INCLUYE: TRAMO DE PRUEBA AL INICIO DEL FRESADO PARA AUTORIZACION DE SUPERVISION (SUPERFICIE FRESADA UNIFORME Y SIN PROTUBERANCIAS NI ONDEOS), ACARREOS LOCALES, CARGA Y ACARREO A KM SUBSECUENTES (11 A 15 KM APROX) DE MATERIAL PRODUCTO DEL FRESADO DE CARPETA ASFALTICA EL TRASLADO SERA A PARQUE DE MAQUINARIA DE LA SOPMA, PIEZAS DE DESGASTE, COMBUSTIBLES, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, CUALQUIER VOLUMEN Y AREA,EQUIPO NECESARIO, LIMPIEZA FINA Y GRUESA, TRABAJO TERMINADO.	M3	64.8	$1,150.82	$74,573.14
59	REMOCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA SOBRE CONCRETO HIDRÁULICO EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS (MOTO CONFORMADORA), DE HASTA 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, EQUIPO, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE REMOCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A LUGAR DE ACOPIO, PIEZAS DE DESGASTE, COMBUSTIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO, ACARREOS LOCALES, CARGA Y ACARREO A KM SUBSECUENTES (11 A 15 KM APROX) DE MATERIAL PRODUCTO DE REMOCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, EL TRASLADO SERA A PARQUE DE MAQUINARIA DE LA SOPMA	M3	16.2	$356.84	$5,780.81
60	DEMOLICION CONTROLADA DE CONCRETO HIDRAULICO EN DENTELLONES Y GUARNICIONES DE 15 x 20 x 40 CM. DE FORMA MANUAL Y MECÁNICA, INCLUYE: CORTES CON DISCO, ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE ACOPIO PARA SU CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.	ML	15	$26.36	$395.40
61	CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO AL 1er. KM, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	4.98	$59.26	$295.12

Obra: CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE TRAMO 2 Y EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE TRAMO 4

Ubicación: TRAMO 2: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE TENIENTE JUAN DE LA BARRERA, COL. HÉROES Y TRAMO 4: DE CALLE NARANJO A AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE, FRACC. JARDINES DE LA CRUZ, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: RODCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (629)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **TRAMO 4**				
	PARTIDA: **PRELIMINARES Y DEMOLICIONES**				
62	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES, AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MAS CERCANO AUTORIZADO POR LA SUPERVISION, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3-KM	149.4	$9.97	$1,489.52
			Totales por Partida		**$105,096.70**
	PARTIDA: **BACHEO PROFUNDO**				
63	BACHEO PROFUNDO AISLADO UTILIZANDO MATERIAL CALIDAD BASE HIDRAULICA PARA MAS DE UN MILLON DE EJES EQUIVALENTES DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA, INCISO N.CSV.CAR.1.02.004/03 DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARR. DE LA SCT, INCLUYE: PREPARACION, PERFILADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO NECESARIO QUE SE REQUIERA PARA LOGRAR LA COMPACTACION DE 100% PVSM, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, PREPARACION DE MATERIAL, HUMEDECIDO, NIVELADO, TRASLADO DE UN PUNTO A OTRO DENTRO DE LA OBRA, EN CUALQUIER VOLUMEN, MOVIMIENTO DE MAQUINARIA P.U.O.T	M3	123.6200978167	$1,194.07	$147,611.05
64	BACHEO PROFUNDO AISLADO UTILIZANDO MATERIAL CALIDAD BASE HIDRAULICA PARA MAS DE UN MILLON DE EJES EQUIVALENTES DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA, INCISO N.CSV.CAR-1.02.004/03 DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARR. DE LA SCT, BASE HIDRAULICA MEJORADA CON CEMENTO EN PROPORCION DE 40 KILOS DE CEMENTO POR CADA M3, INCLUYE: PREPARACION, PERFILADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO NECESARIO QUE SE REQUIERA PARA LOGRAR LA COMPACTACION DE 100 %, PVSM, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, PREPARACION DE MATERIAL, HUMEDECIDO, NIVELADO, TRASLADO DE UN PUNTO A OTRO DENTRO DE LA OBRA EN CUALQUIER VOLUMEN, MOVIMIENTO DE MAQUINARIA P.U.O.T	M3	72.18	$1,366.11	$98,605.82
			Totales por Partida		**$246,216.87**
	PARTIDA: **SOBRE CARPETA ASFALTICA**				
65	CALAFATEO EN GRIETAS Y/O JUNTAS CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO EN CALIENTE A RAZÓN DE 0.60 LITRO POR M2, EN PROMEDIO, INCLUYE: BARRIDO DE LA GRIETA HASTA DEJAR LA SUPERFICIE LIMPIA Y LIBRE DE POLVO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CALAFATEO DE LA JUNTA CON EMULSIÓN Y ARENA EN GRIETAS EXISTENTES, TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T.	M2	503	$36.74	$18,480.22
66	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE CONTACTO EN LOS EXTREMOS DONDE LA PERFILADORA NO ALCANCE POR LÍMITES CON LA GUARNICIÓN, CON UN RASPADO SUPERFICIAL CON RETROEXCAVADORA, ELIMINANDO TECATAS QUE HAYAN QUEDADO PARA RENIVELADO, BARRIDOS ENTRE PASADA DE MOTOCONFORMADORA Y EN REMATES DE EMPATES A DETALLE A MANO, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRADERO OFICIAL INDICADO.	M2	156	$32.26	$5,032.56

Obra: CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE TRAMO 2 Y EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE TRAMO 4

Ubicación: TRAMO 2: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE TENIENTE JUAN DE LA BARRERA, COL. HÉROES Y TRAMO 4: DE CALLE NARANJO A AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE, FRACC. JARDINES DE LA CRUZ, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: RODCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (629)

GRUPO: TRAMO 4

PARTIDA: SOBRE CARPETA ASFALTICA

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
67	RENIVELACIONES CON CONCRETO ASFALTICO MEZCLA EN PLANTA EN CALIENTE ASFALTO MODIFICADO CON POLIMERO TIPO I, CUMPLIENDO LAS NORMAS SCT REFERENTES DE CONSTRUCCCION Y CONSERVACION, GRANULOMETRIA DENSA 3/4" A FINOS, MEDIDO COMPACTO AL NOVENTA Y CINCO PORCIENTO (95%), INCLUYE CARGA Y ACARREO EN TRAMOS AISLADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES, Y MAQUINARIA Y EQUIPO AL SIGUIENTE PUNTO EN CUALQUIER VOLUEN, PERFILADO, LIMPIEZA DE HUESO Y GRAVA SUELTA, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	M3	48.9817281955	$6,492.80	$318,028.57
68	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMULSIONASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (RIEGO DE SELLADO NEGRO) EN CALIENTE A RAZON DE 1.5 LT/M2 (60% EMULSUON - 40% AGUA) EN TRAMOS AISLADOS O CONTINUO, (DOS CAPAS) Y O SELLADO DE CARPETA ASFALTICA EN REMATES CON GUARNICION EN EL ANCHO QUE LA SUPERVICION INDIQUE, CON USO DE BACHADOR O DE ESPREAS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE (CALAFATEO DE JUNTAS CON EMULSION Y ARENA Y GRIETAS EXISTENTES) NO SE ACEPTA LEVENTAMIENTO DEL RIEGO, TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T.	M2	1248.06	$32.34	$40,362.26
69	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION DE ROMPIMIENTO LENTO (ECL-60 %), INCLUYE BARRIDO DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA A DETALLE, SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, Y APLICACION DE LA EMULSION CON EQUIPO ESPECIAL PARA ESA ACTIVIDAD, ESPREAS LIMPIAS Y ALINEADAS, EN CASO DE RECOMENDARLO EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL CONTRATISTA SE DEBERÁ DAR UN RIEGO MATAPOLVO ANTES DE COLOCAR LA CAPA DE IMPREGNACION, A RAZON DE 1.5 LT DE EMULSION POR M2, O LO QUE INDIQUE EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, NO SE ACEPTAN LEVANTAMIENTO DEL RIEGO, TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T.	M2	1248.06	$24.19	$30,190.57
70	RIEGO DE LIGA CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-65 %), INCLUYE, SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, Y APLICACION DE LA EMULSION CON EQUIPO ESPECIAL PARA ESA ACTIVIDAD, ESPREAS O BACHADOR LIMPIAS Y ALINEADAS, CONTROL DE CALIDAD A CADA DOS REMESAS EN OBRA (INDEPENDIENTEMENTE DE LA CANTIDAD A UTILIZAR) EN LA PETROLIZADORA, A RAZON DE 0.8 LT DE EMULSION POR M2, O LO QUE INDIQUE EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, NO SE ACEPTAN "IMPREGNALIGA", TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T.	M2	1248.06	$14.29	$17,834.78
71	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA ELABORADA CON ASFALTO MODIFICADO TIPO I, AGREGADO 3/4" A FINOS, DE 5 CM DE ESPESOR, FORMADA Y COMPACTADO AL 95%, INCLUYE MATERIALES, QUE CUMPLAN LA NORMATIVA SCT-N-CMT-04-04, SCT-CMT-4-05-002, SCT-CMT-4-05-003, SCT-CMT-4-05-004, SCT-CTR-CAR-1-04-006-14 APLICADAS AL DIA DE HOY, DISEÑO MARSHALL (DEVERÁ SER AUTORIZADO POR EL LABORATORIO DE CALIDAD DE SOPMA AL MENOS 3 DIAS ANTES DE INICIO DE TENDIDO DE LA MEZCLA ASFALTICA), INCUYE: TRAMO DE PRUEBA AL INICIO PARA REVISION Y AUTORIZACION DEL ESPESOR POR PARTE DEL SUPERVISOR, EL CONTRATISTA DEBERÁ PREVEER EL SUMINISTRO Y TIEMPOS MUERTOS POR MOVIMIENTOS DEL TREN DE MAQUINAS DE TRABAJO EN TRAMOS AISLADOS. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. Y LIMPIEZAS DE GRANZON Y HUESO LATERAL.	M2	1248.06	$282.74	$352,876.48
72	COMPACTACION SOBRE MORTERO ASFALTICO TENDIDO EN APROCHES CON GUARNICIONES CON EQUIPO LIGERO (PLANCHITA), INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO, TRABAJO TERMINADO.	M2	156	$11.99	$1,870.44
				Totales por Partida	**$784,675.88**

Obra: **CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE TRAMO 2 Y EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE TRAMO 4**

Ubicación: **TRAMO 2: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE TENIENTE JUAN DE LA BARRERA, COL. HÉROES Y TRAMO 4: DE CALLE NARANJO A AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE, FRACC. JARDINES DE LA CRUZ, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **RODCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (629)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **TRAMO 4**				
	PARTIDA: **OBRA COMPLEMENTARIA**				
73	RE NIVELACIÓN DE POZO DE VISITA HASTA 30 cm DE ALTURA. INCLUYE: RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE BROCAL EXISTENTE, DEMOLICIONES, NIVELADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 28 cm DE ESPESOR, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 , PLOMEADO, NIVELADO, DEMOLICIONES, CARGAS Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	4	$2,951.30	$11,805.20
74	CONSTRUCCION DE LOSA DE DIAMANTE DE CONCRETO MR= 45 , T.M.A. DE 3/4" (19MM), GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 8+-2.5CM CM, FRAGUADO RAPIDOA A 3 DIAS, DE 25 CM DE ESPESOR, EN POZO DE VISITA, Y 1.50 M POR LADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD EN TODO EL PERIMETRO EXTERIOR DE 1/2" ASI COMO DE LAS JUNTAS DIAGONALES PARA FORMAR 4 PARTES, BROCAL Y TAPA DE Fo. Fo. TIPO PESADO, (165 KG), CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA QUIMICA BASE AGUA, APLANADO FINO EN RECEPCION DE BROCAL, CORTES CON CORTADORA DE DISCO DE 5 CM ENTRE JUNTAS DIAGONALES FORMADO 8 PIEZAS Y SELLADO DE JUNTAS Y CORTES CON MATERIAL PREFORMADO Y SELLADOR AUTONIVELANTE, MANO DE OBRA, ACARREOS DE MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	4	$7,676.12	$30,704.48
75	RENIVELACIÓN DE RASANTE (PARTE SUPERIOR) DE CAJA DE VÁLVULAS TIPO 2, ó DE HASTA 1.20 X 1. 30 MTS, NIVELADO HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 10 CM, Y MINIMA DE 5 CM. MEDIDAS INTERIORES INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN, PREPARACIONES , Y DEMOLICIONES, RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE TAPA DE FOFO EXISTENTE, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO COMÚN 7X14X28 CM DE 14 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2.00 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, LOSA DE CONCRETO F´C= 250 KG/CM2 T.M.A. 19 MM DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON VRS No. 3 @15 cm EN AMBOS SENTIDOS, CONTRAMARCO SENCILLO DE CANAL FoFo DE 100 mm, CONTRAMARCO CON TAPA DE FOFO, TIPO PESADO DE 50X50 CM, DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE APROCHES, CARGA Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, LIMPIEZA PREVIA, FINAL, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	1	$15,088.43	$15,088.43
76	RENIVELACIÓN DE RASANTE (PARTE SUPERIOR) DE CAJA DE VÁLVULAS TIPO 8 DE HASTA 2.76 X 2.16MTS, NIVELADO HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 10 CM, Y MINIMA DE 5 CM. MEDIDAS INTERIORES INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN, PREPARACIONES , Y DEMOLICIONES, RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE TAPAS DE FOFO EXISTENTE, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO COMÚN 7X14X28 CM DE 14 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2.00 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, LOSA DE CONCRETO F´C= 250 KG/CM2 T.M.A. 19 MM DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON VRS No. 3 @15 cm EN AMBOS SENTIDOS, 2 CONTRAMARCOS SENCILLO DE CANAL FoFo DE 150 mm, CONTRAMARCOS CON 2 TAPAS DE FOFO, TIPO PESADO DE 50X50 CM, DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE APROCHES, CARGA Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, LIMPIEZA PREVIA, FINAL, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. PZA 2.00	PZA	1	$27,952.11	$27,952.11

Obra: **CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE TRAMO 2 Y EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE TRAMO 4**

Ubicación: **TRAMO 2: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE TENIENTE JUAN DE LA BARRERA, COL. HÉROES Y TRAMO 4: DE CALLE NARANJO A AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE, FRACC. JARDINES DE LA CRUZ, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **RODCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (629)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **TRAMO 4**				
	PARTIDA: **OBRA COMPLEMENTARIA**				
77	LIMPIEZA Y DESASOLVE DE POZOS DE VISITA Y LINEAS DE ALCANTARILLADO EXISTENTE CON CAMION TIPO VACTOR. INCLUYE: RESANE INTERIOR DEL POZO Y REMTE DE POZO CO TUBO CON SELLADOR, FESTER Y MORTERO 1:3, MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LIMPIEZAS, RENTA DE CAMION VACTOR HASTA LA CORRECTA LIMPIEZA DE LAS LINEAS EXISTENTES DE POZO A POZO, ASI COMO EL TRASLADO DE LOS DESECHOS HASTA TIRADERO AUTORIZADO MEDIDO POZO A POZO.	LOTE	5	$4,152.59	$20,762.95
			Totales por Partida		**$106,313.17**
	PARTIDA: **GUARNICIONES**				
78	EXCAVACION A MAQUINA Y/O A MANO EN MATERIAL TIPO II, EN SECO O PRESENCIA DE AGUA, INCLUYE. CORTE DE RAIZ DE CUALQUIER TAMAÑO Y GROSOR, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 40 CM DESPUES DE DESMONTE, DESPALME Y/O DEMOLICION DE SUPERFICIE O ELEMENTO ESTRUCTURAL O DE ACABADO, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, SIN DAÑAR AREAS ALEDAÑAS, CARGA Y ACARREO A TIRADERO OFICIAL, CONSERVACION DE LA MISMA, TRABAJO TERMINADO, LIMPIEZAS.	M3	3.6	$274.25	$987.30
79	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% DE SU P.V.S.M EN SU COMPACTACION., INCLUYE ESCARIFICADO, TENDIDO, HOMOGENIZADO, HUMEDECIDO OPTIMO NIVELADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM, CALIDAD Limite liquido máximo 50%, Valor de Soporte California (CBR) mínimo 15%, Expansión máxima 5%, Grado de Compactación minimo 90% ± 2, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M2	18	$27.85	$501.30
80	CONSTRUCCION DE GUARNICION RECTA Y/O CURVA TRAPEZOIDAL 15-20X40 CM DE SECCION CON CONCRETO PREMEZCLADO MR=38 KGF/CM2, R.N.REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, T.M.A. 3/4", GRAVA TRITURADA, ACABADO PULIDO EN PARTE DE SUPERIOR Y DOBLADOR EN ARISTAS, INCLUYE: COMPACTADO DE PLANTILLA, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ACABADO, DESCIMBRADO, ALINEADO, NIVELADO, Y CURADO EN SU PARTE SUPERIOR CON MEMBRANA BASE AGUA A RAZON DE 1 LTO/M2, JUNTA DE AISLAMIENTO LONGITUDINAL AL COMBINAR CON OTRO ELEMENTO Y TRANSVERSAL @ 30 MT MAXIMO, SELLADO CON SELLADOR AUTONIVELANTE LONGITUDINAL, TRABAJO TERMINADO, .P.U.O.T.	ML	45	$288.66	$12,989.70
81	RELLENO COMPACTADO AL 90% CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM UTILIZANDO BAILARINA. INCLUYE: SUMINISTRO DE TEPETATE (MATERIAL DE BANCO) EN LA OBRA, ABUNDAMIENTO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CRIBADO, RETIRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	M3	1.35	$358.54	$484.03
82	CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO AL 1er. KM, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	2.25	$48.14	$108.31
83	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES, AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MAS CERCANO AUTORIZADO POR LA SUPERVISION, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3-KM	46	$8.11	$373.06
			Totales por Partida		**$15,443.70**

Obra: **CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE TRAMO 2 Y EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE TRAMO 4**

Ubicación: **TRAMO 2: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE TENIENTE JUAN DE LA BARRERA, COL. HÉROES Y TRAMO 4: DE CALLE NARANJO A AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE, FRACC. JARDINES DE LA CRUZ, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **RODCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (629)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **TRAMO 4**				
	PARTIDA: **BANQUETA Y RAMPA**				
84	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN PAVIMENTOS, CALLES Y VIALIDADES CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: EJES, BANCO DE NIVEL, RENIVELACIONES LAS VECES NECESARIAS, CORRECCION DE RASANTE A PUNTOS OBLIGADOS (AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION), ESTACAS, VARILLAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPO DE PRECISION CALIBRADO, TRABAJO TERMINADO.P.U.O.T.	M2	12.5	$4.63	$57.88
85	EXCAVACION A MAQUINA Y/O A MANO EN MATERIAL TIPO II, EN SECO O PRESENCIA DE AGUA, INCLUYE. CORTE DE RAIZ DE CUALQUIER TAMAÑO Y GROSOR, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 40 CM DESPUES DE DESMONTE, DESPALME Y/O DEMOLICION DE SUPERFICIE O ELEMENTO ESTRUCTURAL O DE ACABADO, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, SIN DAÑAR AREAS ALEDAÑAS, CARGA Y ACARREO A TIRADERO OFICIAL, CONSERVACION DE LA MISMA, TRABAJO TERMINADO, LIMPIEZAS.	M3	2.5	$274.25	$685.63
86	CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO AL 1er. KM, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	2.5	$48.14	$120.35
87	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES, AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MAS CERCANO AUTORIZADO POR LA SUPERVISION, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3-KM	75	$8.11	$608.25
88	COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS DEL TERRENO NATURAL AL 95% DE SU PVSM EN UN ESPESOR DE 20 cm. INCLUYE: ESCARIFICACION, MANIOBRAS, HUMEDECIDO, SELECCION DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO, LIMPIEZAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION, TRABAJO TERMINADO.	M2	12.5	$27.85	$348.13
89	RELLENO COMPACTADO AL 90% CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM UTILIZANDO BAILARINA. INCLUYE: SUMINISTRO DE TEPETATE (MATERIAL DE BANCO) EN LA OBRA, ABUNDAMIENTO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CRIBADO, RETIRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	M3	2.5	$358.54	$896.35
90	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE DE POLIETILENO CAL 600 PARA IMPERMEABILIZAR, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL A LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, P.U.O.T. SEGUN FICHA TECNICA FT-206	M2	12.5	$19.27	$240.88
91	CONSTRUCCION DE rampa para personas con discapacidad DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", R N GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTI DE 10+-2 CM, ACABADO RAYADO tipo lavadero, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2" SECCION DE LOSAS COMO INDIQUE PROYECTO, INCLUYE: JUNTA A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CELDAS CERRADAS DE 1/2" EN JUNTAS FRIAS LONGITUDINALES CON MUROS Y TRANSVERSALES DEL ELEMENTO, ASI COMO SU UNION CON ELEMENTOS VIEJOS O CAMBIO DE ELEMENTO, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CORTES CON CORTADORA DE DISCO, SELLADO DE CORTES CON SELLADOR AUTONIVELANTE Y TIRA DE RELLENO PREFORMADA NO ADHERENTE DE 1/8" (EN TODAS LAS JUNTAS DE CONTRACCCION Y CONSTRUCCION TRANSVERSALES), CURADO CON MEMBRANA QUIMICA APLICADA CON ASPERSOR, TRABAJO TERMINADO	M2	12.5	$459.70	$5,746.25
				Totales por Partida	**$8,703.70**

Obra: **CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE TRAMO 2 Y EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE TRAMO 4**

Ubicación: **TRAMO 2: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE TENIENTE JUAN DE LA BARRERA, COL. HÉROES Y TRAMO 4: DE CALLE NARANJO A AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE, FRACC. JARDINES DE LA CRUZ, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **RODCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (629)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **TRAMO 4**				
	PARTIDA: **LIMPIEZAS**				
92	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: BARRIDO, CARGA, ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO.	M2	1248.06	$17.32	$21,616.40
			Totales por Partida		**$21,616.40**
	PARTIDA: **SEÑALIZACION HORIZONTAL**				
93	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE COLOR AZUL (PANTONE 294) EN RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CUALQUIER SECCIÓN SEGÚN PLANOS. INCLUYE: TRAZO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	M2	13	$305.08	$3,966.04
94	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LOGOTIPO A (SILLA DE RUEDAS) EN PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE COLOR BLANCO EN RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD TAMAÑO Y DISEÑO SEGÚN PLANOS. INCLUYE: TRAZO, ENMASCARILLADO, PLANTILLA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	PZA	5	$396.34	$1,981.70
95	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE PARA MARCAS EN GUARNICIONES CLASIFICACION M-12.1, M12.2 APLICADA SOBRE GUARNICIONES Y DENTELLONES DE CUALQUIER COLOR, SEGÚN SE REQUIERA Y SEGÚN NORMA S.C.T. SECADO AL TACTO EN 5 MIN Y AL DURO EN 30 MIN CON MICRO ESFERA , DESARROLLO DE 35 CM. INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, TRAZO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	ML	385	$69.69	$26,830.65
96	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACION CLASIFICACIÓN M - 1.1, LÍNEA CONTINUA SENCILLA DE DIVISIÓN DE CARRILES DE FRENTE EN PISO, DE 10 CM DE ANCHO, COLOR BLANCO Y/O AMARILLO CON MICRO ESFERA SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT, SECADO AL TACTO EN 5 MIN Y AL DURO EN 30 MIN. INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01 001/13, N PRY CAR 10 01 002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, ;TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	ML	30	$57.09	$1,712.70

Obra: **CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE TRAMO 2 Y EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE TRAMO 4**

Ubicación: **TRAMO 2: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE TENIENTE JUAN DE LA BARRERA, COL. HÉROES Y TRAMO 4: DE CALLE NARANJO A AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE, FRACC. JARDINES DE LA CRUZ, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **RODCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (629)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **TRAMO 4**				
	PARTIDA: **SEÑALIZACION HORIZONTAL**				
97	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACION CLASIFICACIÓN M - 1.2, RAYA DISCONTINUA SENCILLA, DE DIVISIÓN DE CARRILES PARA VELOCIDADES MENORES A 60 KM/HR DE FRENTE EN PISO, DESARROLLO DE 2.50 ML X 0.10 MTS DE ANCHO, CON UNA SEPARACIÓN DE 5.00 MTS ENTRE SI PROMEDIO, A BASE DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR BLANCO CON MICRO ESFERA SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT (S.C.T). INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/13, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, ;TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	ML	160	$57.09	$9,134.40
98	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN RAYA EN LA ORILLA DEL ARROYO VIAL CLASIFICACIÓN M - 3.3, CONTINUA IZQUIERDA, PARA VIALIDADES URBANAS DE FRENTE EN PISO, DE 10 CM DE ANCHO Y SEPARADA 15 CM. DE LA GUARNICION, A BASE DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR BLANCO CON MICRO ESFERA SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT (S.C.T)., INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/13, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, ;TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	ML	175	$57.09	$9,990.75
99	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN RAYA CANALIZADORA CLASIFICACIÓN M - 5, PARA INDICAR ENTRADA Y SALIDA EN BIFURCACIONES, COLOR BLANCO O AMARILLO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT (S.C.T). DE 0.20 MTS DE ANCHO DE LONGITUD Y TRAZO VARIABLE (SEGUN PROYECTO), INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/13, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, ;TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	ML	72.5	$114.17	$8,277.33

Obra: **CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE TRAMO 2 Y EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE TRAMO 4**

Ubicación: **TRAMO 2: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE TENIENTE JUAN DE LA BARRERA, COL. HÉROES Y TRAMO 4: DE CALLE NARANJO A AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE, FRACC. JARDINES DE LA CRUZ, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **RODCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (629)**


No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **TRAMO 4**				
	PARTIDA: **SEÑALIZACION HORIZONTAL**				
100	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN RAYA DE ALTO CLASIFICACIÓN M - 6, PARA INDICAR ALTO EN CRUCEROS, COLOR BLANCO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT (S.C.T). DE 0.60 MTS DE ANCHO DE LONGITUD VARIABLE, INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/13, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, ;TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	ML	11	$336.10	$3,697.10
101	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN RAYA PARA CRUCE PEATONAL CLASIFICACIÓN M - 7.1, PARA INDICAR " CRUCE PEATONAL EN VIAS PRIMARIAS", COLOR AMARILLO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT (S.C.T). DE 0.40 MTS DE ANCHO Y 3.5 MTS. DE LONGITUD POR EL ANCHO DE LA VIALIDAD, CON UNA SEPARACIÓN DE 0.40 MTS. ENTRE ELLAS, INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/13, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, ;TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	M2	136.5	$475.66	$64,927.59
102	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN FLECHAS CLASIFICACIÓN M - 11.1, "FLECHA SENCILLA" PARA INDICAR SENTIDO DE CIRCULACIÓN , EN VIALIDADES PARA VELOCIDAD MENOR A 60KM POR HORA DIMENSION NORMATIVA SEGUN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT (SCT) Y/O (VER PLANO DE SEÑALAMIENTOS), COLOR BLANCO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN NORMA SCT, INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/13, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, ;TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	PZA	4	$1,189.17	$4,756.68

Obra: CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE TRAMO 2 Y EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE TRAMO 4

Ubicación: TRAMO 2: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE TENIENTE JUAN DE LA BARRERA, COL. HÉROES Y TRAMO 4: DE CALLE NARANJO A AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE, FRACC. JARDINES DE LA CRUZ, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: RODCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (629)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **TRAMO 4**				
	PARTIDA: **SEÑALIZACION HORIZONTAL**				
103	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA STANDARD (S-200) DE 10X10CM. COLOR: CUERPO AMARILLO Y REFLEJANTE AMARILLO 1 CARA MARCA SEA O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE FICHA TECNICA, ANCLADO EN PAVIMENTO SISTEMA DE SUJECION DE ALTO AGARRE BASE CUÑAS CON AB PEGAMENTO EPOXICO 50/50 RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (VER PLANO DE DETALLES DE SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL Y VERTICAL). INCLUYE: TRAZO, ALINEACION, ELEVACION CUALQUIER ALTURA, TRABAJO TERMINADO, LIMPIEZAS.	PZA	44	$62.22	$2,737.68
104	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYA DE PLASTICO OJO DE GATO (VT-38), MARCA CREATIVAL O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, CON REFLEJANTE COLOR BLANCO, GRADO ALTA INTENSIDAD, FIJACION A SUPERFICIE CON CLAVOS DE ACERO ALTA RESISTENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, ALINEADO, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJEUCION, TRABAJO TERMINADO.	PZA	40	$464.73	$18,589.20
				Totales por Partida	**$156,601.82**
	PARTIDA: **SEÑALAMIENTO VERTICAL**				
106	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL DE RESTRICCION SR-9 (VELOCIDAD MAXIMA), DISEÑO NORMATIVO SCT, HECHO A ABASE DE LAMINA GALVANIZADA CON CEJA DE 72 X 72 CM CALIBRE 16, CON TERMINADO GRADO INGENIERIA EN SU TOTALIDAD, EL COLOR SERA REFLEJANTE GRADO INGENIERIA Y SIMBOLOS EN COLOR REFLEJANTE, TODOS LOS COLORES RESISTENTES A LA INTEMPERIE, FIJADA MEDIANTE BARRENADO Y TORNILLOS DE 2 1/2" X 5/16" A UN POSTE DE PTR DE 2 X 2" CALIBRE 14 EN ACABADO GALVANIZADO Y CON UNA ALTURA DE 2.5 MTS AL NIVEL DE BANQUETA A LA PARTE INFERIOR DE LA LAMINA MAS EL EXCEDENTE REQUERIDO PARA FIJAR LAS LAMINAS Y ANCLADO DE 50 CM DE PROFUNDIDAD CON ANGULO TRANSVERSAL DE 1 X 1" DE 25 CM, EN DADO DE CONCRETO F´c=150 KG/CM2 DE 30 CM DE LADO (VER PLANO DE DETALLES CRITERIOS DE ANCLAJE DE SEÑALAMIENTO VERTICAL, DETALLE SEÑ-02 Y SEÑ 03), MCA ASEA O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LIMPIEZAS Y RETIRO DEL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO OFICIAL, TRABAJO TERMINADO.	PZA	2	$3,113.23	$6,226.46
				Totales por Partida	**$6,226.46**
				Totales por Grupo	**$1,450,894 70**
				Totales Presup.	**$2,394,829.29**
				Anticipo +	**$1,152,767.16**
				Amortizac. Ant. -	**$1,152,767.16**
				SubTotal. Ant. =	**$2,394,829.29**
				IVA +	**$383,172.69**
				Total =	**$2,778,001.98**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

PRESUPUESTO MODIFICADO

Aguascalientes

Obra: CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE TRAMO 2 Y EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE TRAMO 4

Ubicación: TRAMO 2: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE TENIENTE JUAN DE LA BARRERA, COL. HÉROES Y TRAMO 4: DE CALLE NARANJO A AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE, FRACC. JARDINES DE LA CRUZ, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: RODCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (629)

Grupo	Partida	Importe
TRAMO 2		
	PRELIMINARES Y DEMOLICIONES	$72,814.53
	BACHEO PROFUNDO	$105,136.63
	SOBRE CARPETA ASFALTICA	$540,439.38
	OBRA COMPLEMENTARIA	$33,712.61
	GUARNICIONES	$3,211.20
	BANQUETA Y RAMPA	$3,582.52
	LIMPIEZAS	$16,793.99
	SEÑALIZACION HORIZONTAL	$158,864.04
	SEÑALAMIENTO VERTICAL	$9,379.69
	Subtotal por Grupo	**$943,934.59**
TRAMO 4		
	PRELIMINARES Y DEMOLICIONES	$105,096.70
	BACHEO PROFUNDO	$246,216.87
	SOBRE CARPETA ASFALTICA	$784,675.88
	OBRA COMPLEMENTARIA	$106,313.17
	GUARNICIONES	$15,443.70
	BANQUETA Y RAMPA	$8,703.70
	LIMPIEZAS	$21,616.40
	SEÑALIZACION HORIZONTAL	$156,601.82
	SEÑALAMIENTO VERTICAL	$6,226.46
	Subtotal por Grupo	**$1,450,894.70**

Totales Presup.		**$2,394,829.29**
Anticipo	+	**$1,152,767.16**
Amortizac. Ant.	-	**$1,152,767.16**
SubTotal. Ant.	=	**$2,394,829.29**
IVA	+	**$383,172.69**
Total	=	**$2,778,001.98**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024


H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


MEMORIA FOTOGRAFICA


OBRA:	CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA EN AV. DE LA CONVENCION DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE TRAMO 2, LATERAL CALZADA PONIENTE TRAMO 4 (TRAMO 2-4)					
NO. DE CONTRATO:	FISMDF-0129-2022		CONTRATISTA:	RODCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		

INICIO.

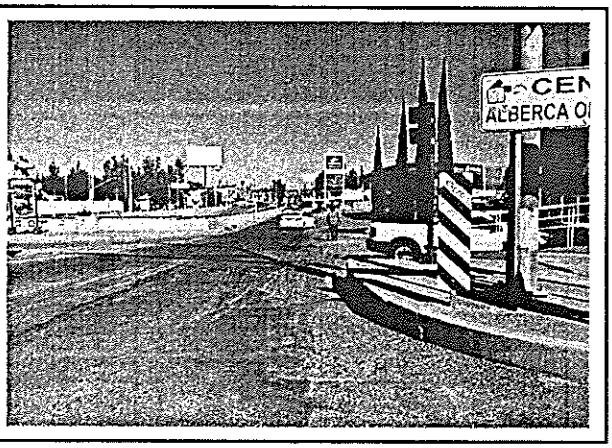

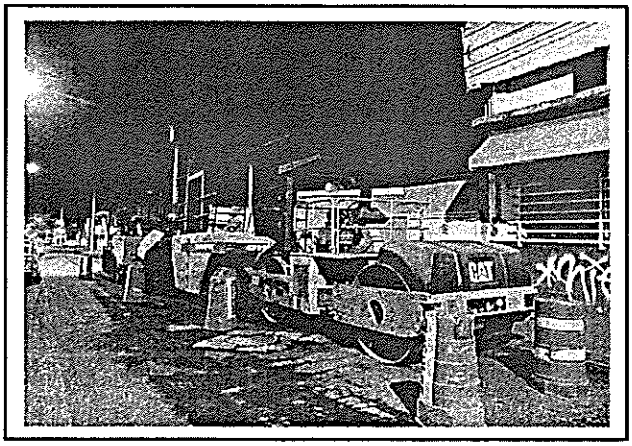

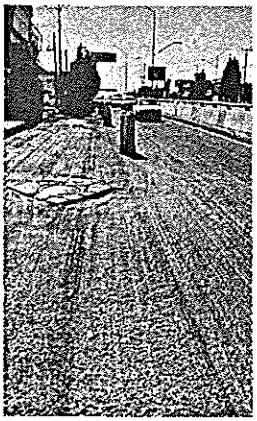

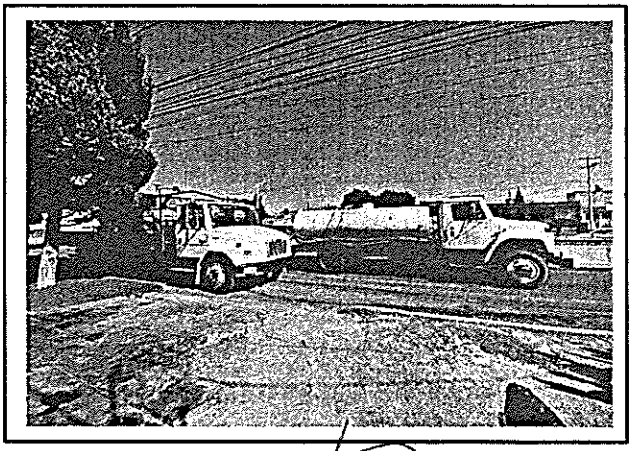

ARQ. CESAR RODOLFO ROMO RIVAS
SUPERVISOR DE OBRA.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024


H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


MEMORIA FOTOGRAFICA


OBRA:	CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA EN AV. DE LA CONVENCION DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE TRAMO 2, LATERAL CALZADA PONIENTE TRAMO 4 (TRAMO 2-4)					
NO. DE CONTRATO:	FISMDF-0129-2022		CONTRATISTA:	RODCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		

PROCESO

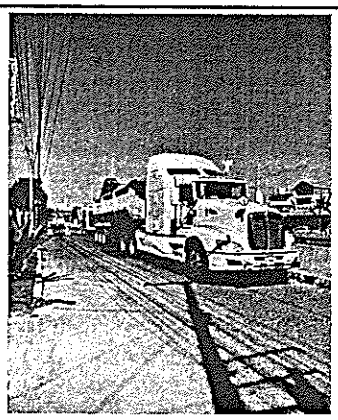

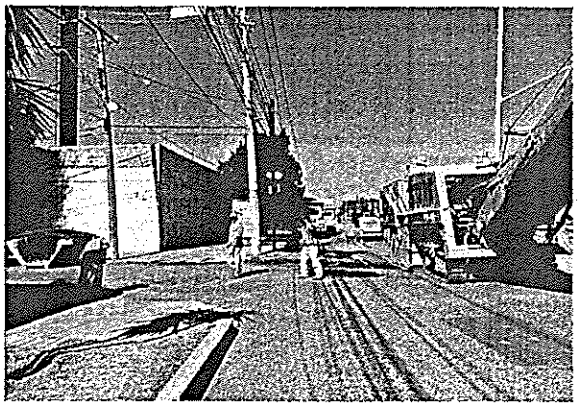

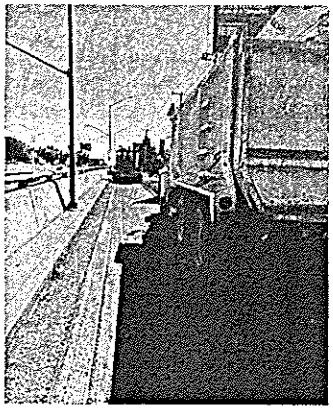

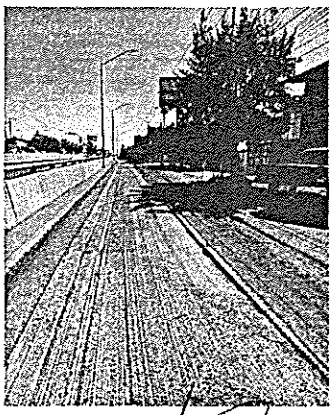

ARQ. CESAR RODOLFO ROMO RIVAS
SUPERVISOR DE OBRA.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS


DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


MEMORIA FOTOGRAFICA

OBRA:	CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA EN AV. DE LA CONVENCION DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE TRAMO 2, LATERAL CALZADA PONIENTE TRAMO 4 (TRAMO 2-4)					
NO. DE CONTRATO:	FISMDF-0129-2022		CONTRATISTA:	RODCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		

TERMINO

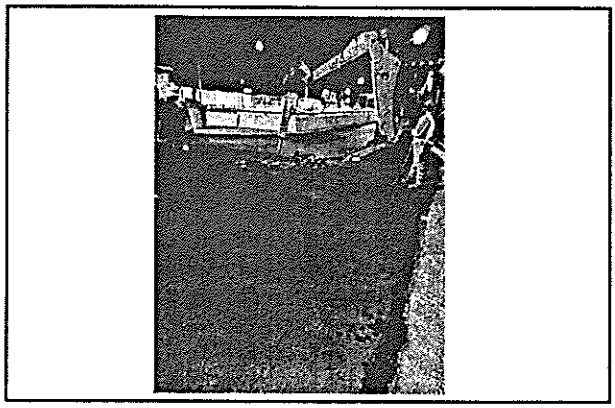

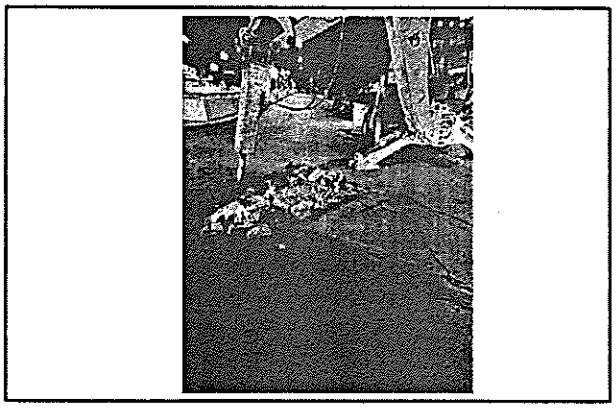

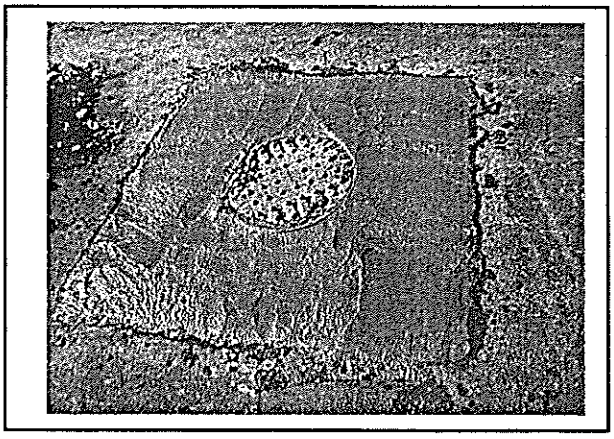

ARQ. CESAR RODOLFO ROMO RIVAS
SUPERVISOR DE OBRA.

MODIFICADO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

EJERCICIO 2022

N° DE CONTRATO: FISMDF-0129-2022

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA EN AV. DE LA CONVENCION DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE TRAMO 2, LATERAL CALZADA PONIENTE TRAMO 4 (TRAMO 2-4)

MONTO MODIFICADO FINAL: $ 2,778,001.98

VOLUMEN	UNIDAD	COMPONENTE DE LA OBRA	MONTO
104.80	M3	FRESADO UNIFORME DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO 3-7 CM (5 cm de espesor promedio) MEDIANTE FRESADORA EN FRIO COMPACTA, EQUIPADA CON BANDA TRANSPORTADORA PARA CARGA DIRECTA SOBRE CAMION DE VOLTEO, INCLUYE: TRAMO DE PRUEBA AL INICIO DEL	$ 177,911.23
88.78	M3	BACHEO PROFUNDO AISLADO UTILIZANDO MATERIAL CALIDAD BASE HIDRAULICA PARA MAS DE UN MILLON DE EJES EQUIVALENTES DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA, INCISO N.CSV.CAR.1.02.004/03 DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARR. DE LA SCT, INCLUYE: PREPARACION, PERFILADO, MATERIALES, MANO DE OBRA,	$ 351,353.50
2213.49	M2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA ELABORADA CON ASFALTO MODIFICADO TIPO I, AGREGADO 3/4" A FINOS, DE 5 CM DE ESPESOR, FORMADA Y COMPACTADO AL 95%, INCLUYE MATERIALES, QUE CUMPLAN LA NORMATIVA SCT-N-CMT-04-04, SCT-	$ 1,325,115.26
6.00	PZA	CONSTRUCCION DE LOSA DE DIAMANTE DE CONCRETO MR= 45 , T.M.A. DE 3/4" (19MM), GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 8+- 2.5CM CM, FRAGUADO RAPIDOA A 3 DIAS, DE 25 CM DE ESPESOR, EN POZO DE VISITA, Y 1.50 M POR LADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD EN	$ 140,025.78
54.25	ML	CONSTRUCCION DE GUARNICION RECTA Y/O CURVA TRAPEZOIDAL 15-20X40 CM DE SECCION CON CONCRETO PREMEZCLADO MR=38 KGF/CM2, R.N.REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, T.M.A. 3/4", GRAVA TRITURADA, ACABADO PULIDO EN PARTE DE SUPERIOR Y DOBLADOR EN ARISTAS, INCLUYE: COMPACTADO DE PLANTILLA,	$ 18,654.90
13.70	M2	CONSTRUCCION DE rampa para personas con discapacidad DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", R.N. GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTI DE 10+-2 CM, ACABADO RAYADO tipo lavadero, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2" SECCION DE LOSAS COMO INDIQUE PROYECTO, INCLUYE:	$ 12,286.22
2217.69	M2	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: BARRIDO, CARGA, ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO.	$ 38,410.39
220.00	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYA DE PLASTICO OJO DE GATO (VT-38), MARCA CREATIVAL O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, CON REFLEJANTE COLOR BLANCO, GRADO ALTA INTENSIDAD, FIJACION A SUPERFICIE CON CLAVOS DE ACERO ALTA RESISTENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE	$ 315,465.86
4.00	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVO SR-22 "PROHIBIDO ESTACIONARSE" DISEÑO NORMATIVO SCT , HECHO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA (CON CEJA) 72 cm x 72 cm CALIBRE 16 CON TERMINADO GRADO DE INGENIERÍA EN SU TOTALIDAD, EL COLOR SERA REFLEJANTE	$ 15,606.15

TOTAL PRESUP.	$	2,394,829.29
IVA	$	383,172.69
TOTAL	$	2,778,001.98




NOMBRE DEL SUPERVISOR: ARQ. CESAR RODOLFO ROMO RIVAS





CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

SIN ESCALA AV. DE LA CONVENCION DE 1914 OTE CALZADA ORIENTE 12 ENTRE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS CALZADA NORTE Y TENIENTE JUAN DE LA BARRERA



SIMBOLOGÍA

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no se responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
Ing. Miguel Ángel Huizar Botello

REV.	FECHA	OBSERVACIONES

Vo. Bo. DE LA DEPENDENCIA

RESP. DE PROY. EXTERNO		LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL		
PROYECTÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ


Dirección de Planeación y Proyectos de Obra — Secretaría de Obras Públicas

PROYECTISTA	COORDINADOR
ARQ ALVARO DAVID MEJIA CONTRERAS	ARQ. ALEJANDRO JAIME LEAL
JEFE DE DEP.	DIRECTOR
LIC OMAR ALEJANDRO LUBÁN GARCÍA	ARQ ALEJANDRO PONCE RODRIGUEZ

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE, TRAMO 2 Y EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE, TRAMO 4.
UBICACIÓN
TRAMO 2: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE TENIENTE JUAN DE LA BARRERA, COL. HÉROES Y TRAMO 4: DE CALLE NARANJO A AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE, FRACC. JARDINES DE LA CRUZ.
CONTENIDO
CROQUIS DE LOCALIZACION

CLAVE	No. PLANO
LOC 01	01
FECHA	ESCALA
NOV 2022	INDICADA
ACOTACION	No. EXP.
METROS	E-000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

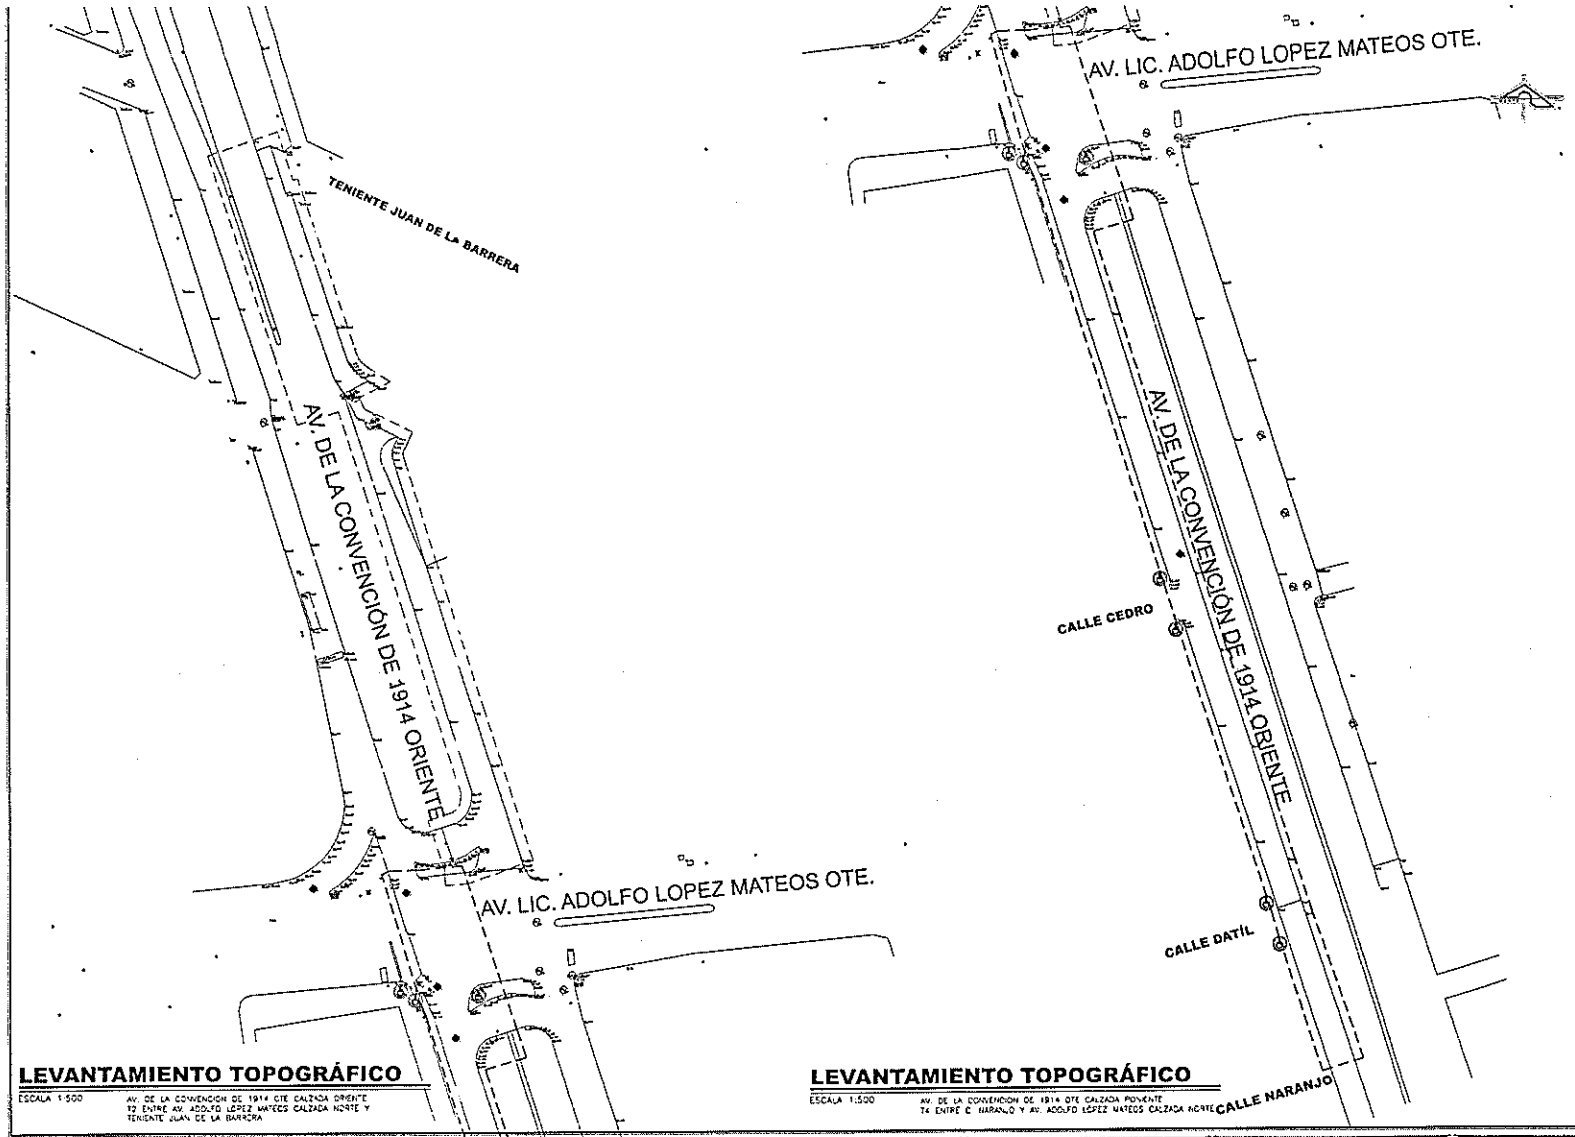

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

ESCALA 1:500


AV. DE LA CONVENCION DE 1914 OTE CALZADA ORIENTE
92 ENTRE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS CALZADA NORTE Y
TENIENTE JUAN DE LA BARRERA

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

ESCALA 1:500

AV. DE LA CONVENCION DE 1914 OTE CALZADA PONIENTE
74 ENTRE C. NARANJO Y AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS CALZADA NORTE

LOCALIZACION



SIMBOLOGIA

SIMBOLOGIA

- LIMITE DE PROYECTO
- LUM — POSTE LUMINARIA
- CFE — POSTE DE CFE
- TEL — POSTE DE TELMEX
- REG — REGISTRO
- POST — POSTE
- REGISTROS CFE
- REGISTRO SEMAFORO
- REGISTROS TELMEX
- TELEFONO — TELEFONO
- POZO DE VISITA
- CAJA DE VALVULAS
- SEMAFOROS
- CAIMAN — CAIMANES
- ANUNCIO — ANUNCIO
- RETENIDA PCS — RETENIDA POSTE

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
Ing. Miguel Ángel Huizar Botello

REV.	FECHA	OBSERVACIONES

V°B° DE LA DEPENDENCIA

RESP. DE PROY. EXTERNO		LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL		
PROYECTÓ	REVISO	AUTORIZÓ

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra — Secretaría de Obras Públicas

PROYECTISTA	COORDINADOR
ARQ. ALVARO DAVID MEZA CONTRERAS	ARQ. ALEJANDRO JAIME LEAL
JEFE DE DEP.	DIRECTOR
LU. OMAR ALEJANDRO LUGÑA GARCÍA	ARQ. ALEJANDRO PONCE RODRIGUEZ


PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE, TRAMO 2 Y EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE, TRAMO 4.


LOCALIZACIÓN
TRAMO 2: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE TENIENTE JUAN DE LA BARRERA, COL. HÉROES Y TRAMO 4: DE CALLE NARANJO A AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE, FRACC. JARDINES DE LA CRUZ.

CONTENIDO
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

CLAVE	No. PLANO
LEV 01	02
FECHA	ESCALA
NOV 2022	INDICADA
ACOTACIÓN	No. EXP.
METROS	E-000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

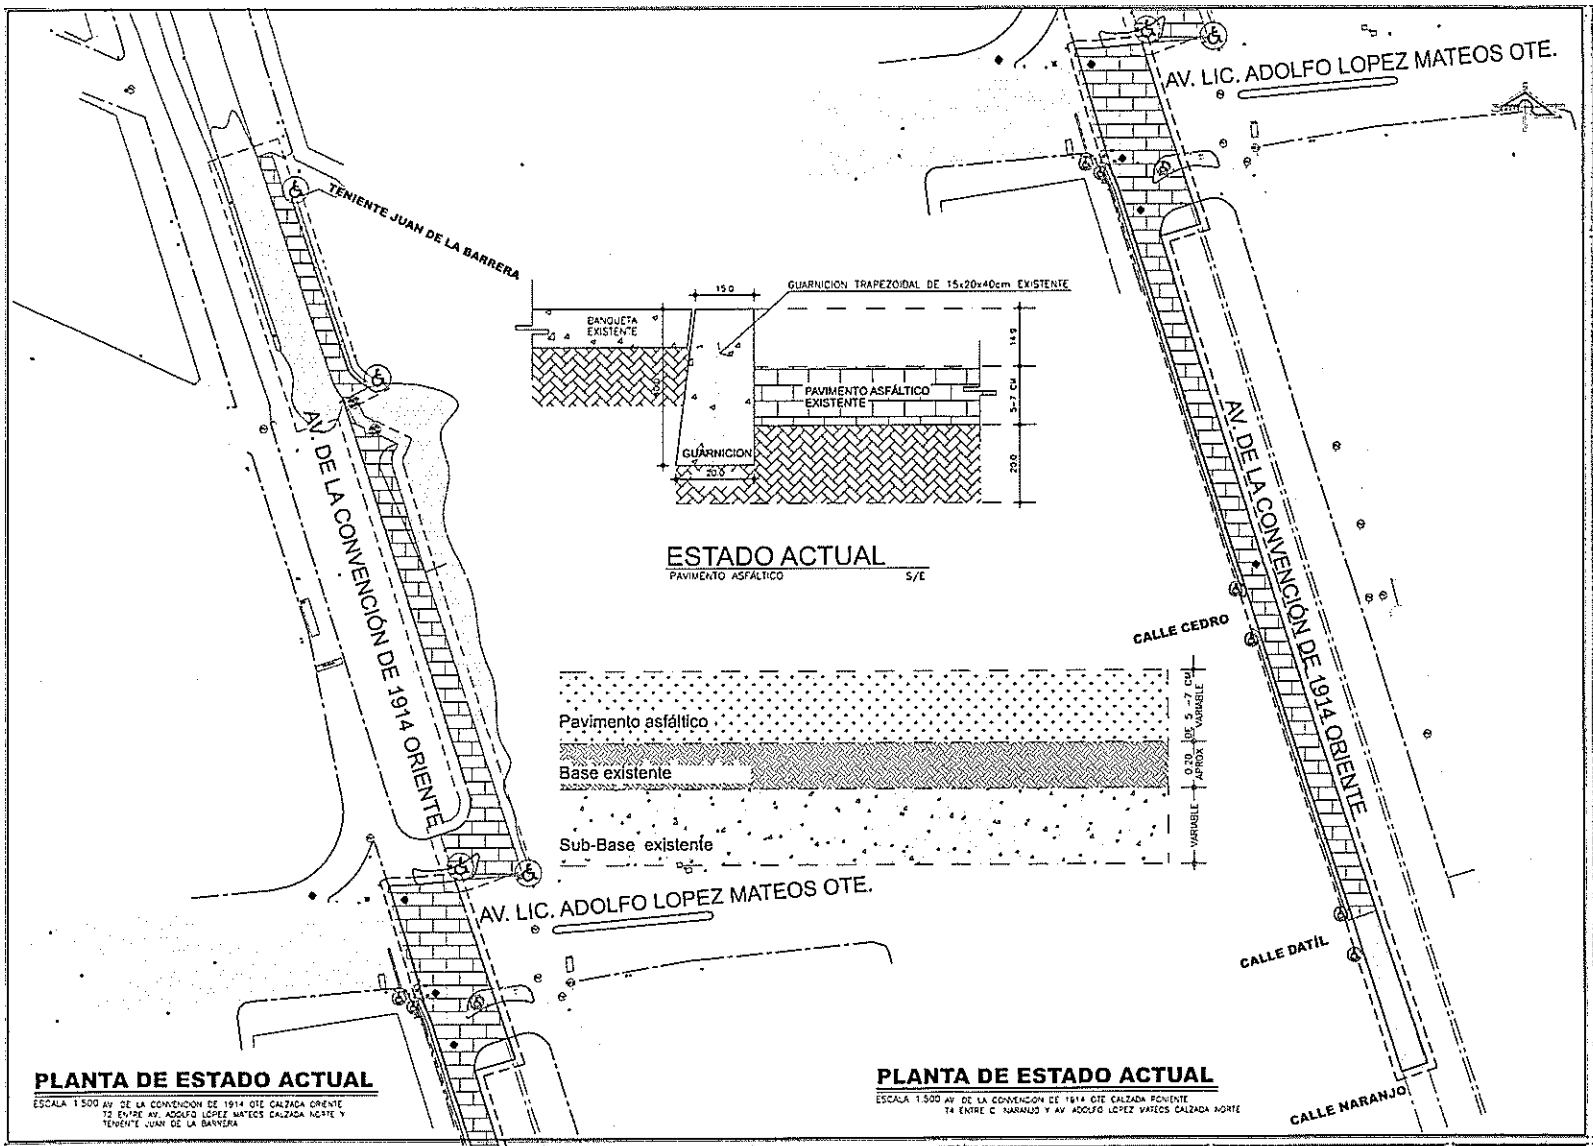



SIMBOLOGÍA

- LIMITE DE PROYECTO
- PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE
- BANQUETA DE CONCRETO EXISTENTE
- PAVIMENTO HIDRAULICO EXISTENTE
- GUARNICIÓN EXISTENTE
- LUM — POSTE LUMINARIA
- CFE — POSTE DE CFE
- TEL — POSTE DE TELMEX
- REG — REGISTRO
- POSTE — POSTE
- REGISTROS CFE
- REGISTRO SEMAFORO
- REGISTROS TELMEX
- TELEFONO — TELEFONO
- POZO DE VISITA
- CAJA DE VALVULAS
- SEMAFOROS
- CAIMAN — CAIMANES
- ANUNCIO — ANUNCIO
- RETENDA POS — RETENDA POSTE

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
Ing. Miguel Ángel Huizar Botello

REV.	FECHA	OBSERVACIONES

Vo. Bo. DE LA DEPENDENCIA

RESP. DE PROY. EXTERNO	LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL	
PROYECTO / REVISO / AUTORIZO	

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra — Secretaría de Obras Públicas

PROYECTISTA	COORDINADOR
ARQ. ALVARO DAVID MEZA CONTRERAS	ARQ. ALEJANDRO JAIME LEAL
JEFE DE DEP.	DIRECTOR
LIC. OMAR ALEJANDRO LUJÁN GARCÍA	ARQ. ALEJANDRO PONCE RODRIGUEZ


PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE SOBRE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE, TRAMO 3 Y EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE, TRAMO 4.

UBICACIÓN: TRAMO 3 DE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE TENIENTE JUAN DE LA BARRERA, COL. HÉROES Y TRAMO 4 DE CALLE NARANJO A AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE, FRACC. JARDINES DE LA CRUZ.

CONTENIDO: PLANTA ESTADO ACTUAL

CLAVE	No. PLANO
EA 01	03
FECHA: NOV 2022	ESCALA: INDICADA
ACOTACIÓN: METROS	No. EXP.: E-000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

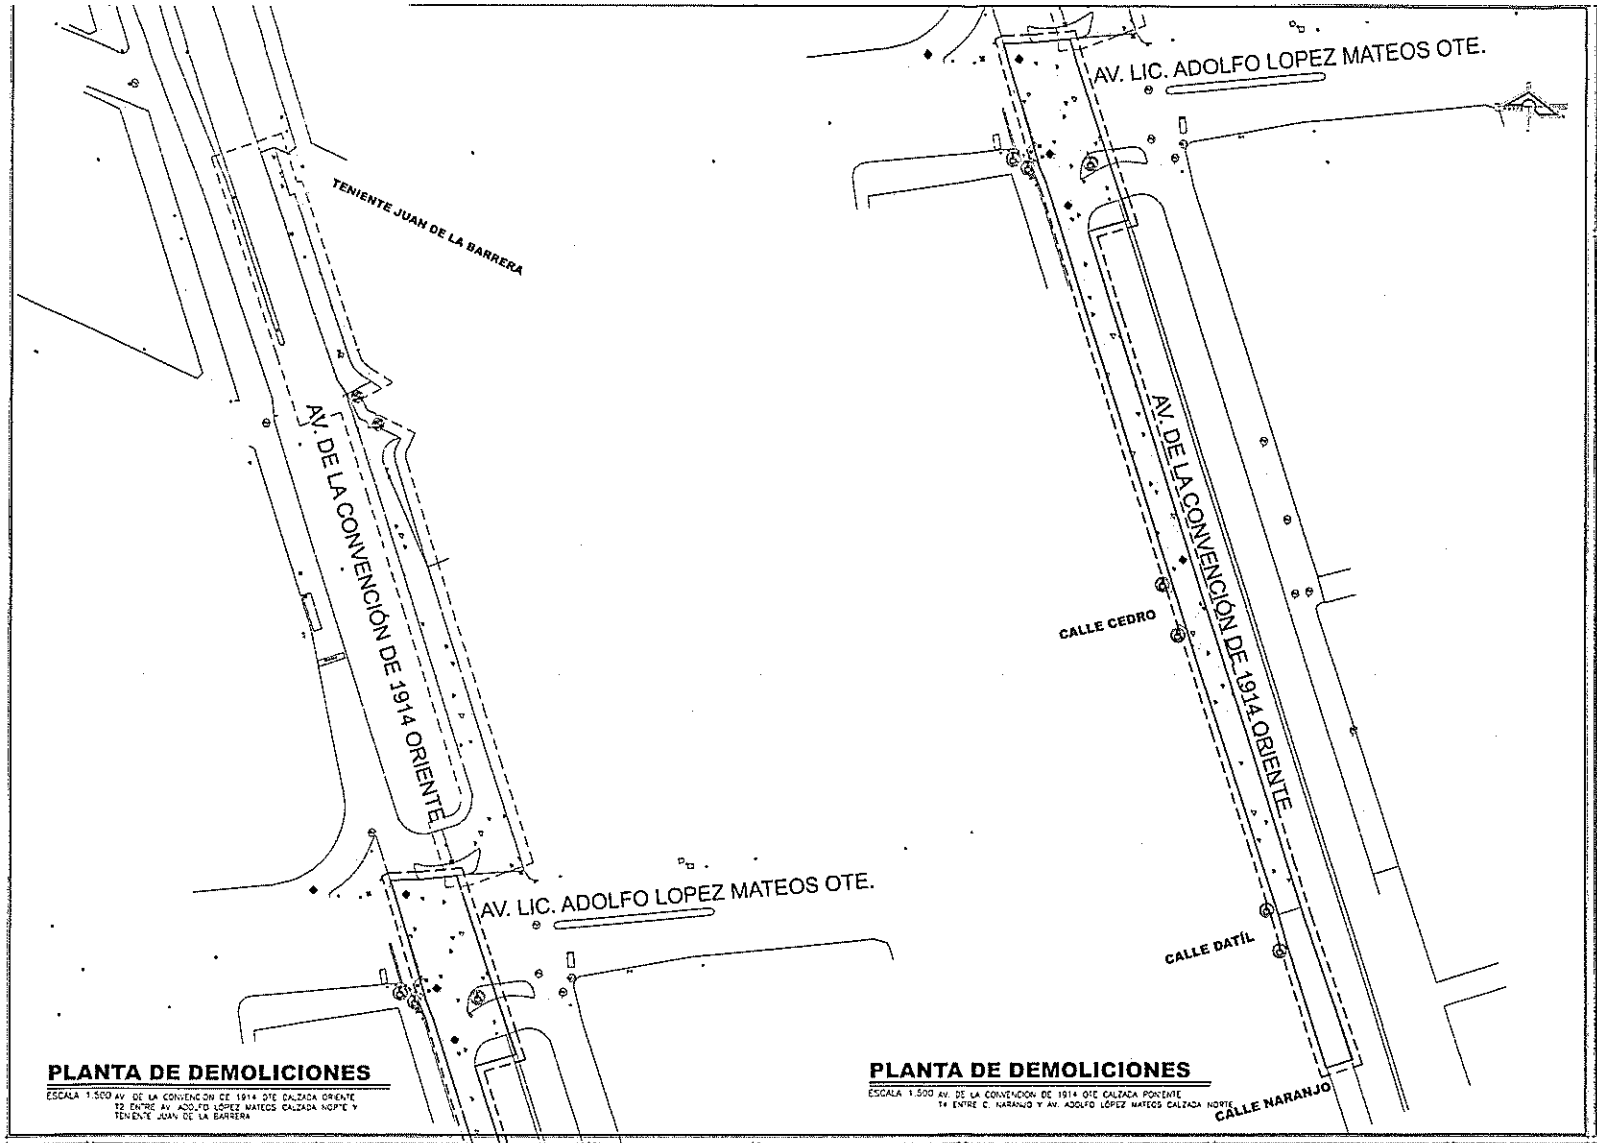


PLANTA DE DEMOLICIONES

ESCALA 1:500 AV. DE LA CONVENCION DE 1914 OTE CALZADA ORIENTE
T2 ENTRE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS CALZADA NORTE Y
TENIENTE JUAN DE LA BARRERA

PLANTA DE DEMOLICIONES

ESCALA 1:500 AV. DE LA CONVENCION DE 1914 OTE CALZADA PONIENTE
T4 ENTRE C. NARANJO Y AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS CALZADA NORTE

LOCALIZACIÓN



SIMBOLOGÍA

FRESADO UNIFORME DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO (3-7 CM DE ESPESOR PROMEDIO), MEDIANTE FRESADORA EN FRIO COMPACTA, EQUIPADA CON BANDA TRANSPORTADORA PARA CARGA DIRECTA SOBRE CAMION DE VOLTEO (SUPERFICIE FRESADA UNIFORME Y SIN PROTUBERANCIAS) QUE CUMPLA CON LA NORMATIVA S C T N-CSV-CAR-3-02-006/20 APLICADAS AL DIA DE HOY, ACARREOS LOCALES, CARGA Y ACARREO A KM. SUBSECUENTES (11 A 15 KM APROX) DE MATERIAL PRODUCTO DEL FRESADO DE CARPETA ASFALTICA, EL TRASLADO SERA A PARQUE DE MAQUINARIA DE LA S O P M A

DEMOLICION CON EQUIPO PESADO DE BANQUETAS Y/O CONCRETO EXITENTE.

NOTA: LA DEMOLICION SE INDICARA EN SITIO.

DEMOLICION DE GUARNICIONES

EJE DE PROYECYO

LIMITE DE PROYECTO

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
Ing. Miguel Ángel Huizar Botello

REV.	FECHA	OBSERVACIONES

V°B° DE LA DEPENDENCIA

RESP. DE PROY. EXTERNO	LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL	
PROYECTO / REVISÓ	AUTORIZÓ


Dirección de Planeación y Proyectos de Obra | Secretaría de Obras Públicas

PROYECTISTA	COORDINADOR
ARQ. ALVARO DAVID MEZA CONTRERAS	ARQ. ALEJANDRO JAIME LEAL
JEFE DE DEP.	DIRECTOR
I.U. OMAR ALEJANDRO LUJÁN GARCÍA	ARQ. ALEJANDRO PONCE RODRÍGUEZ

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE, TRAMO 3 Y EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE, TRAMO 4
UBICACIÓN
TRAMO 3: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE TENIENTE JUAN DE LA BARRERA, COL. HÉROES Y TRAMO 4: DE CALLE NARANJO A AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE, FRACC. JARDINES DE LA CRUZ.
CONTENIDO
PLANTA DE DEMOLICIONES

CLAVE	No. PLANO
DEM 01	04
FECHA NOV 2022	ESCALA INDICADA
ACOTACIÓN METROS	No. EXP. E-000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

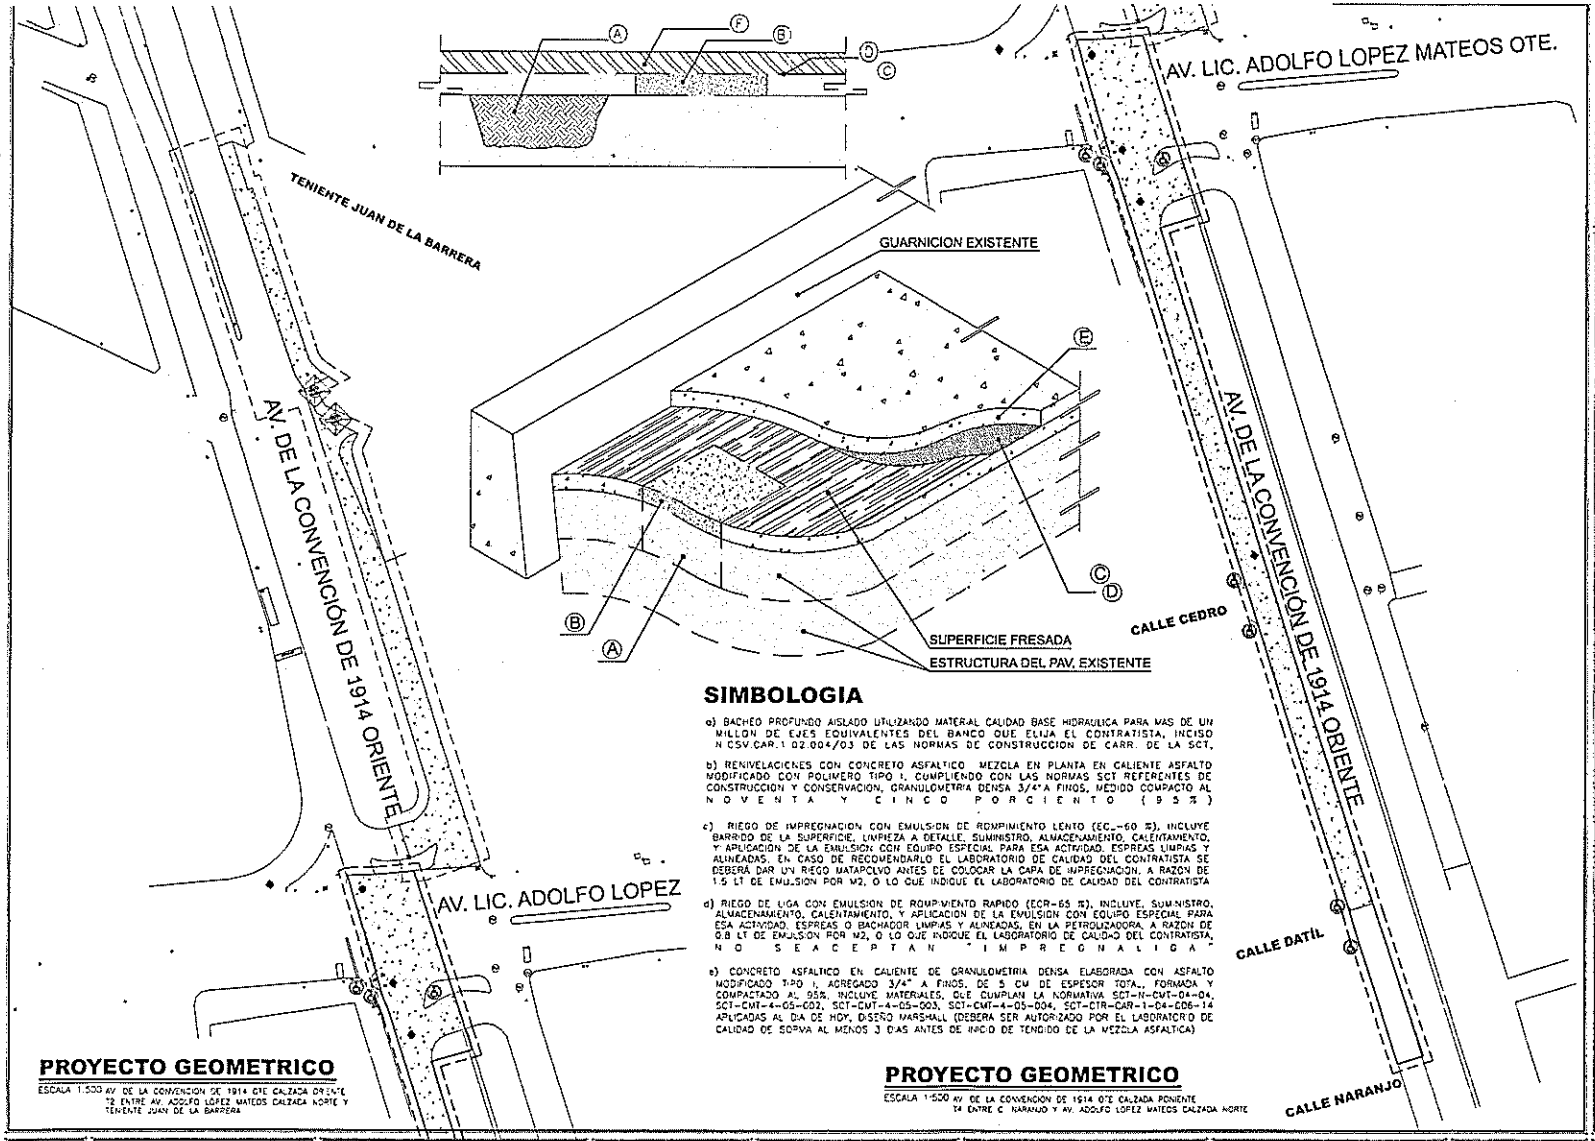

PROYECTO GEOMETRICO

ESCALA 1:500 AV. DE LA CONVENCION DE 1914 OTE CALZADA ORIENTE
T2 ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS CALZADA NORTE Y TENIENTE JUAN DE LA BARRERA

SIMBOLOGIA

a) BACHEO PROFUNDO AISLADO UTILIZANDO MATERIAL CALIDAD BASE HIDRAULICA PARA MAS DE UN MILLON DE EJES EQUIVALENTES DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA, INCISO N CSV.CAR.1.02.004/03 DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARR. DE LA SCT.

b) RENIVELACIONES CON CONCRETO ASFALTICO MEZCLA EN PLANTA EN CALIENTE ASFALTO MODIFICADO CON POLIMERO TIPO I, CUMPLIENDO CON LAS NORMAS SCT REFERENTES DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION, GRANULOMETRIA DENSA 3/4"A FINOS, MEDIDO COMPACTO AL N O V E N T A Y C I N C O P O R C I E N T O (9 5 %)

c) RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION DE ROMPIMIENTO LENTO (ECL-60 %), INCLUYE BARRIDO DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA A DETALLE, SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, Y APLICACION DE LA EMULSION CON EQUIPO ESPECIAL PARA ESA ACTIVIDAD, ESPREAS LIMPIAS Y ALINEADAS, EN CASO DE RECOMENDARLO EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL CONTRATISTA SE DEBERÁ DAR UN RIEGO MATAPOLVO ANTES DE COLOCAR LA CAPA DE IMPREGNACION, A RAZON DE 1.5 LT DE EMULSION POR M2, O LO QUE INDIQUE EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL CONTRATISTA


d) RIEGO DE LIGA CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-65 %), INCLUYE, SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, Y APLICACION DE LA EMULSION CON EQUIPO ESPECIAL PARA ESA ACTIVIDAD, ESPREAS O BACHADOR LIMPIAS Y ALINEADAS, EN LA PETROLIZADORA, A RAZON DE 0.8 LT DE EMULSION POR M2, O LO QUE INDIQUE EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, N O S E A C E P T A N " I M P R E G N A L I G A "

e) CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA ELABORADA CON ASFALTO MODIFICADO TIPO I, AGREGADO 3/4" A FINOS, DE 5 CM DE ESPESOR TOTAL, FORMADA Y COMPACTADO AL 95%. INCLUYE MATERIALES, QUE CUMPLAN LA NORMATIVA SCT-N-CMT-04-04, SCT-CMT-4-05-002, SCT-CMT-4-05-003, SCT-CMT-4-05-004, SCT-CTR-CAR-1-04-006-14 APLICADAS AL DIA DE HOY, DISEÑO MARSHALL (DEBERA SER AUTORIZADO POR EL LABORATORIO DE CALIDAD DE SOPMA AL MENOS 3 DIAS ANTES DE INICIO DE TENDIDO DE LA MEZCLA ASFALTICA)

PROYECTO GEOMETRICO

ESCALA 1:500 AV. DE LA CONVENCION DE 1914 OTE CALZADA PONIENTE
T4 ENTRE C. NARANJO Y AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS CALZADA NORTE

LOCALIZACIÓN:



SIMBOLOGÍA


SIMBOLOGIA

- EJE DE PROYECTO
- DENTELLON PROPUESTO
- CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA ELABORADA CON ASFALTO MODIFICADO TIPO I, AGREGADO 3/4" A FINOS, DE 5 CM DE ESPESOR, FORMADA Y COMPACTADO AL 95%. INCLUYE MATERIALES, QUE CUMPLAN LA NORMATIVA SCT-N-CMT-04-04, SCT-CMT-4-05-002, SCT-CMT-4-05-003, SCT-CMT-4-05-004, SCT-CTR-CAR-1-04-006-14 APLICADAS AL DIA DE HOY, DISEÑO MARSHALL (DEVERA SER AUTORIZADO POR EL LABORATORIO DE CALIDAD DE SOPMA AL MENOS 3 DIAS ANTES DE INICIO DE TENDIDO DE LA MEZCLA ASFALTICA.
- BANQUETA PROPUESTA 10 CM ESPESOR
- PROPUESTA DE GUARNICION, O LO QUE SE INDIQUE EN S I T I O
- APLICAR PINTURA EN RAMPA EXISTENTE
- LOSA DIAMANTE A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO (MR=45) 25 CM. ESPESOR

NOTA 1:

TODOS LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN CONFORME LO ESTABLECIDO EN LAS FICHAS TECNICAS DE EL DEPARTAMENTO DE CALIDAD, DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION.

- FT 200 BANQUETAS
- FT 201 DENTELLON
- FT 204 GUARNICION TRAPEZOIDAL
- FT 209 LOSA DIAMANTE
- FT 216 RAMPA BANQUETA
- FT 303 BASES
- FT 306 PLANTILLA
- FT 309 SUB BASES
- FT 310 SUB RASANTE
- FT 505 SELLADO DE GRIETAS Y JUNTAS EN LOSAS DE CONCRETO



NOTA 2

RESPETAR NIVELES DE PAVIMENTO EXISTENTES, EN SU CASO TOMAR NIVEL DE CORONA DE GUARNICION -15cm COMO REFERENCIA, RENIVELAR TAPAS DE POZOS DE VISITA SEGUN NIVELES EXISTENTES O NUEVOS.

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
Ing. Miguel Ángel Huizar Botello

REV.	FECHA	OBSERVACIONES

Vo. Bo. DE LA DEPENDENCIA

RESP. DE PROY. EXTERNO		LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL		
PROYECTO	REVISO	AUTORIZO

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra — Secretaría de Obras Públicas

PROYECTISTA	COORDINADOR
ARQ. ALVARO DAVID MEJIA CONTRERAS	ARQ. ALEJANDRO JARBE LEAL
JEFE DE DEP.	DIRECTOR
LIC DIANA ALEJANDRO LUJÁN GARCÍA	ARQ. ALEJANDRO PONCE RODRIGUEZ


PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE, TRAMO 3 Y EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE, TRAMO 4.

UBICACIÓN
TRAMO 3 DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE TENIENTE JUAN DE LA BARRERA, COL. HEROES Y TRAMO 4 DE CALLE NARANJO A AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE, FRACC. JARDINES DE LA CRUZ.

CONTENIDO
PROYECTO GEOMETRICO

CLAVE	No. PLANO
GEO 01	05
FECHA NOV 2022	ESCALA INDICADA
ACOTACIÓN METROS	No. EXP E-000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

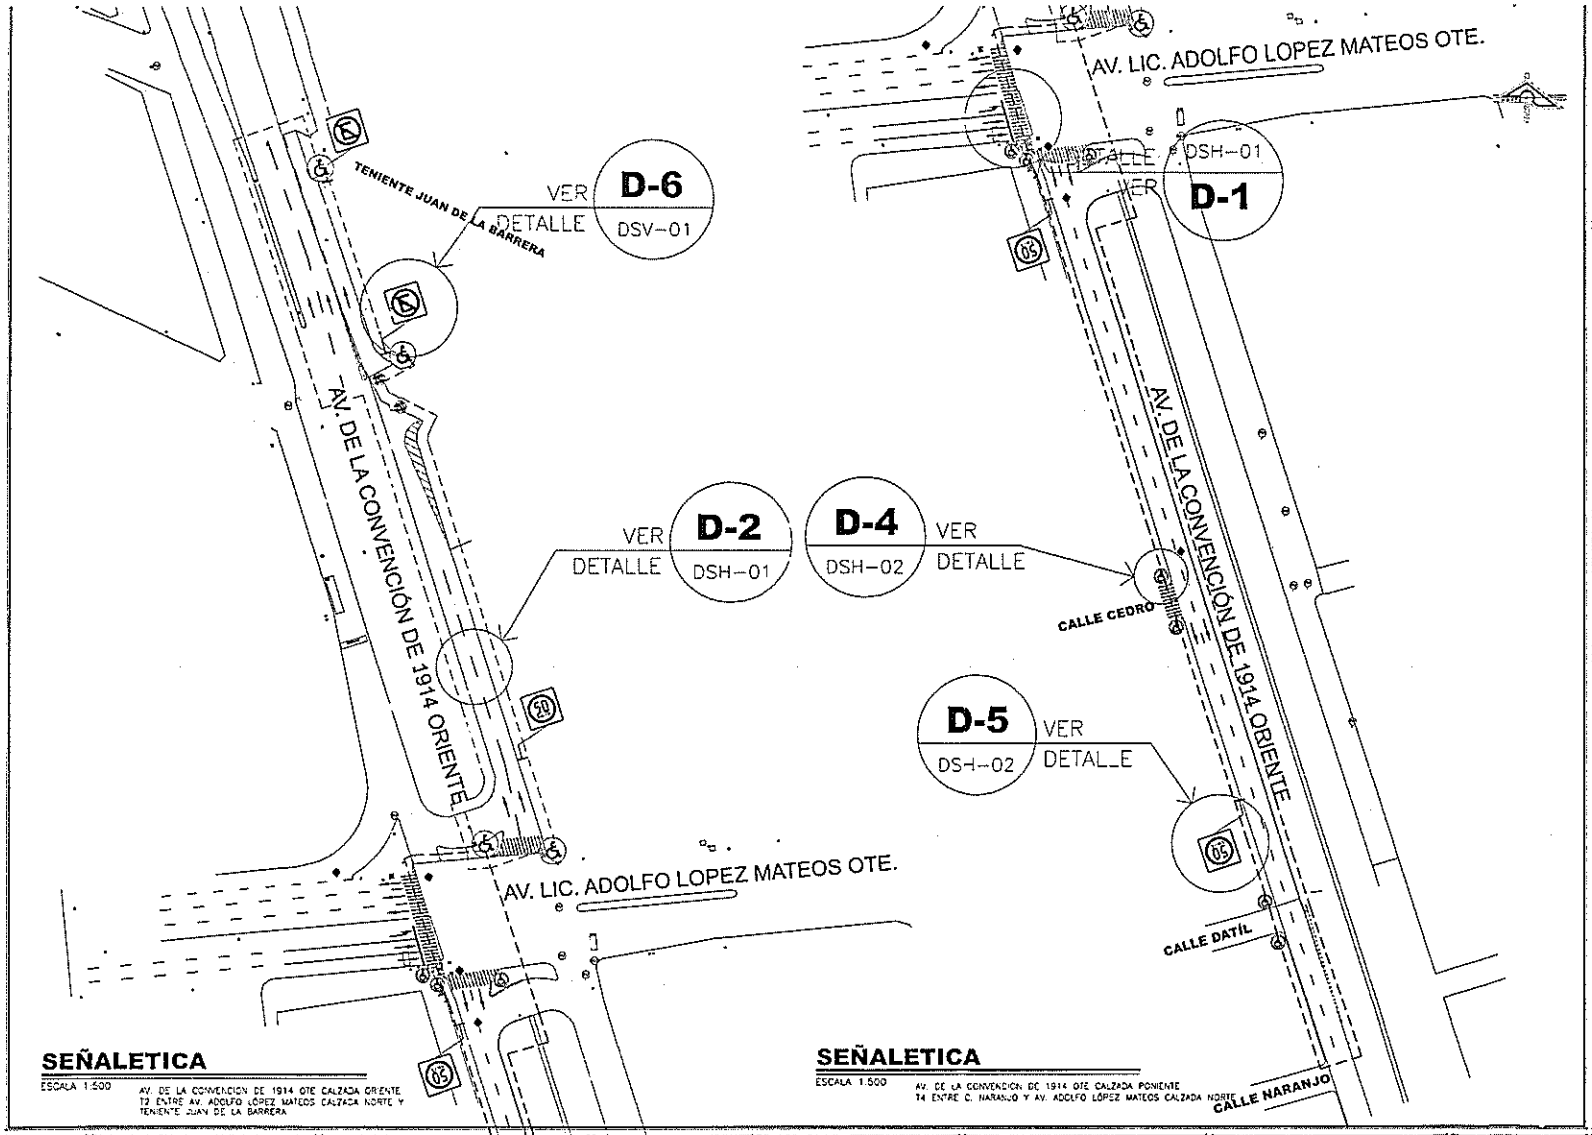

SEÑALETICA

ESCALA 1:500


AV. DE LA CONVENCION DE 1914 OTE CALZADA ORIENTE, T2 ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS CALZADA NORTE Y TENIENTE JUAN DE LA BARRERA

SEÑALETICA

ESCALA 1:500

AV. DE LA CONVENCION DE 1914 OTE CALZADA PONIENTE T4 ENTRE C. NARANJO Y AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS CALZADA NORTE

LOCALIZACIÓN:



SIMBOLOGÍA

NOTA:

Se aplicará en todos los señalamientos horizontales pintura para trafico base solvente tipo alquidal de secado rápido, que cumpla con las especificaciones n-cmt-5-01-001/05, n-pry-car-10-01-002/13 de la SCT aplicadas al día de hoy.

M-12.1, M12.2 APLICADA SOBRE GUARNICIONES Y DENTELLONES DE CUALQUIER COLOR

Se aplicará en todos los señalamientos horizontales pintura para trafico Termoplastica tipo alquidal de secado rápido, que cumpla con las especificaciones n-cmt-5-01-001/05, n-pry-car-10-01-002/13 de la SCT aplicadas al día de hoy.

M - 1.2, LÍNEA DISCONTINUA SENCILLA DE DIVISIÓN DE CARRILES DE FRENTE EN PISO, DE 10 CM DE ANCHO

M - 3.3, CONTINUA IZQUIERDA, PARA VIALIDADES URBANAS DE FRENTE EN PISO, SEPARADA 15 CM. DE LA GUARNICION, COLOR AMARILLO

M - 4, PARA INDICAR LÍNEA GUÍA EN ZONA DE TRANSICIÓN DE FRENTE EN PISO, DESARROLLO DE 2.00 X 0.10 MTS, CON UNA SEPARACIÓN DE 4.00 MTS ENTRE SI PROMEDIO

M - 5, PARA INDICAR ENTRADA Y SALIDA EN BIFURCACIONES

M - 6, PARA INDICAR ALTO EN CRUCEROS, COLOR BLANCO

M - 7.1, PARA INDICAR " CRUCE PEATONAL EN VIAS PRIMARIAS" COLOR AMARILLO

M - 11.1, "FLECHA SENCILLA" PARA INDICAR SENTIDO DE CIRCULACIÓN

M - 11.1, "FLECHA CABEZA DOBLE" PARA INDICAR SENTIDO DE CIRCULACIÓN (VUELTA IZQUIERDA O DERECHA)

Nota2: Dosificación de micro esfera
La cantidad de esferas de vidrio en la película de pintura en húmedo, según su tipo, será la que se indica en la Tabla.

TABLA 8: Cantidad de esferas de vidrio en la película de pintura en humedo.

TIPO DE PINTURA	ESPESOR DE LA PELICULA DE PINTURA EN HÚMEDO MM	CANTIDAD DE ESFERAS kg/m2		TIPO DE GRANULOMETRIA
		INTEGRADAS	SEMBRADAS, MINIMO	
BASE SOLVENTE	0.38 A 0.50	----	0.350	I
BASE AGUA	0.38 A 0.50	----	0.350	I ó II
TERMOPLÁSTICA	1.50 A 0.89	0.38 A 0.89	0.350	II

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
Ing. Miguel Ángel Huizar Botello

REV.	FECHA	OBSERVACIONES

Vo. Bo. DE LA DEPENDENCIA

RESP. DE PROY. EXTERNO		LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL		
PROYECTO	REVISO	AUTORIZO

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra — Secretaría de Obras Públicas

PROYECTISTA	COORDINADOR
ARQ. ALVARO DARIO MEZA CONTRERAS	ARQ. ALEJANDRO JAIME LEAL
JEFE DE DEP.	DIRECTOR
LIC. OMAR ALEJANDRO LUJAN GARCÍA	ARQ. ALEJANDRO PONCE RODRIGUEZ


PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE, TRAMO 2 Y EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE, TRAMO 4

UBICACIÓN
TRAMO 2: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE TENIENTE JUAN DE LA BARRERA, COL. HEROES Y TRAMO 4: DE CALLE NARANJO A AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALZADA NORTE, FRACC. JARDINES DE LA CRUZ.

CONTENIDO
SEÑALETICA.


CLAVE	No. PLANO
SEÑ 01	06
FECHA	ESCALA
NOV 2022	INDICADA
ACOTACIÓN	No. EXP.
METROS	E-000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

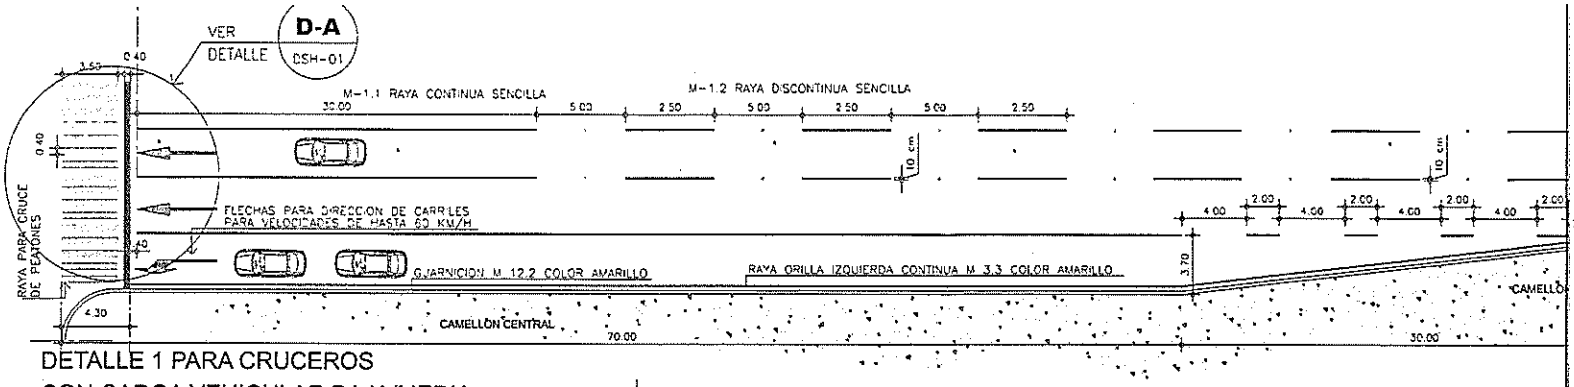

DETALLE 1 PARA CRUCEROS CON CARGA VEHICULAR BAJA/MEDIA

COTAS: cm.

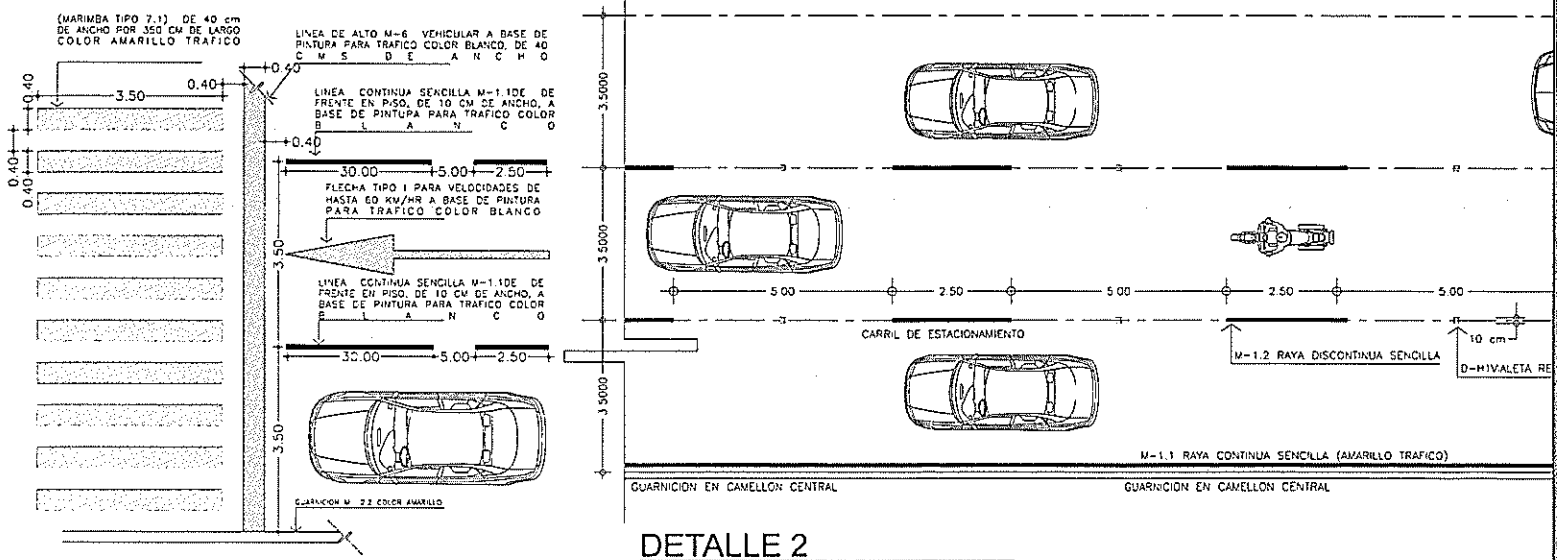


DETALLE A

TRAZO PINTURA EN CRUCEROS SIN ESCALA

DETALLE 2

PARA VELOCIDADES MENOR A 60 KM/HR S/E
LINEA DISCONTINUA DE 2.50 MTS ESPACIO 5 MTS
ESPESOR 10CM



SIMBOLOGIA

NOTA:
Se aplicará en todos los señalamientos horizontales pintura para trafico base solvente tipo alquidal de secado rápido, que cumple con las especificaciones n-cmt-5-01-001/05. n-pry-cor-10-01-002/13 de la SCT aplicados al día de hoy.

M-12.1, M12.2 APLICADA SOBRE GUARNICIONES Y DENTELLONES DE CUALQUIER COLOR

Se aplicará en todos los señalamientos horizontales pintura para trafico Termoplastico tipo alquidal de secado rápida, que cumple con las especificaciones n-cmt-5-01-001/05. n-pry-cor-10-01-002/13 de la SCT aplicados al día de hoy.

M - 1.2, LÍNEA DISCONTINUA SENCILLA DE DIVISIÓN DE CARRILES DE FRENTE EN PISO, DE 10 CM DE ANCHO
M - 3.3, CONTINUA IZQUIERDA, PARA VIALIDADES URBANAS DE FRENTE EN PISO, SEPARADA 15 CM. DE LA GUARNICION, COLOR AMARILLO
M - 4, PARA INDICAR LÍNEA GUÍA EN ZONA DE TRANSICIÓN DE FRENTE EN PISO, DESARROLLO DE 2.00 X 0.10 MTS, CON UNA SEPARACIÓN DE 4.00 MTS ENTRE SI PROMEDIO
M - 5, PARA INDICAR ENTRADA Y SALIDA EN BIFURCACIONES
M - 6, PARA INDICAR ALTO EN CRUCEROS, COLOR BLANCO
M - 7.1, PARA INDICAR " CRUCE PEATONAL EN VIAS PRIMARIAS" COLOR AMARILLO
M - 11.1, "FLECHA SENCILLA" PARA INDICAR SENTIDO DE CIRCULACIÓN
M - 11.1, "FLECHA CABEZA DOBLE" PARA INDICAR SENTIDO DE CIRCULACIÓN (VUELTA IZQUIERDA O DERECHA)

NOTA:
Nota1: Se aplicará en todos los señalamientos horizontales pintura para trafico base solvente tipo alquidal de secado rápido, que cumple con las especificaciones n-cmt-5-01-001/05. n-pry-cor-10-01-002/13 de la SCT aplicados al día de hoy.

Nota2: Dosificación de micro esfera
La cantidad de esferas de vidrio en la película de pintura en húmedo, según su tipo, será la que se indica en la Tabla.


TABLA B: Cantidad de esferas de vidrio en la película de pintura en humedo

TIPO DE PINTURA	ESPESOR DE LA PELICULA DE PINTURA EN HUMEDO MM	CANTIDAD DE ESFERAS kg/m2		TIPO DE GRANULOMETRIA
		INTEGRADAS	SEMBRADAS MINIMO	
BASE SOLVENTE	0.38 A 0.50	---	0.350	I
BASE AGUA	0.38 A 0.50	---	0.350	I o II
TERMOPLASTICA	1.50 A 0.89	0.37 A 0.69	0.350	II

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL M.P.P. Leonardo Montañez Castro SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS Ing. Miguel Ángel Huizar Botello	REV.	FECHA	OBSERVACIONES	V° Bo DE LA DEPENDENCIA	RESP. DE PROY. EXTERNO		LOGO EXTERNO	Dirección de Planeación y Proyectos de Obra / Secretaría de Obras Públicas		PROYECTO CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA EN AV. DE LA CONVENCION DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE, TRAMO 3 Y ENTRONQUE DE LA CONVENCION DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE, TRAMO 4 UBICACION: TRAMO 3: DE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE TENIENTE JUAN DE LA BARRERA, COL. HEROES Y TRAMO 4: DE CALLE NARANJO A AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALZADA NORTE, FRACC. JARDINES DE LA CRUZ CONTENIDO DETALLES SEÑALETICA HORIZONTAL	CLAVE DSH 01	No. PLANO 07
					CED. PROFESIONAL			PROYECTISTA	COORDINADOR		FECHA NOV 2022	ESCALA INDICADA
					PROYECTO	REVISO	AUTORIZÓ	JEFE DE DEP.	DIRECTOR		ACOTACIÓN METROS	No. EXP. E-000-22
								LIC. OMAR ALEJANDRO LUJÁN GARCÍA	ARQ. ALEJANDRO PONCE RODRÍGUEZ			

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

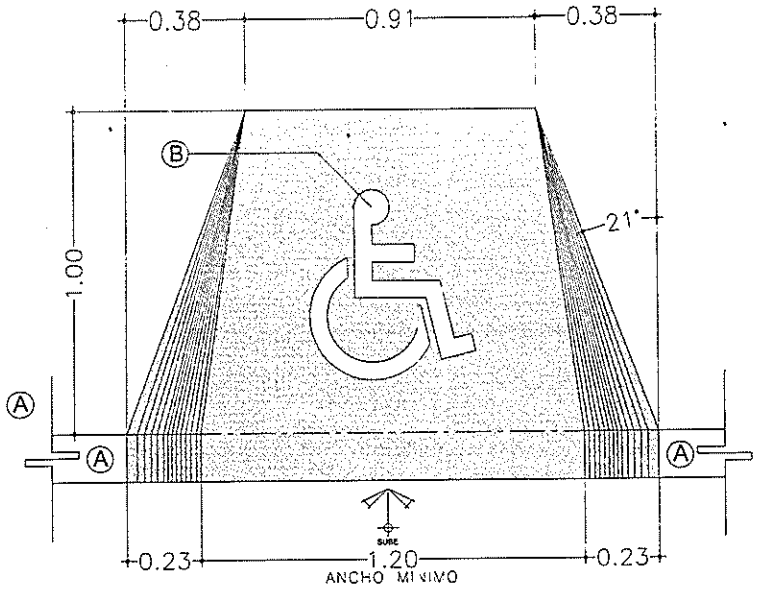


DETALLE 4
DETALLE DE LOGOTIPO "A" EN RAMPA

VISTA EN PLANTA S/E


(A) SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE COLOR AZUL (PANTONE 294) EN RAMPAS PARA DISCAPACITADOS

(B) SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LOGOTIPO "A" (SILLA DE RUEDAS) EN PINTURA BASE SOLVENTE COLOR BLANCO EN RAMPAS PARA DISCAPACITADOS TAMAÑO Y DISEÑO SEGÚN PLANOS.

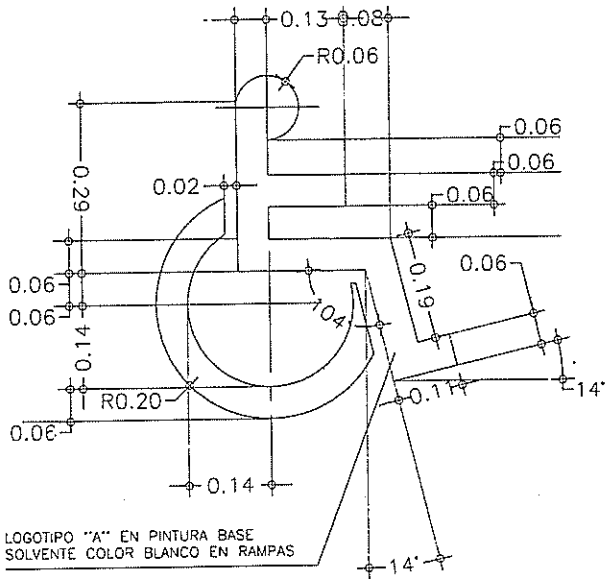

DETALLE DE LOGOTIPO "A" EN RAMPA

VISTA EN PLANTA S/E



SIMBOLOGÍA


NOTA:
Nota1: Se aplicará en todos los señalamientos horizontales pintura para tráfico base solvente tipo alquidal de secado rápido, que cumpla con las especificaciones n-cmt-5-01-04-11/05, n-pry-car-10-01-002/13 de la SCT aplicadas al día de hoy.

Nota2: Dosificación de micro esfera
La cantidad de esferas de vidrio en la película de pintura en húmedo, según su tipo, será la que se indica en la Tabla.

TABLA 8. Cantidad de esferas de vidrio en la película de pintura en humedo.

TIPO DE PINTURA	ESPESOR DE LA PELÍCULA DE PINTURA EN HÚMEDO (MM)	CANTIDAD DE ESFERAS kg/m2		TIPO DE GRANULOMETRIA
		INTEGRADAS	SEMBRADAS MINIMO	
BASE SOLVENTE	0.38 A 0.50	---	0.330	I
BASE AGUA	0.38 A 0.50	---	0.330	I&II
TERMOPLASTICA	1.50 A 0.65	0.87 A 0.69	0.330	II


La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.




DETALLE 5
RAYAS CANALIZADORAS
ZONA NEUTRAL

ESCALA 1:50 COTAS EN m


PRESIDENTE MUNICIPAL M.P.P. Leonardo Montañez Castro SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Ing. Miguel Ángel Huizar Botello	REV.	FECHA	OBSERVACIONES	Vo. Bo. DE LA DEPENDENCIA	RESP. DE PROY. EXTERNO CED. PROFESIONAL PROYECTO / REVISO / AUTORIZO	LOGO EXTERNO	Dirección de Planeación y Proyectos de Obra / Secretaría de Obras Públicas PROYECTISTA: ARQ. AURO DAVID MEZA CONTRERAS — COORDINADOR: ARQ. ALEJANDRO JAIME LEAL JEFE DE DEP.: LIC. OMAR ALEJANDRO LUJÁN GARCÍA — DIRECTOR: ARQ. ALEJANDRO PONCE RODRIGUEZ	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE, TRAMO 3 Y EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE, TRAMO 4. UBICACIÓN: TRAMO 3: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE TENIENTE JUAN DE LA BARRERA, COL. HÉROES Y TRAMO 4: DE CALLE HARALDO A AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE, FRACC. JARDINES DE LA CRUZ. CONTENIDO: DETALLES SEÑALETICA HORIZONTAL	CLAVE: DSH 02 / No. PLANO: 08 FECHA: NOV 2022 / ESCALA: INDICADA ACOTACIÓN: METROS / No. EXP.: E-000-22	Aguascalientes LA CIUDAD DE TU VIDA

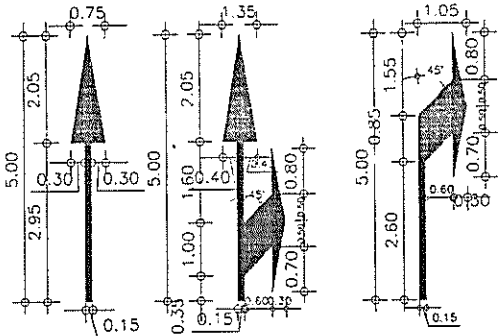

DETALLE DE FLECHAS EN PAVIMENTO
PARA VELOCIDADES HASTA DE 60KM/H
COTAS EN M

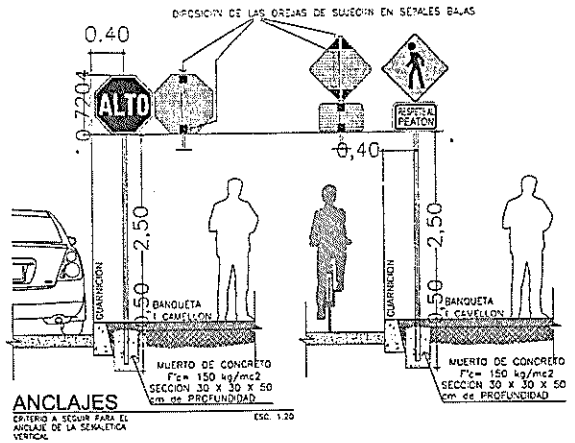


ANCLAJES
CRITERIO A SEGUIR PARA EL ANCLAJE DE LA SEÑALETICA VERTICAL
ESC. 1:20




SEÑALES RESTRICTIVAS						
SIMBOLO	CLAVE	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (cm)	UNIDAD	COLOR	CANTIDAD
	SR-9	VELOCIDAD 50 KM/H	71 X 71	PZA	BLANCO REFLEJANTE CON ANILLO ROJO REFLEJANTE	4
	SR-22	PROHIBIDO ESTACIONARSE	71 X 71	PZA	BLANCO REFLEJANTE CON ANILLO ROJO REFLEJANTE	2

EN CORTE

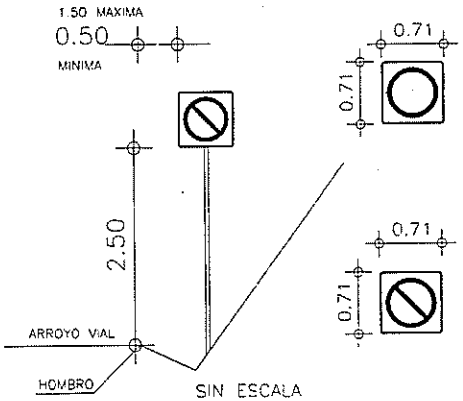


SIN ESCALA


EN TERRAPLEN

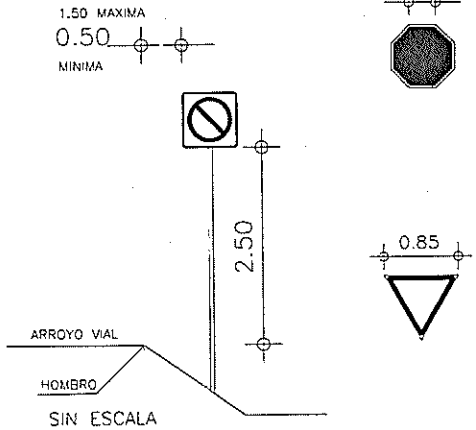

SIN ESCALA



ZONA URBANA

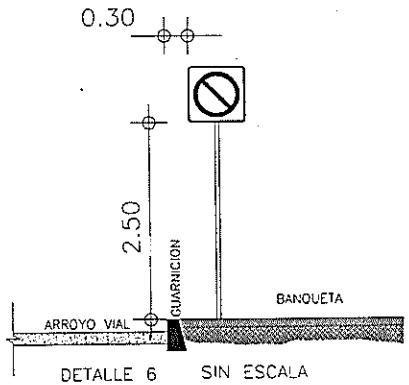

DETALLE 6 SIN ESCALA

NOTA: LAS SECCIONES ESTRUCTURALES SE ENCUENTRAN EL APARTADO II.7.3. ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES BAJAS. DEL MANUAL DE SEÑALAMIENTO VIAL DE LA SCT

SIMBOLOGIA

NOTA:
Se aplicará en todos los señalamientos horizontales pintura para trafico base solvente tipo alquidal de secado rápido, que cumple con las especificaciones n-cmt-5-01-001/05, n-pry-car-10-01-002/13 de la SCT aplicadas al día de hoy.

M-12.1, M12.2 APLICADA SOBRE GUARNICIONES Y DENTELLONES DE CUALQUIER COLOR

Se aplicará en todos los señalamientos horizontales pintura para trafico Termoplastico tipo alquidal de secado rápido, que cumple con las especificaciones n-cmt-5-01-001/05 n-pry-car-10-01-002/13 de la SCT aplicadas al día de hoy.

M - 1.2, LÍNEA DISCONTINUA SENCILLA DE DIVISIÓN DE CARRILES DE FRENTE EN PISO, DE 10 CM DE ANCHO
M - 3.3, CONTINUA IZQUIERDA, PARA VIALIDADES URBANAS DE FRENTE EN PISO, SEPARADA 15 CM. DE LA GUARNICION, COLOR AMARILLO
M - 4, PARA INDICAR LÍNEA GUÍA EN ZONA DE TRANSICIÓN DE FRENTE EN PISO, DESARROLLO DE 2.00 X 0.10 MTS. CON UNA SEPARACIÓN DE 4.00 MTS ENTRE SI PROMEDIO
M - 5, PARA INDICAR ENTRADA Y SALIDA EN BIFURCACIONES
M - 6, PARA INDICAR ALTO EN CRUCEROS, COLOR BLANCO
M - 7.1, PARA INDICAR " CRUCE PEATONAL EN VIAS PRIMARIAS" COLOR AMARILLO
M - 11.1, "FLECHA SENCILLA" PARA INDICAR SENTIDO DE CIRCULACIÓN
M - 11.1, "FLECHA CABEZA DOBLE" PARA INDICAR SENTIDO DE CIRCULACIÓN (VUELTA IZQUIERDA O DERECHA)

NOTA.
Nota1. Se aplicará en todos los señalamientos horizontales pintura para trafico base solvente tipo alquidal de secado rápido, que cumple con las especificaciones n-cmt-5-01-001/05, n-pry-car-10-01-002/13 de la SCT aplicadas al día de hoy.

Nota2: Dosificación de micro esfera
La cantidad de esferas de vidrio en la película de pintura en húmedo, según su tipo, será la que se indica en la Tabla.

TABLA 8. Cantidad de esferas de vidrio en la película de pintura en humedo.

TIPO DE PINTURA	ESPESOR DE LA PELICULA DE PINTURA EN HUMEDO mm	CANTIDAD DE ESFERAS kg/m2		TIPO DE GRANULOMETRIA
		INTEGRADAS	SEMBRADAS MINIMO	
BASE SOLVENTE	0.38 A 0.50	----	0.350	I
BASE AGUA	0.38 A 0.50	----	0.350	IAB
TERMOPLASTICA	1.50 A 0.89	0.37 A 0.89	0.330	II

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
Ing. Miguel Ángel Huizar Botello

REV	FECHA	OBSERVACIONES

RESP. DE PROY. EXTERNO		LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL		
PROYECTÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra — Secretaría de Obras Públicas


PROYECTISTA	COORDINADOR
ARQ. ALVARO DAVID MEJIA CONTRERAS	ARQ. ALEJANDRO JAIME LEAL
JEFE DE DEP.	DIRECTOR
LIC. OMAR ALEJANDRO LUJÁN GARCÍA	ARQ. ALEJANDRO PONCE RODRIGUEZ

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE, TRAMO 2 Y EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE, TRAMO 4.
UBICACIÓN
TRAMO 2: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE TENIENTE JUAN DE LA BARRERA, COL. HÉROES Y TRAMO 4: DE CALLE NARANJO A AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE, FRACC. JARDINES DE LA CRUZ.
CONTENIDO
DETALLES SEÑALETICA VERTICAL

CLAVE	No. PLANO
DSV 01	09
FECHA NOV 2022	ESCALA INDICADA
ACOTACIÓN METROS	No. EXP. E-000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


DENTELLON TRAPEZOIDAL DE 15-20X40 CM DE SECCION, CON CONCRETO PREMEZCLADO MR=38 KGF/CM2, TMA 1 1/2", F'R 14 DAS, REVENIMIENTO NORMAL DE 10+-2 CM, GRAVA TRITURADA, ACABADO CON DOBLADOR Y PULIDO INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, JUNTA A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CELDAS CERRADAS DE 1/2" EN JUNTAS FRIAS LONGITUDINALES NO MAYOR A 30 MTS, CORTE TRANSVERSAL CON CORTADORA A 1/3 DE SU ESPESOR MAXIMO @ 3 MTS, RELLENO PREFORMADO Y SELLADOR AUTONIVELANTE ASI COMO DE ASILAMIENTO CON OTRO ELEMENTO, Y CURADO CON MEMBRANA QUIMICA APLICADA CON ASPERSOR Y LIMPIEZA, SE DEBERA TENER CURADO EN EL NIVEL DE DESPLANTE PUES NO SE ACEPTAN SILENOS FUERA DE LA BASE NUEVA. TRABAJO TERMINADO

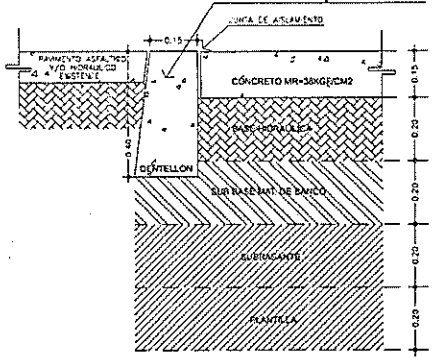

ESTRUCTURA 1-A

MR=45 KGF/CM2 1:10


CONSTRUCCION DE GUARNICION RECTA Y/O CURVA TRAPEZOIDAL DE 15X20X40 CM DE SECCION CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 150 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, T.M.A. 1 1/2" 38 MM, GRAVA TRITURADA, ACABADO PULIDO EN PARTE DE SUPERIOR Y DOBLADOR EN ARISTAS SUPERIORES, INCLUYE: COMPACTADO DE PLANTILLA, CIMBRADO, COLADO, ACABADO, DESCIMBRADO, ALINEADO, NIVELADO, DESCIMBRADO Y CURADO EN SU PARTE SUPERIOR CON MEMBRANA BASE AGUA A RAZON DE 1 LT/M2

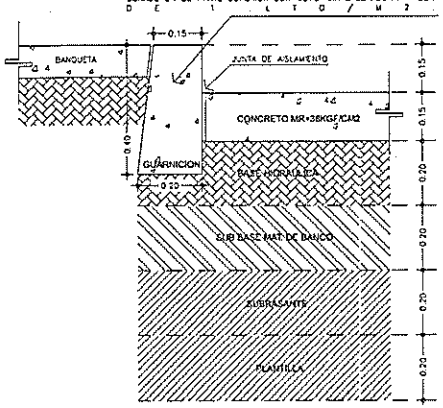

ESTRUCTURA 1

MR=45 KGF/CM2 S/E

CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", R.N. GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTI DE 10+-2 CM, ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2" SECCION DE LOSAS COMO INDIQUE PROYECTO, INCLUYE: JUNTA A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CELDAS CERRADAS DE 1/2" EN JUNTAS FRIAS LONGITUDINALES CON MUROS Y TRANSVERSALES DEL ELEMENTO, ASI COMO SU UNION CON ELEMENTOS VIEJOS O CAMBIO DE ELEMENTO, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CORTES CON CORTADORA DE DISCO, SELLADO DE CORTES CON SELLADOR AUTONIVELANTE Y TIRA DE RELLENO PREFORMADA NO ADHERENTE DE 1/8" (EN TODAS LAS JUNTAS DE CONTRACCION Y CONSTRUCCION TRANSVERSALES), CURADO CON MEMBRANA QUIMICA APLICADA CON ASPERSOR, TRABAJO TERMINADO.

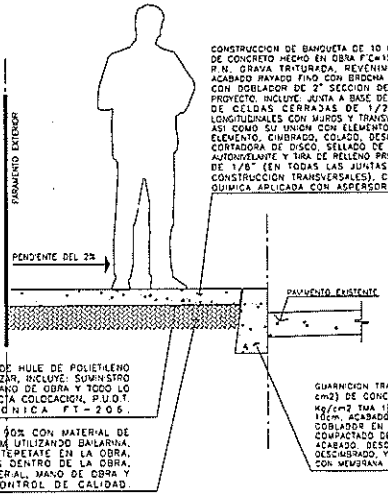

SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE DE POLIETILENO CAL. 600 PARA IMPERMEABILIZAR, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL A LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, P.U.O.T. SEGUN FICHA TECNICA FT-206.

RELLENO COMPACTADO AL 90% CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM UTILIZANDO BAILARINA, INCLUYE: SUMINISTRO DE TEPETATE EN LA OBRA, ABUNDAMIENTO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CIMBRADO, RETIRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO, PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD.


GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15x20x40cm (700 cm2) DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=150 kg/cm2 TMA 1" 76mm, REVENIMIENTO DE 8 A 10cm, ACABADO PULIDO EN PARTE SUPERIOR Y DOBLADOR EN ARISTAS SUPERIORES, INCLUYE: COMPACTADO DE PLANTILLA, CIMBRADO, COLADO, ACABADO, DESCIMBRADO, ALINEADO, NIVELADO, DESCIMBRADO, Y CURADO EN SU PARTE SUPERIOR CON MEMBRANA BASE AGUA A RAZON DE 1 LT/M2

BANQUETA T-1

VISTA EN CORTE ESC: 1:15


CONSTRUCCION DE GUARNICION RECTA Y/O CURVA TRAPEZOIDAL DE 15X20X40 CM DE SECCION CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 150 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, T.M.A. 1 1/2" 38 MM, GRAVA TRITURADA, ACABADO PULIDO EN PARTE DE SUPERIOR Y DOBLADOR EN ARISTAS SUPERIORES, INCLUYE: COMPACTADO DE PLANTILLA, CIMBRADO, COLADO, ACABADO, DESCIMBRADO, ALINEADO, NIVELADO, DESCIMBRADO Y CURADO EN SU PARTE SUPERIOR CON MEMBRANA BASE AGUA A RAZON DE 1 LT/M2

CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", R.N. GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTI DE 10+-2 CM, ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2" SECCION DE LOSAS COMO INDIQUE PROYECTO, INCLUYE: JUNTA A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CELDAS CERRADAS DE 1/2" EN JUNTAS FRIAS LONGITUDINALES CON MUROS Y TRANSVERSALES DEL ELEMENTO, ASI COMO SU UNION CON ELEMENTOS VIEJOS O CAMBIO DE ELEMENTO, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CORTES CON CORTADORA DE DISCO, SELLADO DE CORTES CON SELLADOR AUTONIVELANTE Y TIRA DE RELLENO PREFORMADA NO ADHERENTE DE 1/8" (EN TODAS LAS JUNTAS DE CONTRACCION Y CONSTRUCCION TRANSVERSALES), CURADO CON MEMBRANA QUIMICA APLICADA CON ASPERSOR, TRABAJO TERMINADO.

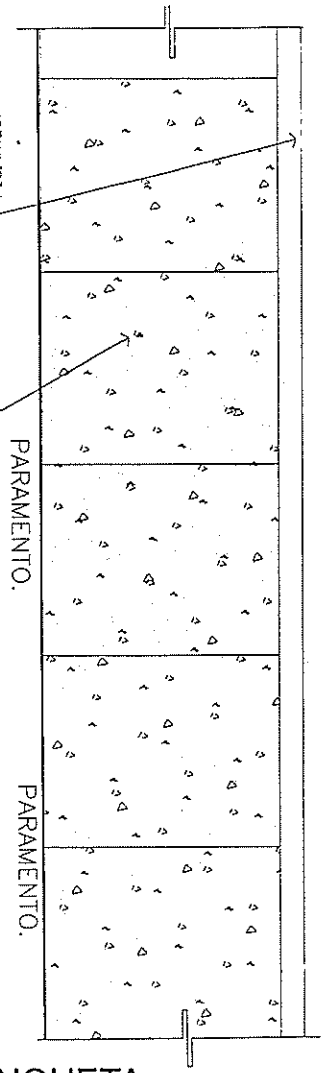

BANQUETA

VISTA EN PLANTA ESC: 1:15



SIMBOLOGIA



NOTA 1

TODOS LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN CONFORME LO ESTABLECIDO EN LAS FICHAS TECNICAS DE EL DEPARTAMENTO DE CALIDAD, DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION.

- FT 220 BANQUETAS
- FT 201 DENTELLON
- FT 204 GUARNICION TRAPEZOICAL
- FT 209 LOSA DIAMANTE
- FT 216 RAMPA BANQUETA
- FT 303 BASES
- FT 305 PLANTILLA
- FT 309 SUB BASES
- FT 315 SUB RASANTE
- FT 505 SELLADO DE GRIETAS Y JUNTAS EN LOSAS DE CONCRETO

NOTA 2

RESPETAR NIVELES DE PAVIMENTO EXISTENTES, EN SU CASO TOMAR NIVEL DE CERCHA DE GUARNICION +15cm COMO REFERENCIA, REANIVELAR TAPAS DE POZOS DE VISITA SEGUN NIVELES EXISTENTES O NUEVOS.

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
Ing. Miguel Ángel Huizar Botello

REV	FECHA	OBSERVACIONES

Vo. Bo. DE LA DEPENDENCIA

RESP. DE PROY. EXTERNO		LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL		
PROYECTO	REVISO	AUTORIZO

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra — Secretaría de Obras Públicas

PROYECTISTA	COORDINADOR
ARQ. ALVARO DAVID VEGA CONTRERAS	ARQ. ALEJANDRO JAIME LEAL
JEFE DE DEP.	DIRECTOR
L.E.D. CESAR ALEJANDRO LUGAN GARCIA	ARQ. ALEJANDRO PONCE RODRIGUEZ

PROYECTO
CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA EN AV. DE LA CONVENCION DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE, TRAMO 3 Y EN AV. DE LA CONVENCION DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE, TRAMO 4.

UBICACION
TRAMO 3: DE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE TENIENTE JUAN DE LA BARRERA, COL. HÉROES Y TRAMO 4: DE CALLE NARANJO AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALZADA NORTE, FRACC. JARDINES DE LA CRUZ.

CONTENIDO
PLANO DE DETALLES BANQUETA


CLAVE	No. PLANO
DETC 01	10
FECHA	ESCALA
NOV 2022	INDICADA
ACOTACIÓN	No. EXP.
METROS	E-000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

PISO EN RAMPAS DE 10.00 cm DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 Kg/cm2, HECHO EN OBRA, TMA 3/4 19mm, GRAVA TRITURADA, ACABADO LAVADERO, INCLUYE: ESTAMPADO DE SIMBOLOGIA COMO INDICA EL PROYECTO, CIMBRADO, NIVELADO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA

RAMPA PEATONAL TIPO 1


VISTA EN PLANTA ESC. 1:10

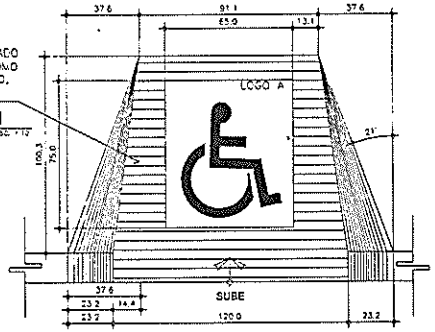

PISO EN RAMPAS DE 10.00 cm DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 Kg/cm2, HECHO EN OBRA, TMA 3/4 19mm, GRAVA TRITURADA, ACABADO LAVADERO, INCLUYE: ESTAMPADO DE SIMBOLOGIA COMO INDICA EL PROYECTO, CIMBRADO, NIVELADO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA


RAMPA PEATONAL TIPO 1

VISTA FRONTAL



CONSTRUCCION DE GUARNICION RECTA Y/O CURVA TRAPEZOIDAL DE 15X20X40 CM DE SECCION CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 150 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, T.M.A. 1 1/2" 38 MM, GRAVA TRITURADA, ACABADO PULIDO EN PARTE DE SUPERIOR Y DOBLADOR EN ARISTAS SUPERIORES, INCLUYE: COMPACTADO DE PLANTILLA, CIMBRADO, COLADO, ACABADO, DESCIMBRADO, ALINEADO, NIVELADO, DESCIMBRADO Y CURADO EN SU PARTE SUPERIOR CON MEMBRANA BASE AGUA A RAZON DE 1 LTO/M2.

DENTELLON TRAPEZOIDAL DE 15-20X40 CM DE SECCION, CON CONCRETO PREMEZCLADO MR=38 KGF/CM2, TMA 1 1/2", R.R 14 DIAS. REVENIMIENTO NORMAL DE 10+-2 CM, GRAVA TRITURADA, ACABADO CON DOBLADOR Y PULIDO. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, JUNTA A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CELDAS CERRADAS DE 1/2" EN JUNTAS FRIAS LONGITUDINALES NO MAYOR A 30 MTS CORTE TRANSVERSAL CON CORTADORA A 1/3 DE SU ESPESOR MÁXIMO @ 3 MTS. RELLENO PREFORMADO Y SELLADOR AUTONIVELANTE ASI COMO DE AISLAMIENTO CON OTRO ELEMENTO, Y CURADO CON MEMBRANA QUIMICA APLICADA CON ASPERSOR Y LIMPIEZA. SE DEBERA TENER CUIDADO EN EL NIVEL DE DESPLANTE PUES NO SE ACEPTAN ELLENOS FUERA DE LA BASE NUEVA, TRABAJO T E R M I N A D O

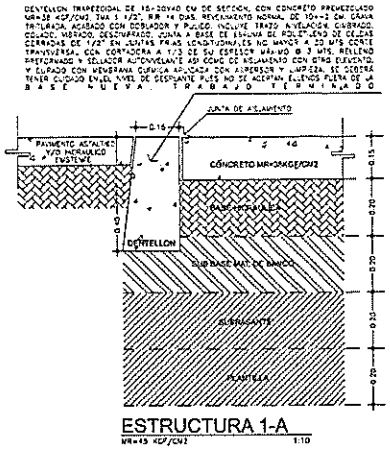

ESTRUCTURA 1-A


MR=45 KGF/CM2 1:10

CONSTRUCCION DE GUARNICION RECTA Y/O CURVA TRAPEZOIDAL DE 15X20X40 CM DE SECCION CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 150 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, T.M.A. 1 1/2" 38 MM, GRAVA TRITURADA, ACABADO PULIDO EN PARTE DE SUPERIOR Y DOBLADOR EN ARISTAS SUPERIORES, INCLUYE: COMPACTADO DE PLANTILLA, CIMBRADO, COLADO, ACABADO, DESCIMBRADO, ALINEADO, NIVELADO, DESCIMBRADO Y CURADO EN SU PARTE SUPERIOR CON MEMBRANA BASE AGUA A RAZON DE 1 LTO/M2.

PISO EN RAMPAS DE 10.00 cm DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 Kg/cm2, HECHO EN OBRA, TMA 3/4 19mm, GRAVA TRITURADA, ACABADO LAVADERO, INCLUYE: ESTAMPADO DE SIMBOLOGIA COMO INDICA EL PROYECTO, CIMBRADO, NIVELADO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA

RAMPA PEATONAL TIPO 1

VISTA LATERAL ESC. 1:10




MEMBRANA IMPERMEABLE A BASE DE POLIETILENO N E G R O N o 6 0 C .

RELLENO COMPACTADO AL 90% CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM UTILIZANDO BAILARINA, INCLUYE: SUMINISTRO DE TEPETATE EN LA OBRA, ABUNDAMIENTO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CRIBADO, RETIRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO, PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD.


CONSTRUCCION DE GUARNICION RECTA Y/O CURVA TRAPEZOIDAL DE 15X20X40 CM DE SECCION CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 150 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, T.M.A. 1 1/2" 38 MM, GRAVA TRITURADA, ACABADO PULIDO EN PARTE DE SUPERIOR Y DOBLADOR EN ARISTAS SUPERIORES, INCLUYE: COMPACTADO DE PLANTILLA, CIMBRADO, COLADO, ACABADO, DESCIMBRADO, ALINEADO, NIVELADO, DESCIMBRADO Y CURADO EN SU PARTE SUPERIOR CON MEMBRANA BASE AGUA A RAZON DE 1 LTO/M2.

DENTELLON TRAPEZOIDAL DE 15-20X40 CM DE SECCIÓN, CON CONCRETO PREMEZCLADO MR=38 KGF/CM2, TMA 1 1/2", R.R 14 DIAS. REVENIMIENTO NORMAL DE 10+-2 CM, GRAVA TRITURADA, ACABADO CON DOBLADOR Y PULIDO. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, JUNTA A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CELDAS CERRADAS DE 1/2" EN JUNTAS FRIAS LONGITUDINALES NO MAYOR A 30 MTS CORTE TRANSVERSAL CON CORTADORA A 1/3 DE SU ESPESOR MÁXIMO @ 3 MTS. RELLENO PREFORMADO Y SELLADOR AUTONIVELANTE ASI COMO DE AISLAMIENTO CON OTRO ELEMENTO, Y CURADO CON MEMBRANA QUIMICA APLICADA CON ASPERSOR Y LIMPIEZA. SE DEBERA TENER CUIDADO EN EL NIVEL DE DESPLANTE PUES NO SE ACEPTAN ELLENOS FUERA DE LA BASE NUEVA, TRABAJO T E R M I N A D O

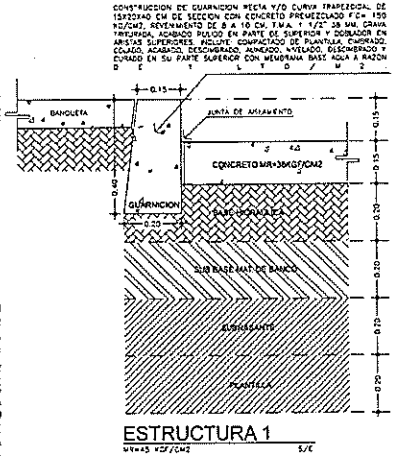

ESTRUCTURA 1

MR=45 KGF/CM2 S/E



SIMBOLOGÍA

NOTA 1:

TODOS LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN CONFORME LO ESTABLECIDO EN LAS FICHAS TECNICAS DE EL DEPARTAMENTO DE CAUSAS, DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION.

-FT 202 BANQUETAS
-FT 203 DENTELLON
-FT 204 GUARNICION TRAPEZOIDAL
-FT 209 LOSA DIAMANTE
-FT 216 RAMPA BANQUETA
-FT 305 BASES
-FT 306 PLANTILLA
-FT 309 SUB BASES
-FT 310 SUB RASANTE
-FT 505 SELLADO DE GRIETAS Y JUNTAS EN LOSAS DE CONCRETO

NOTA 2

RESPETAR NIVELES DE PAVIMENTO EXISTENTES, EN SU CASO TOMAR NIVEL DE CORONA DE GUARNICION -15cm COMO REFERENCIA. REINSTALAR TAPAS DE POZOS DE VISITA SEGUN NIVELES EXISTENTES O NUEVOS.

La Dirección de Planeación y Proyectos sólo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.


PRESIDENTE MUNICIPAL M.P.P. Leonardo Montañez Castro SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS Ing. Miguel Ángel Huizar Botello	REV. FECHA / OBSERVACIONES	Vo. Bo. DE LA DEPENDENCIA	RESP. DE PROY. EXTERNO / CED. PROFESIONAL / PROYECTO / REVISO / AUTORIZÓ / LOGO EXTERNO

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra / Secretaría de Obras Públicas		
PROYECTISTA	COORDINADOR	
ARQ. ALVARO DAVID MEZA CONTRERAS	ARQ. ALEJANDRO JAIME LEAL	
JEFE DE DEP.	DIRECTOR	
LIC. DIANA ALEJANDRA LLAMAS GARCÍA	ARQ. ALEJANDRO PONCE RODRÍGUEZ	


PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE, TRAMO 3 Y EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE, TRAMO 4.	CLAVE DETC 02	No. PLANO 11	
UBICACIÓN TRAMO 2: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE TENIENTE JUAN DE LA BARRERA, COL. HÉROES Y TRAMO 4: DE CALLE NARANJO A AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE, FRACC. JARDINES DE LA CRUZ.	FECHA NOV 2022	ESCALA INDICADA	
CONTENIDO PLANO DE DETALLES RAMPA	ACOTACIÓN METROS	No. EXP. E-000-22	


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

PLANTA POZO "A"




PLANTA POZO "B"

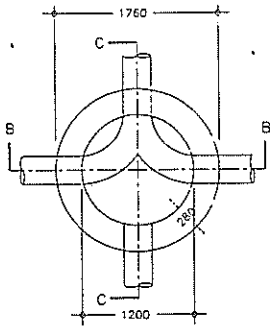


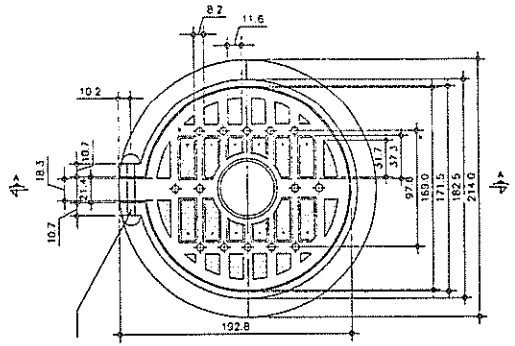


REMACHE DE CABEZA REDONDA DE (3/4") CON LARGO DE 0.2095 (7 1/4") UN AGARRE DE 0.00156MM

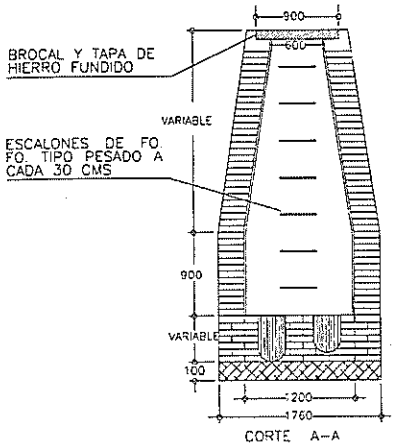

CORTE A–A



CORTE B–B



CORTE C–C


NOTA:
APLANADO INTERIOR LISO Y EXTENDIDO A BASE DE MORTERO CEMENTO–ARENA PROP. 1:3 CON IMPERMEABILIZANTE INTERGAL (2KG FOR CADA SACON DE 50KG DE CEMENTO

POZO DE VISITA COMUN


SIN ESCALA

DETALLE DE BROCAL Y TAPA

PLANTA SIN ESCALA




CORTE (A)
TAPA DE POZO DE VISITARO-01

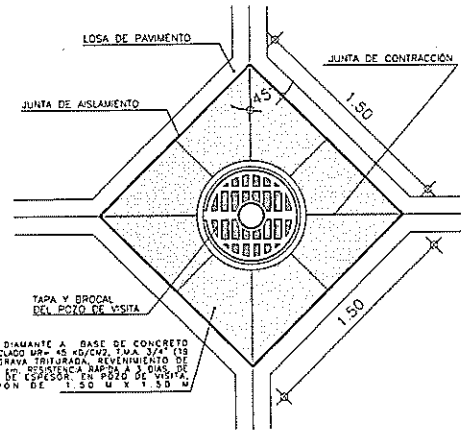

DETALLE LOSA DIAMANTE

PLANTA VER FICHA TECNICA FT–209 SIN ESCALA
DEL LABORATORIO DE CALIDAD DE LA SOPMA



SIMBOLOGIA



La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
Ing. Miguel Ángel Huizar Botello

REV.	FECHA:	OBSERVACIONES

V°B° DE LA DEPENDENCIA

RESP. DE PROY. EXTERNO		LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL		
PROYECTO	REVISÓ	AUTORIZÓ

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra — Secretaría de Obras Públicas

PROYECTISTA	COORDINADOR
ARQ. ALVARO DAVID MEJIA CONTRERAS	ARQ. ALEJANDRO JAIME LEAL
JEFE DE DEP.	DIRECTOR
LIC. OMAR ALEJANDRO LUJÁN GARCÍA	ARQ. ALEJANDRO PONCE RODRIGUEZ

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE, TRAMO 3 Y EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE, TRAMO A
UBICACIÓN
TRAMO 2 DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE TENIENTE JUAN DE LA BARRERA, COL. HÉROES Y TRAMO 4: DE CALLE NARANJO A AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE, FRACC. JARDINES DE LA CRUZ.
CONTENIDO
PLANO DE DETALLES SANITARIOS

CLAVE	No. PLANO
DETS 01	12
FECHA NOV 2022	ESCALA INDICADA
ACOTACIÓN METROS	No. EXP. E-000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA
