Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

Dirección de Programación Presupuestal
Núm. Oficio AMPP/0109/22
Aguascalientes, Ags. 13 de Septiembre del 2022
Asunto: Validación de Expediente Técnico

C.P. SERGIO ARTURO LOZANO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 17 fracción XV, 60 fracción XVI y 76 fracción VI del Reglamento del Sistema Integral de Desarrollo Municipal y del Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes, hago referencia al oficio SOPMA/1984/2022 recibido por este Instituto el día 13 de Septiembre del 2022 por parte de la Secretaría de Obras Públicas, mediante el cual remiten el expediente técnico original de la siguiente obra para su análisis, registro y priorización, conforme al Programa Anual de Obra Pública y Programas Sociales para el ejercicio presupuestal 2022:

DEPENDENCIA EJECUTORA:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO:	MURO FRONTAL DEL TERRENO (ACCESO) POLICIA MONTADA PIRULES
UBICACIÓN:	CALLE AMAPOLA, ESQUINA CON BLVD. SAN MARCOS, LOS PIRULES, AGUASCALIENTES, AGS.
FONDO DE INVERSIÓN:	PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL
IMPORTE:	$705,434.41 (ET FINAL)
No. DE OBRA:	2022-PDM-0024-DM-0501
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
EJE:	MUNICIPIO SEGURO
ESTRATEGIA:	EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PÚBLICA
POLITICA:	1.1.1.FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO, ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA (COMP. CAMP..).

Al respecto, hago de su conocimiento que dicho expediente ha sido analizado en su integración técnica y documental, con base en el artículo 168 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Asimismo, le comento que este Instituto valida dicha obra acorde a lo establecido en los artículos 14, 22 párrafo segundo y 23 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la cual se encuentra alineada al Plan de Desarrollo Municipal vigente, para dar cumplimiento a las metas establecidas en el mismo.

Cabe hacer mención que los recursos solicitados para este proyecto de inversión, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal para el presente ejercicio fiscal que determine la Secretaría a su digno cargo. Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

DR. en A.P. GUILLERMO DE LA TORRE SIFUENTES
DIRECTOR GENERAL

CAAR / JDDC
C.c.p. I.C. Arq. Gloria Guadalupe Castillo González .- Secretaría de Obras Públicas .Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes
Antonio Acevedo Escobedo 103 A. Col. Centro
Aguascalientes. Ags C.P. 20000
(449) 9101010 Ext. 3117
www.implanags.gob.mx

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

IMPLAN

ANÁLISIS INTEGRAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO

No. DE OBRA (PAOP 2020):	2022-PDM-0024-DM-0501	REGISTRO No.	196
OFICIO DE VALIDACIÓN:	AMPP/0109/22	FECHA RECIBIDO PARA REVISIÓN:	13 de Septiembre del 2022
PROGRAMA:	DESARROLLO MUNICIPAL	LOCALIDAD O COLONIA:	LOS PIRULES
SUB-PROGRAMA:	Patrimonio Municipal	DELEGACIÓN:	Centro Poniente
DEPENDENCIA.	Secretaría de Obras Públicas	MOD. DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
NOMBRE DE LA OBRA:	MURO FRONTAL DEL TERRENO (ACCESO) POLICIA MONTADA PIRULES, CALLE AMAPOLA, ESQUINA CON BLVD. SAN MARCOS		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL, PDM		
INVERSIÓN:	$705,434.41	CLASIFICACIÓN DE OBRA:	BIENES DE DOMINIO PUBLICA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	DIFERENCIA ENTRE MOD.
$705,434.41	0.00	0.00	$705,434.41	0.00	0.00	*$0,00*

TIPO DE EXPENDIENTE:	ET FINAL	AÑO: 2022	AÑO:	AÑO:		
AVANCES:	Financiero: 100 %		Físico: 100 %			
FECHA DE INICIO:	7 de Abril del 2022	FECHA DE TÉRMINO:	13 de Mayo del 2022	REGISTRO SIMA:	24	

CHEK LIST DE LOS ANEXOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

CÉDULA DE REGISTRO DE OBRA	✓
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	✓
MEMORIA DESCRIPTIVA	✓
PRESUPUESTO BASE	✓
FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES	✓
PLANOS O ESTUDIOS TÉCNICOS	✓
PADRÓN DE BENEFICIARIOS	N/A
ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO	N/A
DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL	N/A
CONVENIO DE CONCERTACIÓN	N/A
ACTA CONSTITUTIVA	N/A

METAS		BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		OBRA PROPUESTA		CLAVE SISCO
UNIDAD DE MEDIDA	CANT	TIPO DE BENEFICIARIOS	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	CONCEPTO	JORNALES A GENERAR	
OBRA	1	Personas	450	2022-04-07	2022-05-13	Equipamiento	1834	2311

INCLUIDO EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES

RECIBIO: ING. JOSÉ DAVID BURGUETE CLAUSTRO

Analista de Programación e Inversión de Obra Pública

13 de Septiembre del 2022

Fecha de validación

13 de Septiembre del 2022

Fecha de validación Expediente

PROCEDE Si ✓ No

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

CEDULA DE REGISTRO POR OBRA

Aguascalientes
SE CIUDAD DE TU VIDA

050400-001E00E05-05-2-2-2-00-1-E-0510-0-17-0024-21-1111-6125

2022-PDM-0024-DM-05-011	Obra **MURO FRONTAL DEL TERRENO (ACCESO) POLICÍA MONTADA PIRULES**
Tipo DEFINITIVO 1 2022	Ubic. CALLE AMAPOLA, LOS PIRULES Inf. , Deleg. Insurgentes
Folio SISCO **2311**	

Ent Ejecutora: **050400001E00E05**

Eje: **05**	MUNICIPIO SOBRESALIENTE
Finalidad: **2**	DESARROLLO SOCIAL
Función: **2**	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Subfunción: **2**	DESARROLLO COMUNITARIO
Tema: **00**	SIN TEMA
Cuenta del Gasto **1**	GASTO PROGRAMABLE
Clasif. Programatica: **E**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Programa: **0510**	Movilidad Urbana
SubPrograma: **0**	SUBPROGRAMA GENÉRICO
Proyecto: **17**	
Tipo de Gasto: **21**	GASTO INVERSIÓN / OBRA PÚBLICA

I N V E R S I O N 2022

Municipal	1111	RECURSO PROPIO 2022	$705,434.41
		Folio SIMA 24 Total	$705,434.41

M E T A S

Unidad de Medida	Cantidad	Descripción
OBRA	1	OBRA MURO FRONTAL DEL TERRENO (ACCESO) POLICÍA MONTADA PIRULES

Inversión Ejercida Total al	31 de Diciembre de 2021	$0.00
Avance Físico Acumulado al	31 de Diciembre de 2021	
Avance Físico Acumulado Programado al	31 de Diciembre de 2022	100 %

Fecha de Inicio 07 Abr 2022 Fecha de Terminación 13 May 2022

Jornales a Generar en 2022 1834

Modalidad de ejecución CONTRATO

Clasificación de la Obra Bienes de Dominio Público

Registro del Patrimonio: Infraestructura

OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

GENERALES

Nombre del Proyecto : MURO FRONTAL DEL TERRENO (ACCESO) POLICÍA MONTADA PIRULES

CALLE AMAPOLA, LOS PIRULES Inf. , Dolog. Insurgentes

Programa : DM DESARROLLO MUNICIPAL

Subprograma : 05 PATRIMONIO MUNICIPAL (a).- Construcción)

Clave del Municipio : AGUASCALIENTES

Localidad :

Barrio, Colonia o Ejido : LOS PIRULES Inf.

Tipo de Obra : NUEVA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

MURO FRONTAL DEL TERRENO (ACCESO) POLICÍA MONTADA PIRULES

Beneficiarios (No. y Tipo) :

450	PERSONAS

OBRAS PUBLICAS

Los abajo firmantes, hacen constar que el presente proyecto :

MURO FRONTAL DEL TERRENO (ACCESO) POLICÍA MONTADA PIRULES

CALLE AMAPOLA, LOS PIRULES Inf. , Deleg. Insurgentes

cumple con los Requisitos y Normas Técnicas establecidas por la Dependencia Normativa, por lo que es viable su ejecución. Comprometiéndose la misma a proporcionar la supervisión y asistencia técnica necesaria durante el proceso administrativo.

Por la Dependencia Ejecutora

Arq. Gloria Guadalupe Castillo González
Encargada de Despacho de la Secretaría de Obras Públicas

Com. Gral. Mtro. en D.C. A. Antonio Martínez Romo
Secretario de Seguridad Pública

LUGAR :AGUASCALIENTES, AGS.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

Aguascalientes LA CIUDAD DE TU VIDA

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

LOCALIZACION: CALLE AMAPOLA, LOS PIRULES Inf. , Deleg. Insurgentes

PROGRAMA: DESARROLLO MUNICIPAL

SUBPROGRAMA: PATRIMONIO MUNICIPAL (a).- Construcción)

OBRA A REALIZAR: MURO FRONTAL DEL TERRENO (ACCESO) POLICÍA MONTADA PIRULES

DEPENDENCIA EJECUTORA. SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

FORMA DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA: NUEVA

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

MURO FRONTAL DEL TERRENO (ACCESO) POLICÍA MONTADA PIRULES

CARACTERISTICAS DE LA OBRA: Bueno

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE REQUIERE PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

PROCEDE: SI [X] NO [ ]

REVISÓ: Jefa del Departamento de Expedientes Tecnicos y Costos

NOMBRE: Arq. Blanca Margarita Martinez Amador

FIRMA

FECHA 28 Jul 2022

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

No. Folio SISCO 2311


SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

DIRECCION DE SUPERVISION

MURO FRONTAL DEL TERRENO (ACCESO) POLICIA MONTADA PIRULES

CALLE AMAPOLA, LOS PIRULES INF AGUASCALIENTES, AGS.

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

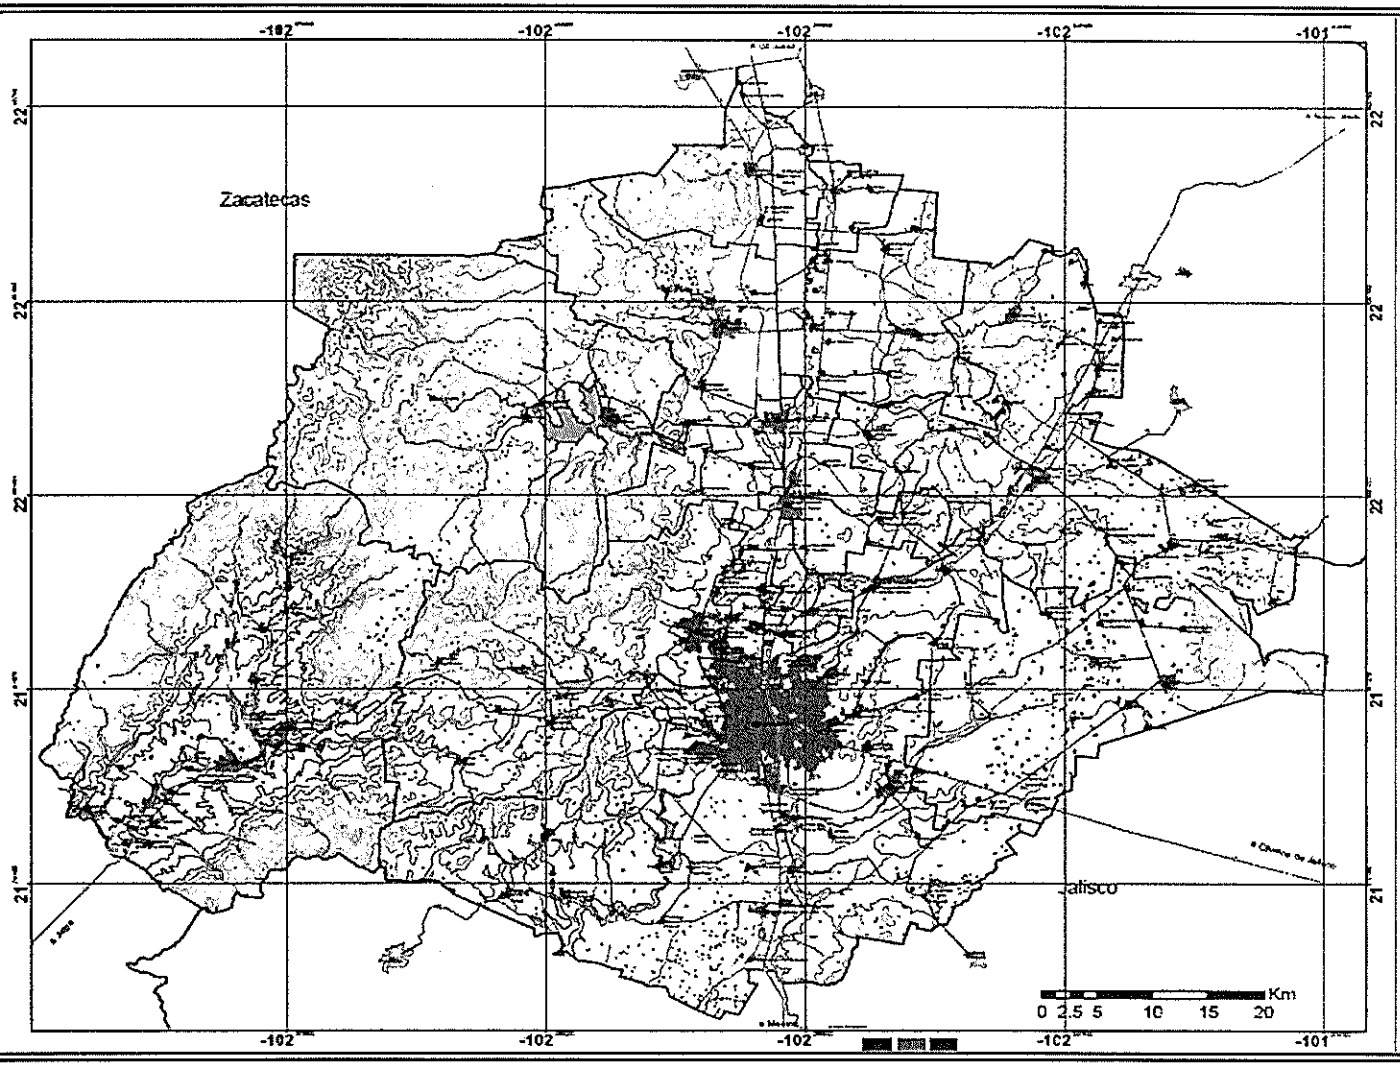


LOCALIZACION A NIVEL MACRO

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

DIRECCION DE SUPERVISION

MURO FRONTAL DEL TERRENO (ACCESO) POLICIA MONTADA PIRULES, CALLE AMAPOLA, LOS PIRULES INF. AGUASCALIENTES, AGS

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

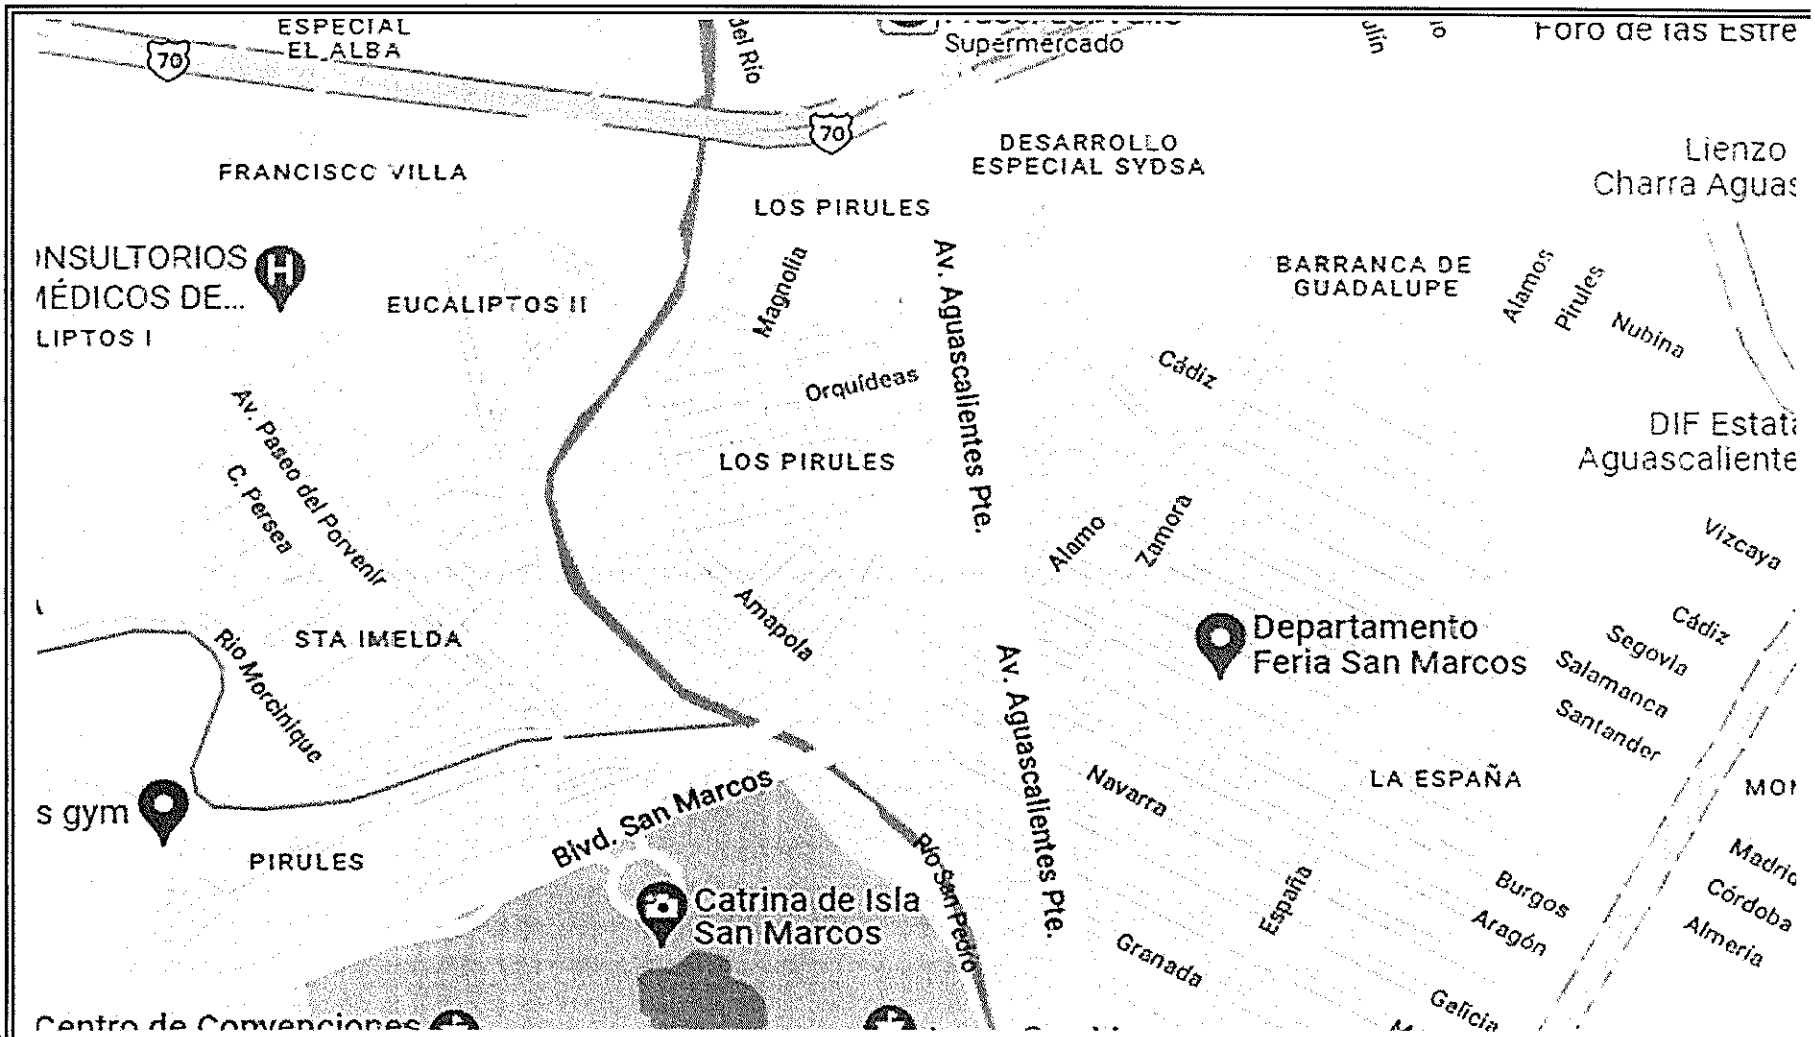

LOCALIZACION A NIVEL MICRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

PRESUPUESTO MODIFICADO

Aguascalientes

Obra: MURO FRONTAL DEL TERRENO (ACCESO) POLICÍA MONTADA PIRULES

Ubicación: CALLE AMAPOLA, LOS PIRULES Inf.

Contratista: JLJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (627)

Grupo	Partida		Importe
MURO FRENTE DEL TERRENO (ACCESO)			
	PRELIMINARES		$98,632.68
	CIMENTACION		$128,462.50
	ESTRUCTURA DE CONCRETO		$155,609.28
	ALBAÑILERIA		$118,923.33
	PUERTAS DE ACCESO Y SALIDA		$84,513.08
	LIMPIEZA GENERAL		$1,471.44
		Subtotal por Grupo	$587,612.30
EXTRAORDINARIO			
	EXTRAORDINARIO		$20,520.81
		Subtotal por Grupo	$20,520.81
		Totales Presup.	$608,133.11
		Anticipo +	$179,861.92
		Amortizac. Ant. -	$179,861.92
		SubTotal. Ant. =	$608,133.11
		IVA +	$97,301.30
		Total =	$705,434.41

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

PRESUPUESTO MODIFICADO

Aguascalientes

Obra: MURO FRONTAL DEL TERRENO (ACCESO) POLICÍA MONTADA PIRULES

Ubicación: CALLE AMAPOLA, LOS PIRULES Inf.

Contratista: JLJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (627)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **MURO FRENTE DEL TERRENO (ACCESO)**				
	PARTIDA: **PRELIMINARES**				
1	TRAZO DEL TERRENO CON HERRAMIENTA MENOR Y/O EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO NECESARIO,PUENTEO, HILO, SEÑALIZACION DE BANCO Y PUNTOS QUE SE REQUIERAN EN LA NIVELACION CON PINTURA, CARGA, ACARREOS LOCALES DENTRO DE LA OBRA A DONDE PERSONAL DE SOPMA LO INDIQUE, MEDIDO COMPACTADO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO.	M2	78	$5.90	$460.20
2	EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL CON RECUPERACION (A DONDE EL PERSONAL DE SUPERVISION LO INDIQUE) TIPO I Y II DE 0.00 A 1.80 M DE PROFUNDIDAD HASTA ALOJAR CIMENTACION Y CAPAS DE TEPETATE, POR MEDIOS MECANICOS PARA DAR NIVELES INDICADOS EN PROYECTO, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES, MARCACION DE NIVELES CON EQUIPO TOPOGRAFICO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO NECESARIO, ACARREOS LOCALES, MEDIDO COMPACTO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO.	M3	209.44	$115.40	$24,169.38
3	COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS DEL TERRENO NATURAL AL 90% DE SU PVSM EN UN ESPESOR DE 15 cm INCLUYE: HUMEDAD OPTIMA, MEDIDO COMPACTADO, LIMPIEZAS, HUMEDAD OPTIMA AL 95% DE SU P.V.M.S. CON EL USO DE EQUIPO MECANICO (BAILARINA) COMO PREPARACION PARA RELLENO Y PLATAFORMAS. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, AGUA (LA NECESARIA), EXTENDIDO, CLASIFICACION DEL MATERIAL APROBADA POR SUPERVISION DE SOPMA, COMPACTADO, PRUEBA DE COMPACTACION, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TRABAJO TERMINADO.	M2	75.4	$17.78	$1,340.61
4	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) HUMEDAD OPTIMA EN CAPAS DE 20cm AL 95% DE SU P.V.M.S. CON EL USO DE EQUIPO MECANICO (BAILARINA) PARA DAR NIVELES INDICADOS EN PROYECTO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, AGUA (LA NECESARIA), EXTENDIDO, CLASIFICACION DEL MATERIAL APROBADA POR SUPERVISION DE SOPMA, ABUNDAMIENTO, COMPACTADO, PRUEBA DE COMPACTACION, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TRABAJO TERMINADO.	M3	112.19	$309.83	$34,759.83
5	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES EN CAMION AL PRIMER KILOMETRO (URBANA, SUBURBANA, TERRACERIA, ETC.). INCLUYE: EQUIPO PARA CARGA MECANICA Y ACARREO, MEDIDO COMPACTO.	M3	209.44	$35.05	$7,340.87
6	ACARREO DE MATERIAL MIXTO EN CAMION A km SUBSECUENTES DEL PRIMER KILOMETRO FUERA DE LA OBRA (ZONA URBANA, SUBURBANA, TERRACERIA, ETC.) INCLUYE: EQUIPO PARA ACARREO Y DESCARGA DEL MATERIAL EN TIRADERO MUNICIPAL INDICADO POR SUPERVISION DE SOPMA.	M3/KM	7123.96	$4.29	$30,561.79
				Totales por Partida	**$98,632.68**
	PARTIDA: **CIMENTACION**				
7	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA EN CIMENTACION F'C=100kg/cm2 TMA DE 3/4", DE 0.00 A 1.80M DE PROFUNDIDAD, DE 5cm DE ESPESOR, PERFECTAMENTE COLADO, VIBRADO, NIVELADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA, DESMOLDANTE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, TORSALES, SEPARADORES, ACARREOS LOCALES, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA (CURACRETO), TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO.	M2	75.4	$181.86	$13,712.24

Obra: MURO FRONTAL DEL TERRENO (ACCESO) POLICÍA MONTADA PIRULES

Ubicación: CALLE AMAPOLA, LOS PIRULES Inf.

Contratista: JLJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (627)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **MURO FRENTE DEL TERRENO (ACCESO)**				
	PARTIDA: **CIMENTACION**				
8	CONCRETO PREMEZCLADO EN CIMENTACION F'c=200 kg/cm2, TMA DE 3/4", DE 0.00 A 1.80M DE PROFUNDIDAD PROMEDIO, PERFECTAMENTE COLADO, VIBRADO, NIVELADO, CURADO, (VER PLANO DE DETALLES DE ESTRUCTURA Y CIMENTACION), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS LOCALES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO.	M3	6.96	$2,814.28	$19,587.39
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA COMUN EN CIMENTACION MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, DE 0.00 A 1.80M DE PROFUNDIDAD PROMEDIO, PERFECTAMENTE COLOCADA, PREVIA APLICACION DE DESMOLDANTE, NIVELADA, (VER PLANO DE DETALLES DE ESTRUCTURA), INCLUYE: CIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, DESMOLDANTE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACARREOS LOCALES, HERRAMIENTA MENOR, TORZALES Y ATIESADORES, BARROTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO.	M2	18.67	$321.75	$6,007.07
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO A BASE DE VARILLA CUALQUIER DIAMETRO Fy = 4200 Kg/Cm2 EN CIMENTACION DE 0.00 A 1.80M DE PROFUNDIDAD PROMEDIO, PERFECTAMENTE COLOCADA, (VER PLANO DE DETALLES DE ESTRUCTURA Y CIMENTACION), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS LOCALES, HERRAMIENTA MENOR, FLETES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS, TORSALES, CALZADO, CORTES, AMARRES, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO.	KG	535.67	$54.66	$29,279.72
12	MURO DE ENRASE DE TABICON PESADO DE CONCRETO 10X14X28cm. ASENTADO EN 14cm. CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:4, BOQUILLAS DE 1.5cm. MAXIMO Y UNA ALTURA PROMEDIO DE 1.30m, A PLOMO Y NIVEL, (VER PLANO DE ALBAÑILERIA), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO OFICIAL INDICADO POR LA SUPERVISION, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO.	M2	39.5	$1,515.85	$59,876.07
				Totales por Partida	**$128,462.50**
	PARTIDA: **ESTRUCTURA DE CONCRETO**				
13	CONCRETO EN ESTRUCTURA (TRABES, COLUMNAS ETC) HECHO EN OBRA REVOLVEDORA DE 1 SACO F'c=200 kg/cm2, TMA DE 3/4", DE 0.00 A 5.00M DE ALTURA PROMEDIO, PERFECTAMENTE COLADO PLOMEADO, VIBRADO, NIVELADO, CURADO, (VER PLANO DE DETALLES DE ESTRUCTURA Y CIMENTACION), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS LOCALES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO.	M3	10.05	$5,664.28	$56,926.01
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA COMUN EN ESTRUCTURA DE CONCRETO MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, DE 0.00 A 5.00M DE ALTURA PROMEDIO, PERFECTAMENTE COLOCADA, PREVIA APLICACION DE DESMOLDANTE, NIVELADA Y PLOMEADA, (VER PLANO DE DETALLES DE ESTRUCTURA), INCLUYE: CIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, DESMOLDANTE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACARREOS LOCALES, HERRAMIENTA MENOR, TORZALES Y ATIESADORES, BARROTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO.	M2	70.35	$322.99	$22,722.35

Obra: MURO FRONTAL DEL TERRENO (ACCESO) POLICÍA MONTADA PIRULES

Ubicación: CALLE AMAPOLA, LOS PIRULES Inf.

Contratista: JLJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (627)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **MURO FRENTE DEL TERRENO (ACCESO)**				
	PARTIDA: **ESTRUCTURA DE CONCRETO**				
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO A BASE DE VARILLA CUALQUIER DIAMETRO Fy = 4200 Kg/Cm2 EN ESTRUCTURA DE 0.00 A 8.00M DE ALTURA PROMEDIO, PERFECTAMENTE COLOCADA, (VER PLANO DE DETALLES DE ESTRUCTURA), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS LOCALES, HERRAMIENTA MENOR, FLETES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS, TORSALES, CALZADO, CORTES, AMARRES, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO.	KG	1381.61	$54.98	$75,960.92
			Totales por Partida		**$155,609.28**
	PARTIDA: **ALBAÑILERIA**				
16	CADENA DE DESPLANTE CD-01 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA (REVOLVEDORA DE 1 SACO) DE 15 X 20 CM ARMADA CON 4 VRS DEL No.3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15 CM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HABILITADO, TRASLAPES, CIMBRA, DESMOLDANTE, AMARRES, CIMBRADO, COLOCACION, NIVELADO, BARROTES, TORSALES, PLOMEADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ACARREOS LOCALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO.	ML	21.35	$467.63	$9,983.90
17	IMPERMEABILIZACION DE CADENA CD-01 DE DESPLANTE (14 CM DE ANCHO) A BASE DE 1a. CAPA DE IMPERMEABILIZANTE IMPERFEST-E, APLICADO CON CEPILLO DE PELO DELGADO, TIRA IMPERMEABILIZADORA IMPERNOVA DALLAS MARCA FESTER O SIMILAR EN CALIDAD SEGUN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS LOCALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TRABAJO TERMINADO.	ML	21.35	$74.57	$1,592.07
18	ANCLAJE DE CASTILLO K-1 DE CONCRETO HECHO EN OBRA (REVOLVEDORA DE 1 SACO), f'c=200kg/cm2 TMA 19MM GRAVA TRITURADA, DE 15X20cm DE SECCION , ANCLADO A ZAPATA CORRIDA, REFORZADO CON ARMEX 15-15-4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFECTAMENTE PLOMEADO, Y A TIRON DE HILO ENTRE CASTILLOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CIMBRA, AMARRES, TRASLAPES, TORSALES, CIMBRADO, DESMOLDANTE, COLADO, DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO.	PZA	19	$383.30	$7,282.70
19	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO 7X14X28 DE 0.00 A 4.00 M DE ALTURA ASENTADO EN 14 (VER PLANO DE DETALLE DE MURO) PARA MURO DE 14 AL HILO JUNTAS DE 1.5 CMS MORTERO CEMENTO ARENA PROP: 1:5 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, ACARREOS LOCALES, FLETES, NIVELADO, PLOMEADO, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TRABAJO TERMINADO. (VER CORTE EN PLANO ALBAÑILERIA)	M2	49.11	$514.69	$25,276.43
20	CASTILLOS TIPO K-01 A DOS CARAS DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA DE CONCRETO HECHO EN OBRA (REVOLVEDORA 1 SACO) TMA 3/4" F'C=200 KG/CM2 SECCION 15 X 20 CM, ARMADO CON 4 VS #3 E#2@15CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, NIVELADO, PLOMEADO, HABILITADO, TORSALES, TRASLAPES, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TRABAJO TERMINADO.	ML	69	$507.76	$35,035.44

Obra: MURO FRONTAL DEL TERRENO (ACCESO) POLICÍA MONTADA PIRULES

Ubicación: CALLE AMAPOLA, LOS PIRULES Inf.

Contratista: JLJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (627)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **MURO FRENTE DEL TERRENO (ACCESO)**				
	PARTIDA: **ALBAÑILERIA**				
21	CADENA INTERMEDIA DE CONCRETO F`C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA (REVOLVEDORA DE 1 SACO) DE 15 X 20 CM ARMADA CON 4 VRS DEL No.3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15 CM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HABILITADO, TRASLAPES, CIMBRA, DESMOLDANTE, AMARRES, CIMBRADO, COLOCACION, NIVELADO, BARROTES, TORSALES, PLOMEADO, CIMBRA COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ACARREOS LOCALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO.	ML	21.35	$507.76	$10,840.68
23	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1:5, ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM, ACABADO FINO RAYADO VERTICAL, INCLUYE: REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:5, PLOMEADO, NIVELADO, EMBOQUILLADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA.	M2	137.9	$209.66	$28,912.11
				Totales por Partida	**$118,923.33**
	PARTIDA: **PUERTAS DE ACCESO Y SALIDA**				
39	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE HOJA DE ACCESO, SECCION COMPLETA 4.87x3.00 m. DOS HOJAS ABATIBLES, MARCO DE PER DE 3 1/2"x 3 1/2" SOPORTADO POR DOS POSTES VERTICALES DE 3.00 M. A CADA LADO DE PER DE 6X4", TUBOS VERTICALES DE 2.80 M. DE TUBO DE ACERO NEGRO CED. 30 DE 2". @20CM. (A EJES), CON TAPA DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 EN EXTREMO SUPERIOR, LOS TUBOS UNIDOS POR PLACAS DE 3 /16" DE 15X5CM, DOS RUEDAS GIRATORIAS UNA EN CADA PUERTA, DE ACERO FUNDIDO PARA ALTA CARGA DE 5" HASTA 300 KG FIJADA A MARCO DE PER EN SU PARTE INFERIOR, 4 PLACAS EN CADA POSTE DE ACERO SECCION 22 x 22 cm DE 3/8" DE ESPESOR PARA RECIBIR PER DE 6X4" MEDIANTE SOLDADURA, ANCLADO A COLUMNA DE CONCRETO CON 4 VRS DEL No.3 DE 20 cm DE LONGITUD EN CADA PLACA, PLACA DE ACERO SECCION 22 x 22 cm DE 3/8" DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBO O CARTABONES MEDIANTE SOLDADURA, ANCLADO A PISO CON 4 VRS DEL No.3 DE 20 cm DE LONGITUD, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, CORTES CON BOCA DE PESCADO, CERROJO DE ACERO HECHO CON SOLERAS CON PORTACANDADO, CANDADO MARCA PHILLIPS LINEA EXTRA SEGURIDAD MODELO TX-60, BISAGRAS, HERRAJES, MACHUELOS O TEJUELOS (INFERIOR Y SUPERIOR) , CARTABONES, CAJA DE LAMINA PARA RECIBIR CHAPA, LIMPIEZA DE ELEMENTOS METALICOS LIBRE DE OXIDO Y GRASAS, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE APLICADA CON PISTOLA DE AIRE, A DOS MANOS, COLOR POR DEFINIR EN OBRA, ENSAMBLAJE, ANCLAJE, TRABAJOS DE TALLER, PLOMEADO, ALINEADO, NIVELADO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA, TRABAJO TERMINADO.	KG	879.52	$96.09	$84,513.08
				Totales por Partida	**$84,513.08**
	PARTIDA: **LIMPIEZA GENERAL**				
40	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A DONDE LO INDIQUE LA SOPMA	M2	252.825	$5.82	$1,471.44
				Totales por Partida	**$1,471.44**
				Totales por Grupo	**$587,612.30**

Obra: MURO FRONTAL DEL TERRENO (ACCESO) POLICÍA MONTADA PIRULES

Ubicación: CALLE AMAPOLA, LOS PIRULES Inf.

Contratista: JLJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (627)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **EXTRAORDINARIO**				
	PARTIDA: **EXTRAORDINARIO**				
41	RELLENO DE TEPETATE MEJORADO CON CEMENTO EN PROPORCION DE 50 KG DE CEMENTO : 1 M3 DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), LA MEZCLA DE SUELO CEMENTO DEBERA REALIZARSE EN SECO (EXPLUSIVAMENTE CON LA HUMEDAD NATURAL DEL MATERIAL DE BANCO) COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, UNIFORME, CON COMPACTADOR DE IMPACTO, LA HOMOGENIZACION SE REALIZARA POR METODOS MECANICOS (SIN INCORPORAR AGUA), HASTA LOGRAR UN COLOR UNIFORME EN LA TONALIDAD DEL MATERIAL, AL INCORPORAR EL AGUA NECESARIA PARA LOGRAR L AHUMEDAD CERCANA A LA OPTIMA, EL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LA INCORPORACION DEL AGUA Y LOGRAR EL GRADO DE COMPACTACION NO SERA SUPERIOR A 60 MINUTOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE TEPETATE, AGUA LA NECESARIA, MEDIDO COMPACTADO AÑ 95 % DE SU P.V.S.M., SELECCION DEL MATERIAL, QUE NO EXCEDA A UN TERCIO DEL ESPESOR DE LA CAPA DE ESCARIFICACION, HOMOGENIZADO, TENDIDO, PAPEADO DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.	M3	30.8	$666.26	$20,520.81

Totales por Partida		**$20,520.81**
Totales por Grupo		**$20,520.81**
Totales Presup.		**$608,133.11**
Anticipo	+	**$179,861.92**
Amortizac. Ant.	-	**$179,861.92**
SubTotal. Ant.	=	**$608,133.11**
IVA	+	**$97,301.30**
Total	=	**$705,434.41**

H. AYUNTAMIENTO DE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

PROGRAMA DE OBRA DEFINITIVO

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

RO3-POS-SOS-7.5.1-04	
REVISION:	00
FECHA DE REVISION:	
RESPONSABLE:	SUPERVISOR DE OBRA
TIEMPO DE RET:	02 AÑOS

No. DE CONTRATO : DM-0024-2022

PROGRAMA: DM- DESARROLLO MUNICIPAL

INICIO VIGENTE: 07-abril-22

No. OBRA Y NOMBRE DE LA OBRA: MURO FRONTAL DEL TERRENO (ACCESO) POLICÍA MONTADA PIRULES

TERMINO REAL: 13-mayo-22

RECURSO 2022

CONCEPTO			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	PONDERACIÓN %	
			2021																	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FINANCIERO	FÍSI
DESCRIPCION	INVERSION																			
MURO FRONTAL DEL TERRENO (ACCESO) POLICÍA MONTADA PIRULES																20	6			
CALLE AMAPOLA, LOS PIRULES Int.																				
PRELIMINARES	$ 98,632.68	100							100										10.00	10.
CIMENTACION	$ 129,462.50	100							50 50										10.00	10.
ESTRUCTURA DE CONCRETO	$ 155,609.28	100								100									10.00	10.
ALBAÑILERIA	$ 115,923.33	100								30 30 40									10.00	10.
PUERTAS DE ACCESO Y SALI	$ 84,513.08	100								30 30 40									20.00	20.
LIMPIEZA GENERAL	$ 1,471.44	100								100									20.00	20.
EXTRAORDINARIO	$ 20,520.81	10								30 20 20 15 15									20.00	20.
SUBTOTAL SIN IVA	$ 608,133.11																			
AVANCE SEMANAL %									15%	25%										
AVANCE SEMANAL ACUMULADO %									15%	40%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00	
EJERCIDO SEMANAL $									189,020.17	3,074.12										
EJERCIDO MENSUAL $			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$192,130.87	$89,002.25	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ 608,133.11	
EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO $			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,130.87	608,133.12	608,133.12	608,133.12	608,133.12	608,133.12	608,133.12	608,133.12	608,133.12	608,133.12	$ 97,301.30	IV
EJERCIDO SEMANAL %									11%	1%										
EJERCIDO MENSUAL %			0%	0%	0%	0%	0%	0%	85%	15%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GRAN TOTAL EJERCIDO	
EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO %			0%	0%	0%	0%	0%	0%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	$	705,4

PRE

ARQ. ARMONIA ANDREA [illegible] HERNÁNDEZ
SUPERVISOR

MODIFICADO 1

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

EJERCICIO 2022

N° DE CONTRATO: DM-0024-2022

NOMBRE DE LA OBRA: MURO FRONTAL DEL TERRENO (ACCESO) POLICÍA MONTADA PIRULES

MONTO MODIFICADO FINAL: $ 1,779,537.03

VOLUMEN	UNIDAD	COMPONENTE DE LA OBRA	MONTO
112.19	M3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) HUMEDAD OPTIMA EN CAPAS DE 20cm AL 95% DE SU P.V.M.S. CON EL USO DE EQUIPO MECANICO (BAILARINA) PARA DAR NIVELES INDICADOS EN PROYECTO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ACARREOS DENTRO DE LA	$ 98,632.68
39.50	M2	MURO DE ENRASE DE TABICON PESADO DE CONCRETO 10X14X28cm. ASENTADO EN 14cm. CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:4, BOQUILLAS DE 1.5cm. MAXIMO Y UNA ALTURA PROMEDIO DE 1.30m, A PLOMO Y NIVEL, (VER PLANO DE ALBAÑILERIA), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS	$ 128,462.50
1381.61	KG	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO A BASE DE VARILLA CUALQUIER DIAMETRO Fy = 4200 Kg/Cm2 EN ESTRUCTURA DE 0.00 A 8.00M DE ALTURA PROMEDIO, PERFECTAMENTE COLOCADA, (VER PLANO DE DETALLES DE ESTRUCTURA), INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS LOCALES, HERRAMIENTA	$ 155,609.28
69.00	ML	CASTILLOS TIPO K 01 A DOS CARAS DE 0.00 A 8.00 M DE ALTURA DE CONCRETO HECHO EN OBRA (REVOLVEDORA 1 SACO) TMA 3/4" F'C=200 KG/CM2 SECCION 15 X 20 CM, ARMADO CON 4 VS #3 E#2@15CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, NIVELADO, PLOMEADO, HABILITADO, TORSALES, TRASLAPES,	$ 118,923.33
879.52	KG	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE HOJA DE ACCESO, SECCION COMPLETA 4.87x3.00 m. DOS HOJAS ABATIBLES, MARCO DE PER DE 3 1/2"x 3 1/2" SOPORTADO POR DOS POSTES VERTICALES DE 3.00 M. A CADA LADO DE PER DE 6X4", TUBOS VERTICALES DE 2.80 M. DE TUBO DE ACERO NEGRO CED. 30 DE 2". @20CM. (A EJES), CON	$ 84,513.08
252.83	M2	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A DONDE LO INDIQUE LA SOPMA	$ 1,471.44
30.80	M3	RELLENO DE TEPETATE MEJORADO CON CEMENTO EN PROPORCION DE 50 KG DE CEMENTO	$ 20,520.81

TOTAL PRESUP.	$	608,133.11
IVA	$	97,301.30
TOTAL	$	705,434.41

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ARQ. ARIADNA MEDINA DOMINGUEZ

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


MEMORIA FOTOGRAFICA


OBRA: MURO FRONTAL DEL TERRENO (ACCESO PUBLICO) MONTADA PIRULES
UBICACIÓN: CALLE AMAPOLA, LOS PIRULES INF, AGUASCALIENTES, MPIO
CONTRATISTA: JLJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.


NO. DE CONTRATO: DM-0024-2022
LOCALIDAD: AGS

INICIO

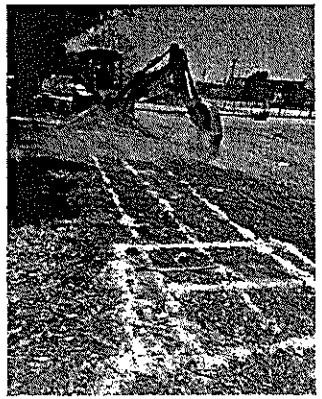

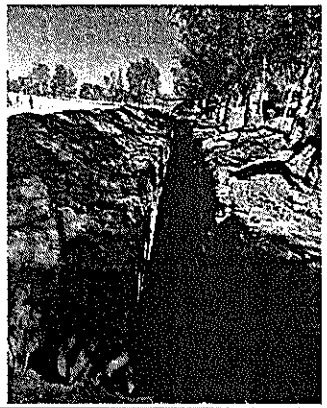

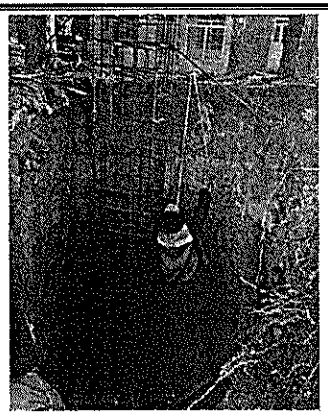

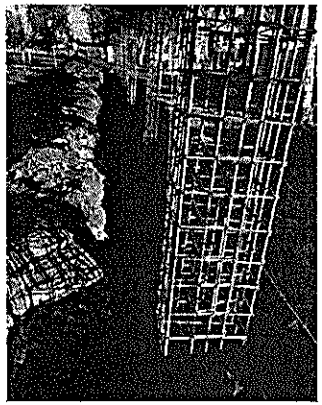

ARQ. ARIADNA MEDINA DOMINGUEZ

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


MEMORIA FOTOGRAFICA


OBRA: MURO FRONTAL DEL TERRENO (ACCESO) POLICIA MONTADA PIRULES
UBICACIÓN: CALLE AMAPOLA, LOS PIRULES INF, AGUASCALIENTES, MPIO
CONTRATISTA: JLJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

NO. DE CONTRATO: DM-0024-2022
LOCALIDAD: AGS

PROCESO

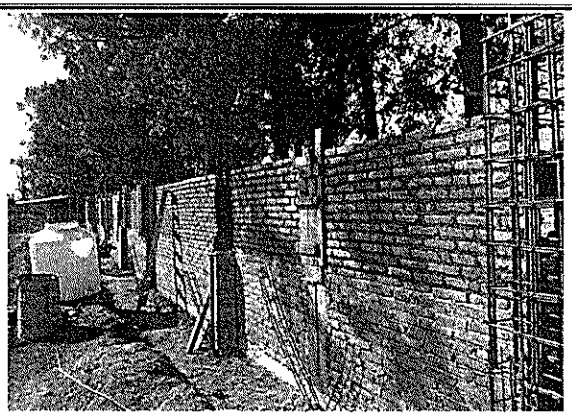

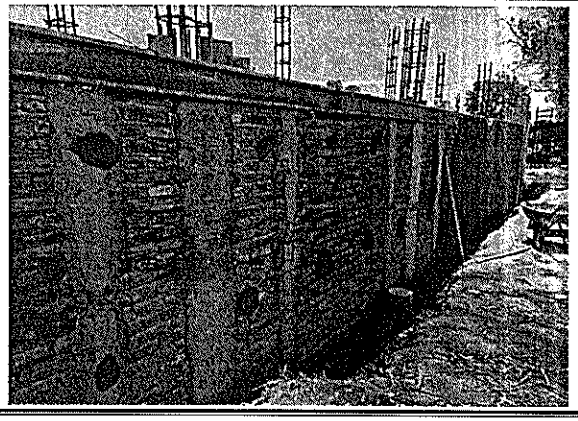

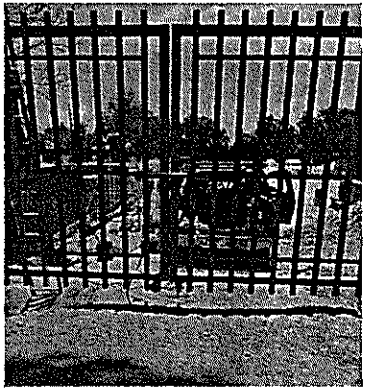



ARQ. ARIADNA MEDINA DOMINGUEZ

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


MEMORIA FOTOGRAFICA


OBRA: MURO FRONTAL DEL TERRENO (ACCESO) POLICIA MONTADA PIRULES
UBICACION: CALLE AMAPOLA, LOS PIRULES INF. AGUASCALIENTES, MPIO
CONTRATISTA: JLJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.


NO. DE CONTRATO: DM-0024-2022
LOCALIDAD: AGS

TERMINO

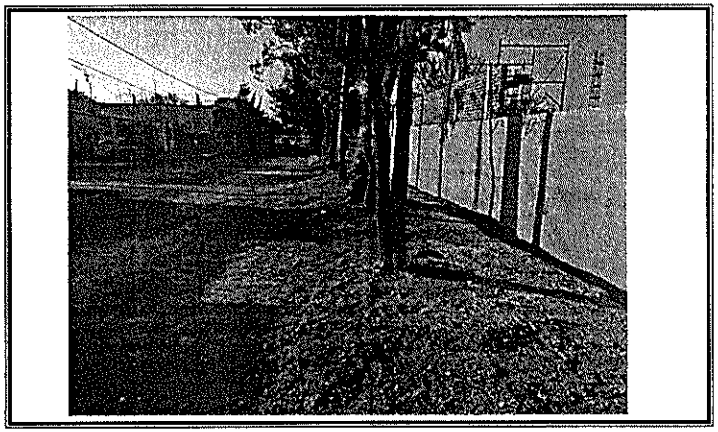

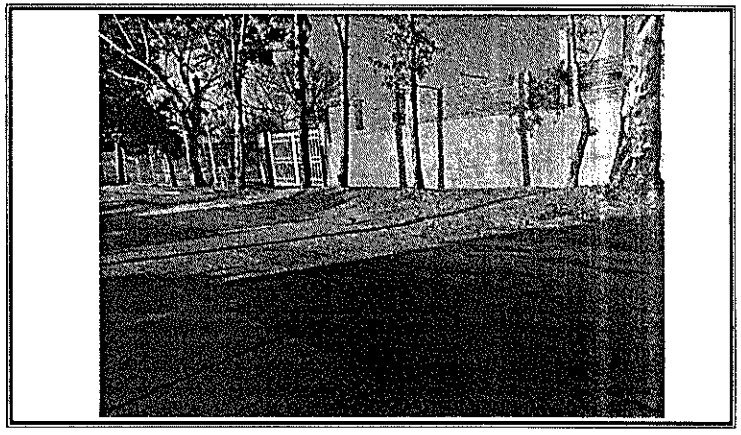

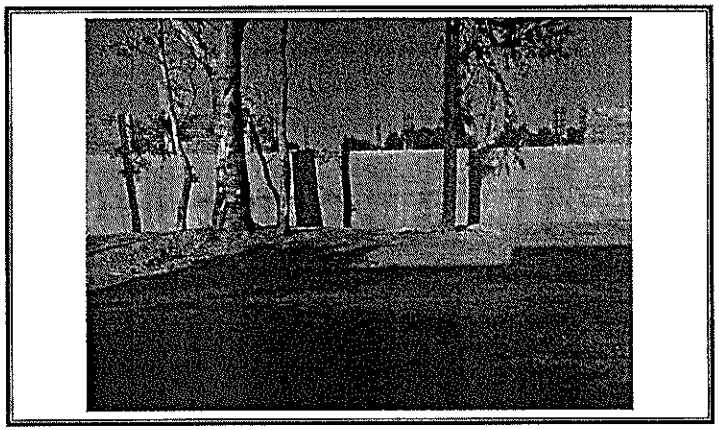

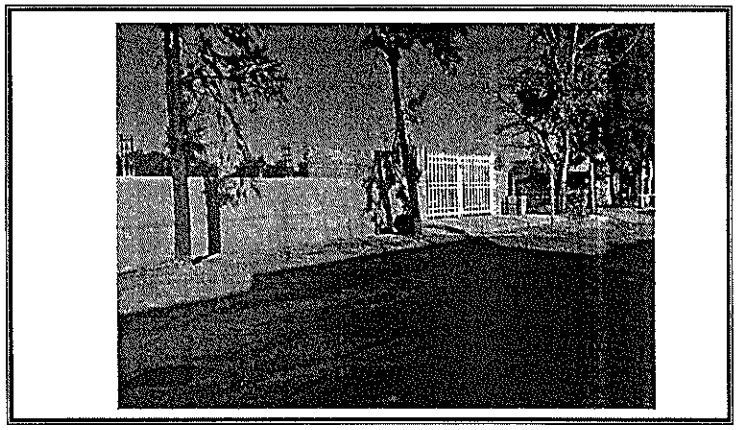

A.O. ARIADNA MEDINA DOMINGUEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

GENERALES

EJERCICIO:	2022	APROBACION No:	2022-PDM-0024-DM-05-011
LOCALIDAD:	CALLE AMAPOLA, LOS PIRULES Inf.		
MUNICIPIO:	AGUASCALIENTES, Mpio.		
TIPO DE INVERSION	PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (1111 RECURSO PROPIO)		
PROGRAMA:	DM- DESARROLLO MUNICIPAL		
SUB-PROGRAMA:			
OBRA A REALIZARSE:	MURO FRONTAL DEL TERRENO (ACCESO) POLICÍA MONTADA PIRULES		
DEPENDENCIA EJECUTORA:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)		
FORMACIÓN DE EJECUCION:	CONTRATO	NO. DE CONTRATO:	DM-0024-2022
NOMBRE CONTRATISTA:	JLJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		
REPRESENTANTE:			
MONTO CONT. ORIGEN	$599,539.74	ANTICIPO:	$ 95,926.36
1A AMPLIACION $:	$ 9,968.31	1 AMPL DIAS	7
2A AMPLIACION $:		2 AMPL DIAS	
FIRMA CONTRATO:	05/04/2022		
INICIO CONT: dd/mm/aa	06/04/2022	RMINO CONT:	4 de junio de 2022
INICIO REAL: dd/mm/aa	7 de abril de 2022	ERMINO REAL:	13 de mayo de 2022

TIPO DE OBRA PROPUESTA

NUEVA CREACIÓN	X	CONSOLIDACIÓN	
COMPLEMENTARIA		AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN		EQUIPAMIENTO	

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

MURO FRONTAL DEL TERRENO (ACCESO) POLICÍA MONTADA PIRULES

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA: (SELECCIONAR UNO OBLIGATORIO)

BUEN ESTADO X REGULAR PESIMO ESTADO

FACTIBILIDAD DE LA OBRA: (CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA)

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA OPERARSE

PROCEDE: SI: X NO:
MARQUE SOLO UNA

ARQ.ARIADNA MEDINA DOMINGUEZ
SUPERVISOR

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

GENERALES

LOCALIDAD: CALLE AMAPOLA, LOS PIRULES Inf.
MUNICIPIO: AGUASCALIENTES, Mpio.
PROGRAMA: DM- DESARROLLO MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA: 0
OBRA A REALIZARSE: MURO FRONTAL DEL TERRENO (ACCESO) POLICÍA MONTADA PIRULES

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)
FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA

NUEVA CREACIÓN	X	CONSOLIDACIÓN	
COMPLEMENTARIA		AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN		EQUIPAMIENTO	

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

MURO FRONTAL DEL TERRENO (ACCESO) POLICÍA MONTADA PIRULES

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:


BUEN ESTADO:	X	REGULAR:		PESIMO ESTADO:	

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA OPERARSE

PROCEDE	**SI:**	X	**NO:**		

ARQ. ARIADNA MEDINA DOMINGUEZ
SUPERVISOR

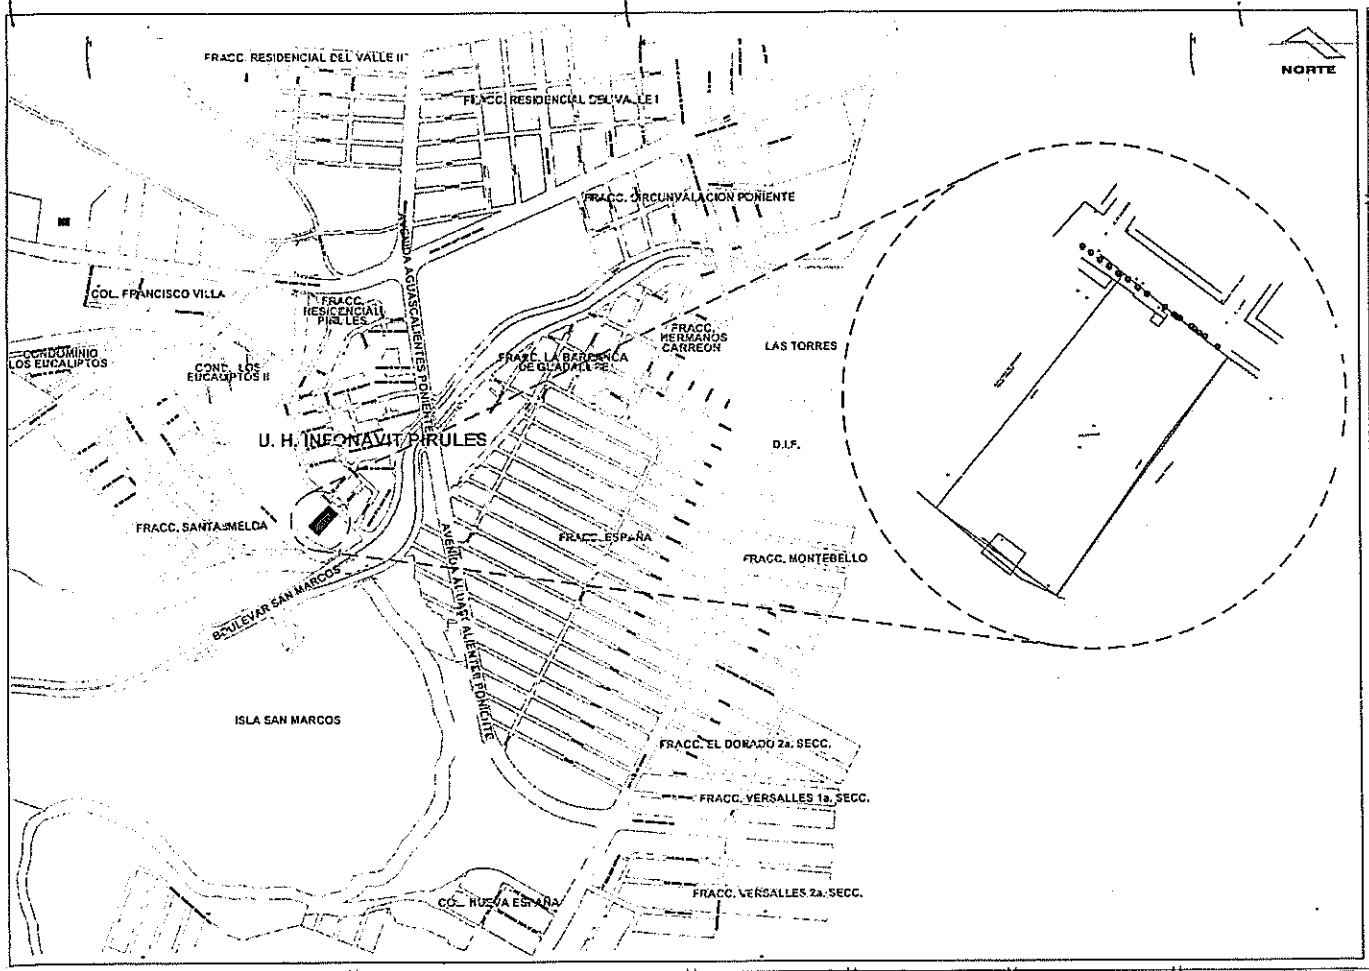

LOCALIZACION:



SIMBOLOGIA:

DIRECTOR DE PROYECTOS:
LUIS FERNANDO SERNA QUEZADA
JEFE DE DPTO. DE PROYECTOS
JOSE JULIAN SERNA QUEZADA

REV. | FECHA | OBSERVACIONES:

DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA

TITULO: MURO PERIMETRAL POLICIA MONTADA PIRULES


CONTENIDO: PLANO DE LOCALIZACION

UBICACION: C. AMAPOLA INFONAVIT LOS PIRULES

CLAVE: LOC-01

J.J. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

OM-0024-2022

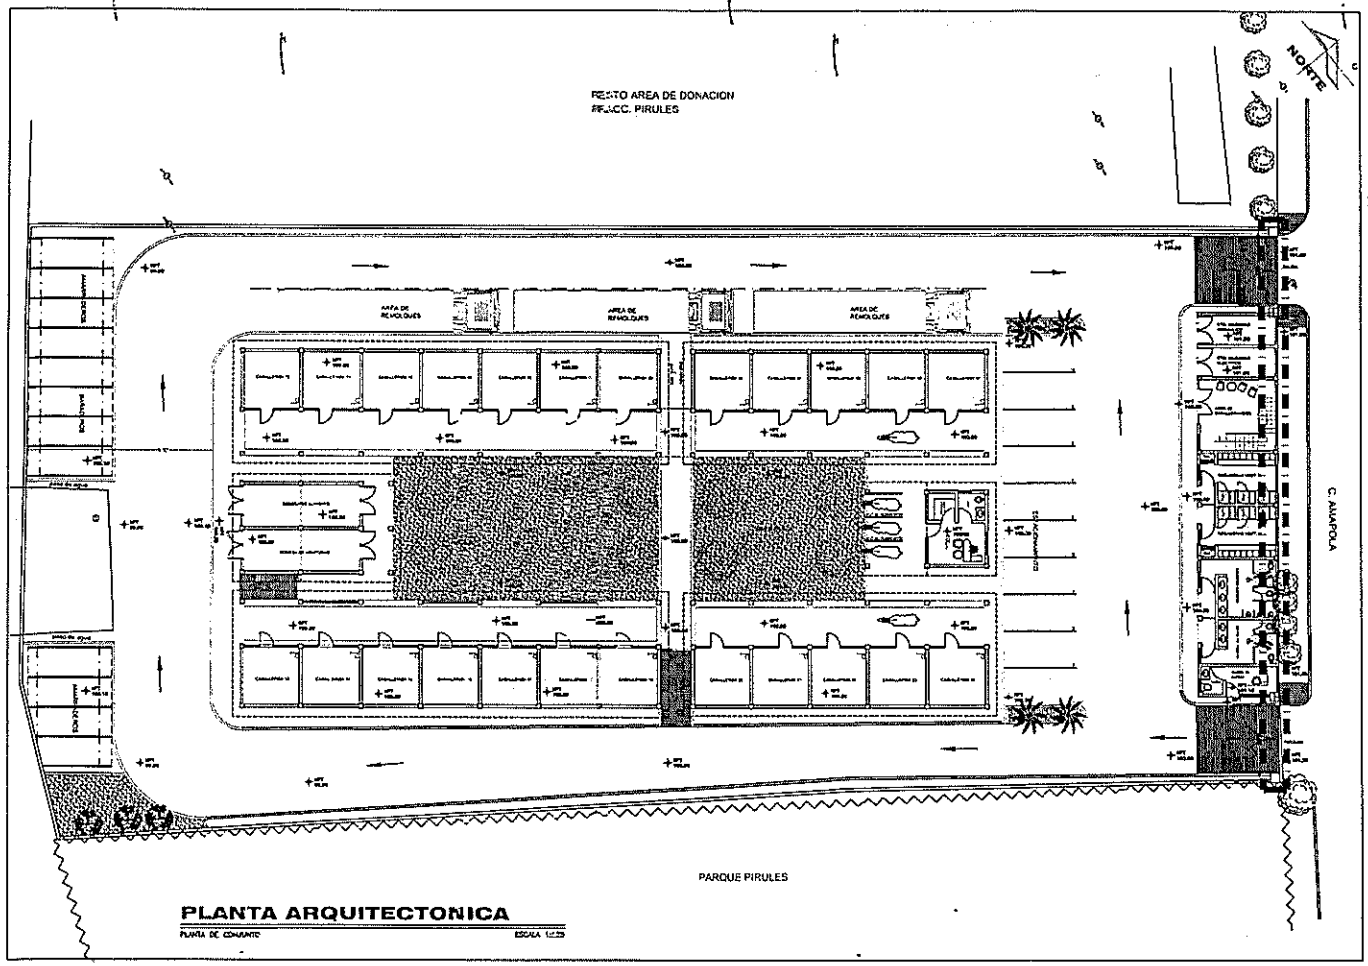

PLANTA ARQUITECTONICA

PLANTA DE CONJUNTO ESCALA 1:125

LOCALIZACION:



SIMBOLOGIA:

MURO FRONTAL

DIRECTOR DE PROYECTOS:
LUIS FERNANDO
SERNA QUEZADA

JEFE DE DPTO. DE PROYECTOS
JOSE JULIAN
SERNA QUEZADA

REV.	FECHA	OBSERVACIONES

DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA

TITULO:
MURO FRONTAL
POLICIA MONTADA PIRULES


CONTENIDO:
PLANTA DE CONJUNTO

UBICACION:
C. AMAPOLA
INFONAVIT LOS PIRULES

CLAVE:
PC-01

DM-0024-2022


NORTE

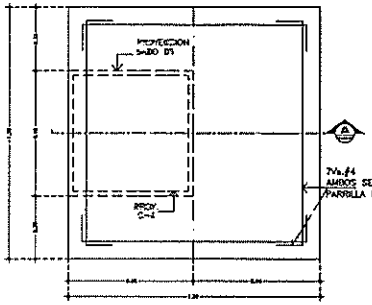


ZAPATA Z-1

PLANTA ESCALA 1:10


ZAPATA DE COLINDANCIA



DADO D-1




COLUMNA C-1




ZAPATA Z-2

PLANTA ESCALA 1:10

ZAPATA DE COLINDANCIA




DADO D-2



COLUMNA C-2

LOCALIZACION:



SIMBOLOGIA:

DIRECTOR DE PROYECTOS
LUIS FERNANDO SERNA QUEZADA

JEFE DEL DPTO. DE PROYECTOS
JOSE JULIAN SERNA QUEZADA

REV.	FECHA	OBSERVACIONES

DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA

TITULO: MURO FRONTAL DEL TERRENO ACCESO POLICIA MONTADA, PIRULES


CONTENIDO: DETALLE DADOS Y COLUMNAS

UBICACION: CAMPECHE

CLAVE: CIM-02


A.L. CONSTRUCCIONES SA DE CV

DM-0024-2022



CIMENTACION

MÓDULO DE ACCESO POLICÍA MONTADA ESCALA 1:50



ESTRUCTURA Y ALBAÑILERIA

MURO FACHADA PRINCIPAL ESCALA 1:75

NORTE


LOCALIZACION:



SIMBOLOGIA:

DIRECTOR DE PROYECTOS: LUIS FERNANDO SERNA QUEZADA JEFE DE DPTO. DE PROYECTOS JOSE JULIAN SERNA QUEZADA	REV.	FECHA	OBSERVACIONES	DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	TITULO: MURO FRONTAL POLICIA MONTADA PIRULES CONTENIDO PLANO DE ALBAÑILERIA CONJUNTO MURO PERIMETRAL UBICACION C. ERMOLA INFONAVIT LOS PIRULES	CLAVE: CIM-01

Dm-0024-2022

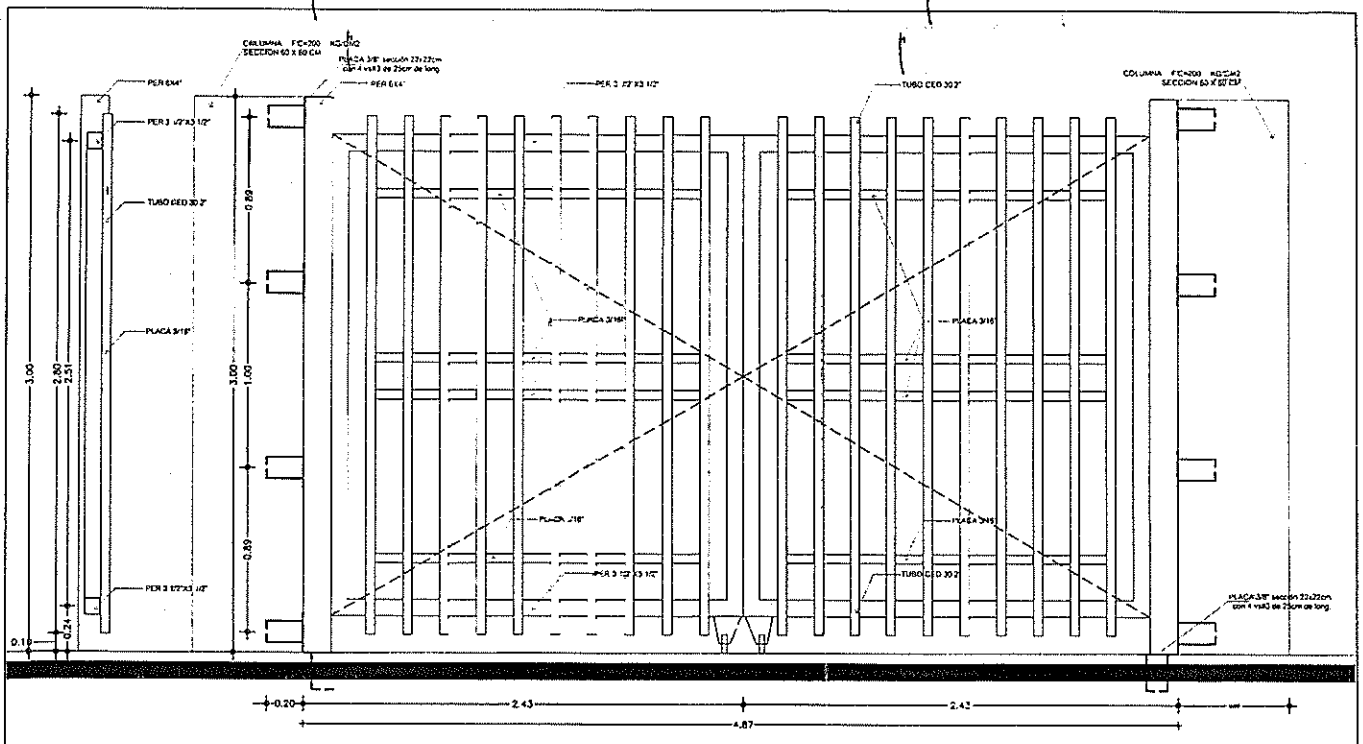

PUERTA ACCESO Y SALIDA

ALZADO ESCALA 1:10

CORTE

PUERTA DOBLE HOJA DE ACCESO. SECCION COMPLETA = 8.7x3.00 m DOS HOJAS ABATIBLES, MARCO DE PEP DE 3 1/2"x 3 1/2" SOPORTADO POR DOS POSTES VERTICALES DE 3.40 M. A CADA LADO SE PE: 6X4", TUBOS VERTICALES DE 2.80 M. DE TUBO DE ACERO NEGRO CED. 30 DE 1", @30cm. [A 2 LES] CON PARA DE LAMINA NEGRA CALIBRE 16 EN EXTREMO SUPERIOR, LOS TUBOS UNIDOS POR PLACAS DE 3/16" DE 150CM. DOS PUERTAS CHATORIAS 1M. EN CADA PUERTA, DE ACERO FUNDIDO PARA ALTA CARGA DE S'HASTA 300 KG FIJADA ANIMACIDAS PERZEN SU PARTE INFERIOR, 4 PLACAS EN CADA POSTE DE ACERO SECCION 22 x 22 cm DE 3/8" DE ESPESOR PARA RECIBIR PER DE 6X4" MEDIANTE SOLDADURA, ANCLADO A COLUMNA DE CONCRETO CON 4 VAS No.3 SE 25 cm DE LONGITUD EN CADA PLACA, PLACA DE ACERO SECCION 22 x 22 cm De 3/8" DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBO O CAJATABONES MEDIANTE SOLDADURA, ANCLADO A PISO CON 4 VARILLAS No.3 DE 25 cm DE LONGITUD.

LOCALIZACION:



SIMBOLOGIA:

DIRECTOR DE PROYECTOS:
LUIS FERNANDO
SERNA QUEZADA

JEFE DE DPTO. DE PROYECTOS
JOSE JULIAN
SERNA QUEZADA

REV. FECHA OBSERVACIONES:

DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA

TITULO DEL PROYECTO:
MURO FRONTAL DEL TERRENO (ACCESO) POLICIA MONTADA PIRULES

CONTENIDO:
PUERTA DE ACCESO Y SALIDA
DETALLE


UBICACION:
C. AMAPOLA
INFONAVIT LOS PIRULES

CLAVE:
DET-01

ESCALA: 1:10

AL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

jm-0024-2022

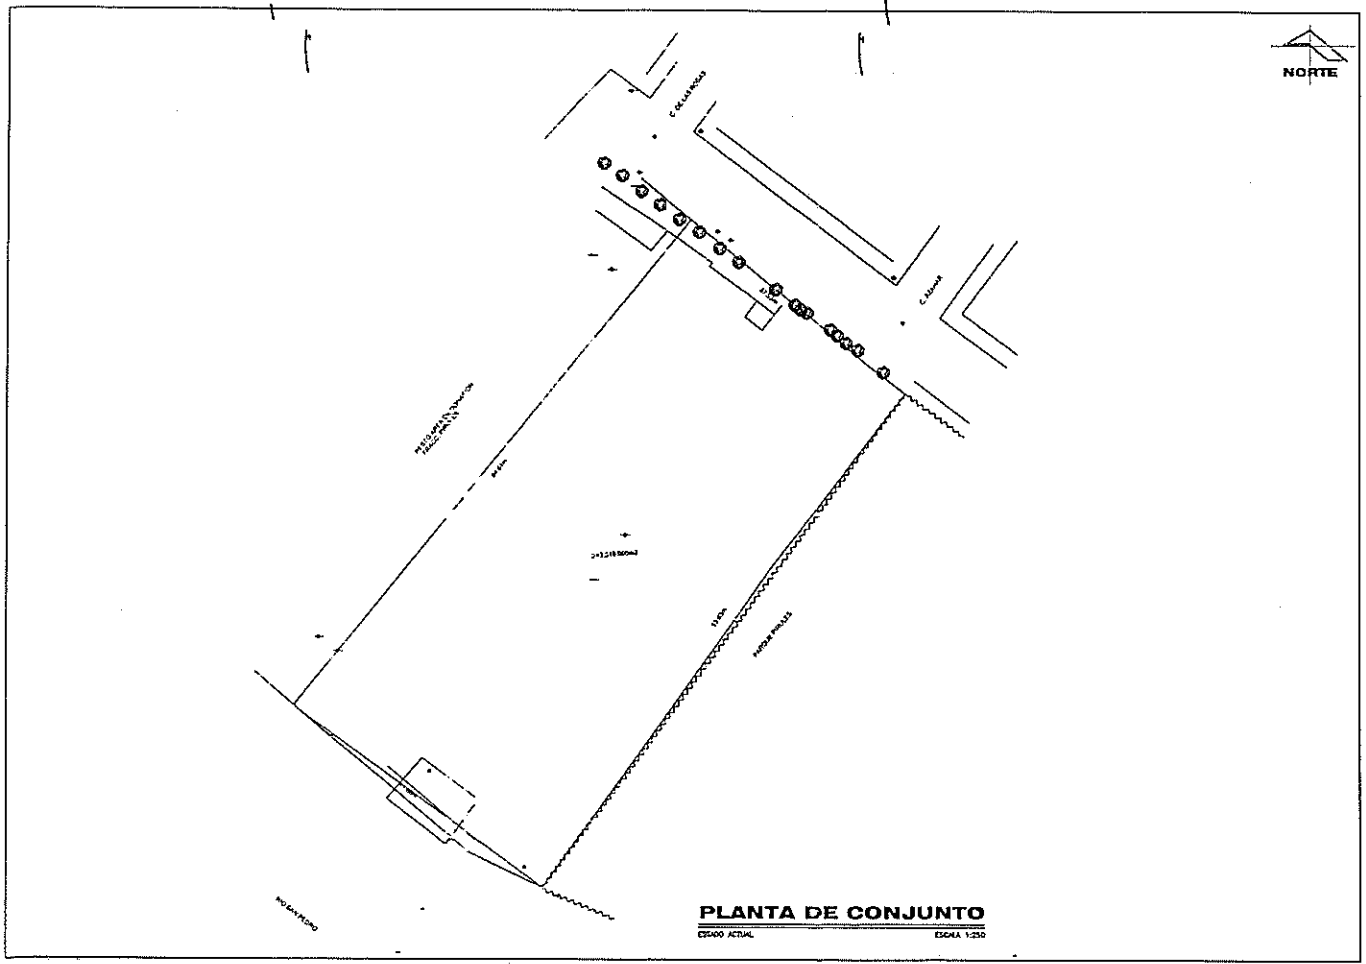

PLANTA DE CONJUNTO

ESTADO ACTUAL ESCALA 1:250

LOCALIZACION:



SIMBOLOGIA:

DIRECTOR DE PROYECTOS:
LUIS FERNANDO
SERNA QUEZADA

JEFE DE DPTO. DE PROYECTOS:
JOSE JULIAN
SERNA QUEZADA

REV.	FECHA	OBSERVACIONES

DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA

ESTUDIO:
MURO PERIMETRAL
POLICIA MONTADA PIRULES

CONTENIDO
PLANO DE ESTADO ACTUAL
PLANTA DE CONJUNTO


UBICACION:
C. ANAPOLA
PROLONGACION LOS PIRULES

CLAVE:
EA-01


ESCALA: 1:250

JM CONSTRUCCIONES SA DE CV


JM-0024-2022

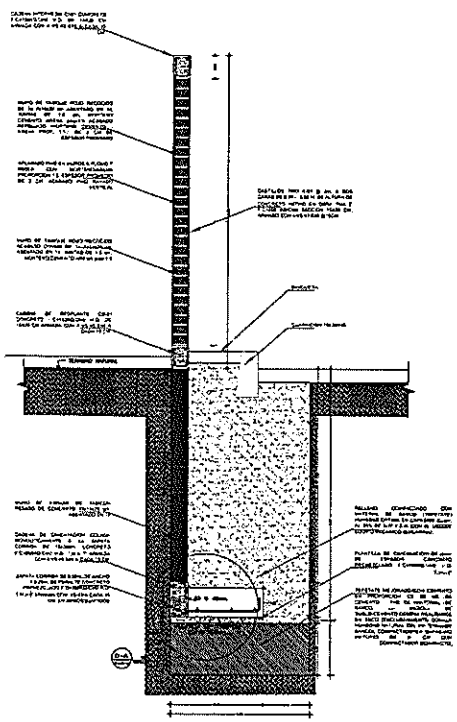

ZAPATA ZC-01

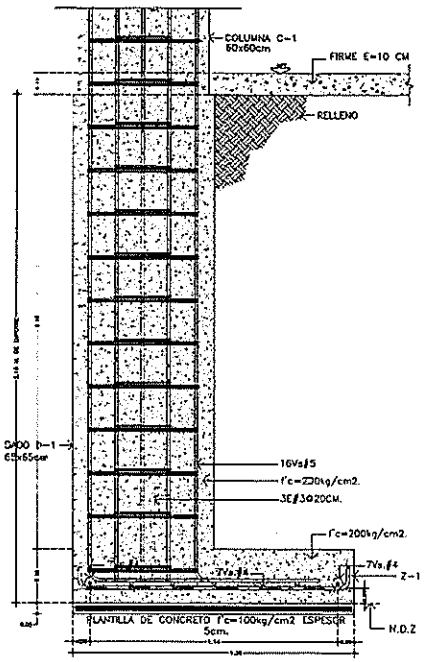

CORTE A
ESCALA 1:10 ACOT. m.

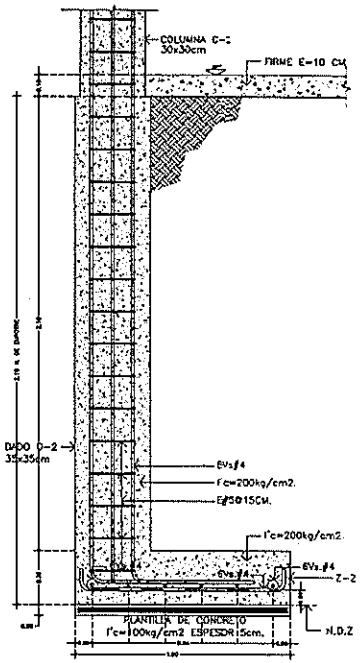

CORTE B
ESCALA 1:10 ACOT. m.

LOCALIZACION:



SIMBOLOGIA:

DIRECCION DE PROYECTOS
LUIS FERNANDO SERNA QUEZADA
JEFE DE DPTO. DE PROYECTOS
JOSE JULIAN SERNA QUEZADA

REV. FECHA OBSERVACIONES

DIRECCION DE FISCALIZACION Y PROYECTOS DE OBRA

TITULO
MURO PERIMETRA
POLICIA MONTADA PIXOLES

CONTENIDO
MURO FRONTAL
DETALLES

UBICACION
CAMPOL.
BOPOMOFO LOS PIXOLES

CLAVE:
CIM-03

DM-0024-2022
