Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

Dirección de Programación Presupuestal
Núm. Oficio AMPP/0663/22
Aguascalientes, Ags. 20 de Diciembre del 2022
Asunto: Validación de Expediente Técnico

C.P. SERGIO ARTURO LOZANO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 17 fracción XV, 60 fracción XVI y 76 fracción VI del Reglamento del Sistema Integral de Desarrollo Municipal y del Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes, hago referencia al oficio SOPMA/3014/2022 recibido por este Instituto el día 20 de Diciembre del 2022 por parte de la Secretaría de Obras Públicas Municipales, mediante el cual remiten el expediente técnico original de la siguiente obra para su análisis, registro y priorización, conforme al Programa Anual de Obra Pública y Programas Sociales para el ejercicio presupuestal 2022:

DEPENDENCIA EJECUTORA:	SOPMA
NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO:	SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO
UBICACIÓN:	AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA (CALZADA NORTE), TRAMO: ENTRE AV. GERÓNIMO DE LA CUEVA Y CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS, VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE, AGUASCALIENTES, AGS.
FONDO DE INVERSIÓN:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
IMPORTE:	$9,792,020.74 (ET FINAL)
No. DE OBRA:	2022-FISMDF-0076-04-1101
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
EJE:	MUNICIPIO SOBRESALIENTE
ESTRATEGIA:	OBRA PÚBLICA INTELIGENTE
POLITICA:	5.8.1.REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIALIDADES, CAMINOS, CALLES, ÁREAS DE TERRACERÍA Y CAUCES (C

Al respecto, hago de su conocimiento que dicho expediente ha sido analizado en su integración técnica y documental, con base en el artículo 168 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Asimismo, le comento que este Instituto valida dicha obra acorde a lo establecido en los artículos 14, 22 párrafo segundo y 23 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la cual se encuentra alineada al Plan de Desarrollo Municipal vigente, para dar cumplimiento a las metas establecidas en el mismo, y a los Lineamientos Generales para la Operación de este Fondo de Inversión, toda vez que la misma cuente con la autorización del CODEMUN. De igual manera, se hace de su conocimiento que deberá cumplir con lo establecido en los ordenamientos aplicables en lo que respecta al ejercicio, control e información de los recursos de este Fondo. Cabe hacer mención que los recursos solicitados para este proyecto de inversión, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal para el presente ejercicio fiscal que determine la Secretaría a su digno cargo. Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ARQ. AUSTRIA GABRIELA DÁVILA DE LA LLAVE
DIRECTORA GENERAL DEL IMPLAN

SEDR/ CAAR / JDBC
C.c.p. I.C. ING. MIGUEL ÁNGEL HUIZAR BOTELLO .- Secretaría de Obras Públicas Municipales. Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes

Antonio Acevedo Escobedo 103 A. Col. Centro
Aguascalientes. Ags. C.P. 20000

(449) 9101010 Ext. 3117

www.implanags.gob.mx

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

IMPLAN

ANÁLISIS INTEGRAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO

No. DE OBRA (PAOP 2020):	2022-FISMDF-0076-04-1101	REGISTRO No.	242
OFICIO DE VALIDACIÓN:	AMPP/0663/22	FECHA RECIBIDO PARA REVISIÓN:	20 de Diciembre del 2022
PROGRAMA:	URBANIZACION MUNICIPAL	LOCALIDAD O COLONIA:	VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GU
SUB-PROGRAMA:	0411- Calles y Caminos	DELEGACIÓN:	Pozo Bravo
DEPENDENCIA:	Secretaría de Obras Públicas Municipales	MOD. DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
NOMBRE DE LA OBRA:	SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO, AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA (CALZADA NORTE), TRAMO: ENTRE AV. GERÓNIMO DE LA CUEVA Y CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, FISMDF		
INVERSIÓN:	$9,792,020.74	CLASIFICACIÓN DE OBRA:	BIENES DE DOMINIO PUBLICA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	DIFERENCIA ENTRE MOD.
$9,792,020.74	$9,792,020.74	0.00	0.00	0.00	0.00	*-$592.019,27*

TIPO DE EXPENDIENTE:	ET FINAL	AÑO: 2022	AÑO:	AÑO:		
AVANCES:	Financiero: 100 %	Físico: 100 %				
FECHA DE INICIO.	10 de Septiembre del 2022	FECHA DE TÉRMINO:	8 de Diciembre del 2022	REGISTRO SIMA:	76	

CHEK LIST DE LOS ANEXOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

CÉDULA DE REGISTRO DE OBRA	✓
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	✓
MEMORIA DESCRIPTIVA	✓
PRESUPUESTO BASE	✓
FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES	✓
PLANOS O ESTUDIOS TÉCNICOS	✓
PADRÓN DE BENEFICIARIOS	N/A
ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO	N/A
DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL	N/A
CONVENIO DE CONCERTACIÓN	N/A
ACTA CONSTITUTIVA	N/A

METAS		BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		OBRA PROPUESTA		CLAVE SISCO
UNIDAD DE MEDIDA	CANT	TIPO DE BENEFICIARIOS	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	CONCEPTO	JORNALES A GENERAR	
M2	4719.66	Personas	360	2022-09-10	2022-12-08	Sobrecarpeta Asfáltica	25459	2347

INCLUIDO EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES

RECIBIO: ING. JOSÉ DAVID BURGUETE CLAUSTRO
Analista de Programación e Inversión de Obra Pública

20 de Diciembre del 2022
Fecha de validación

PROCEDE Si ✓ No

20 de Diciembre del 2022
Fecha de validación Expediente

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

CEDULA DE REGISTRO POR OBRA

Aguascalientes
SE CIUDAD DE TU VIDA

050400-001E00E05-05-2-2-1-00-1-E-0510-0-17-0076-21-2502-6144

2022 FISMDF 0076-0411102-031	Obra **SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA (CALZADA NORTE)**
Tipo DEFINITIVO 2 2022 Folio SISCO **2347**	Ubic. TRAMO: ENTRE AV. GERÓNIMO DE LA CUEVA Y CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS, VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE Fracc. 1a. Secc. , Deleg. Jesus Teran

Ent. Ejecutora : **050400001E00E05**

Eje: **05**	MUNICIPIO SOBRESALIENTE
Finalidad: **2**	DESARROLLO SOCIAL
Función: **2**	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Subfunción: **1**	URBANIZACIÓN
Tema: **00**	SIN TEMA
Cuenta del Gasto **1**	GASTO PROGRAMABLE
Clasif. Programatica: **E**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Programa: **0510**	Movilidad Urbana
SubPrograma: **0**	SUBPROGRAMA GENÉRICO
Proyecto: **17**	
Tipo de Gasto: **21**	GASTO INVERSIÓN / OBRA PÚBLICA

I N V E R S I O N 2022

Municipal	2502	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022	$9,792,020.74

Folio SIMA 76 Total $9,792,020.74

M E T A S

Unidad de Medida	Cantidad	Descripción
M2	4719.66	SOBRECARPETA ASFÁLTICA SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA (CALZADA NORTE)

Inversión Ejercida Total al	31 de Diciembre de 2021	$0.00
Avance Fisico Acumulado al	31 de Diciembre de 2021	
Avance Fisico Acumulado Programado al	31 de Diciembre de 2022	100 %

Fecha de Inicio 10 Sep 2022 Fecha de Terminación 08 Dic 2022

Jornales a Generar en 2022 25459

Modalidad de ejecución CONTRATO

Clasificación de la Obra Bienes de Dominio Público

Registro del Patrimonio: Obras del dominio público

OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

GENERALES

Nombre del Proyecto : SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA (CALZADA NORTE)

TRAMO: ENTRE AV. GERÓNIMO DE LA CUEVA Y CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS, VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE Fracc. 1a. Secc. , Deleg. Jesus Teran

Programa : 04 URBANIZACION MUNICIPAL

Subprograma : 11 Calles y caminos (422.- Rehabilitación: 0411202- Concreto Asfáltico)

Clave del Municipio : AGUASCALIENTES

Localidad :

Barrio, Colonia o Ejido : VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE Fracc. 1a. Secc.

Tipo de Obra : NUEVA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA (CALZADA NORTE)

EXTRAORDINARIOS:
- FRESADO 408.78 M3
- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 2,546.37 M2
- CONCRETO ASFÁLTICO 4,719.66 M2
- RENIVELACIÓN DE RASANTES 13.00 PZAS
- SEÑALAMIENTO 1.00 OBRA
- TUBERÍA DE AGUA POTABLE 493.00 ML
- BANQUETAS 771.34 M2

OBRAS PÚBLICAS

Beneficiarios (No. y Tipo) :

360	PERSONAS

Hombres: 162 Mujeres: 198

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

Los abajo firmantes, hacen constar que el presente proyecto :

SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA (CALZADA NORTE)

TRAMO: ENTRE AV. GERÓNIMO DE LA CUEVA Y CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS, VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE Fracc. 1a. Secc. , Deleg. Jesus Teran

cumple con los Requisitos y Normas Técnicas establecidas por la Dependencia Normativa, por lo que es viable su ejecución. Comprometiéndose la misma a proporcionar la supervisión y asistencia técnica necesaria durante el proceso administrativo.

Por la Dependencia Ejecutora

Ing. Miguel Angel Huizar Botello
Secretario de Obras Públicas

Lic. Jaime Gallo Camacho
Secretario de Desarrollo Urbano

LUGAR :AGUASCALIENTES, AGS.

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

No. Folio SISCO 2347

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

LOCALIZACION: TRAMO: ENTRE AV. GERÓNIMO DE LA CUEVA Y CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS, VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE Fracc. 1a. Secc. , Deleg. Jesus Teran

PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL

SUBPROGRAMA: Calles y caminos (422.- Rehabilitación: 0411202- Concreto Asfáltico)

OBRA A REALIZAR: SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA (CALZADA NORTE)

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

FORMA DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA: NUEVA

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA (CALZADA NORTE)

CARACTERISTICAS DE LA OBRA: Bueno

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE REQUIERE PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

PROCEDE: SI [X] NO [ ]

REVISÓ: Jefa del Departamento de Expedientes Tecnicos y Costos

NOMBRE: Arq. Blanca Margarita Martinez Amador

FIRMA:

FECHA: 22 Dic 2022

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx


No. Folio SISCO 2347

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MACRO LOCALIZACIÓN

APROBACIÓN	**2022-FISMDF-0076-0411102-031**
NOMBRE DE LA OBRA:	**SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA (CALZADA NORTE)**
UBICACIÓN:	**TRAMO: ENTRE AV. GERÓNIMO DE LA CUEVA Y CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS, VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE Fracc. 1a. Secc.**
PROGRAMA:	**04 - URBANIZACIÓN MUNICIPAL**

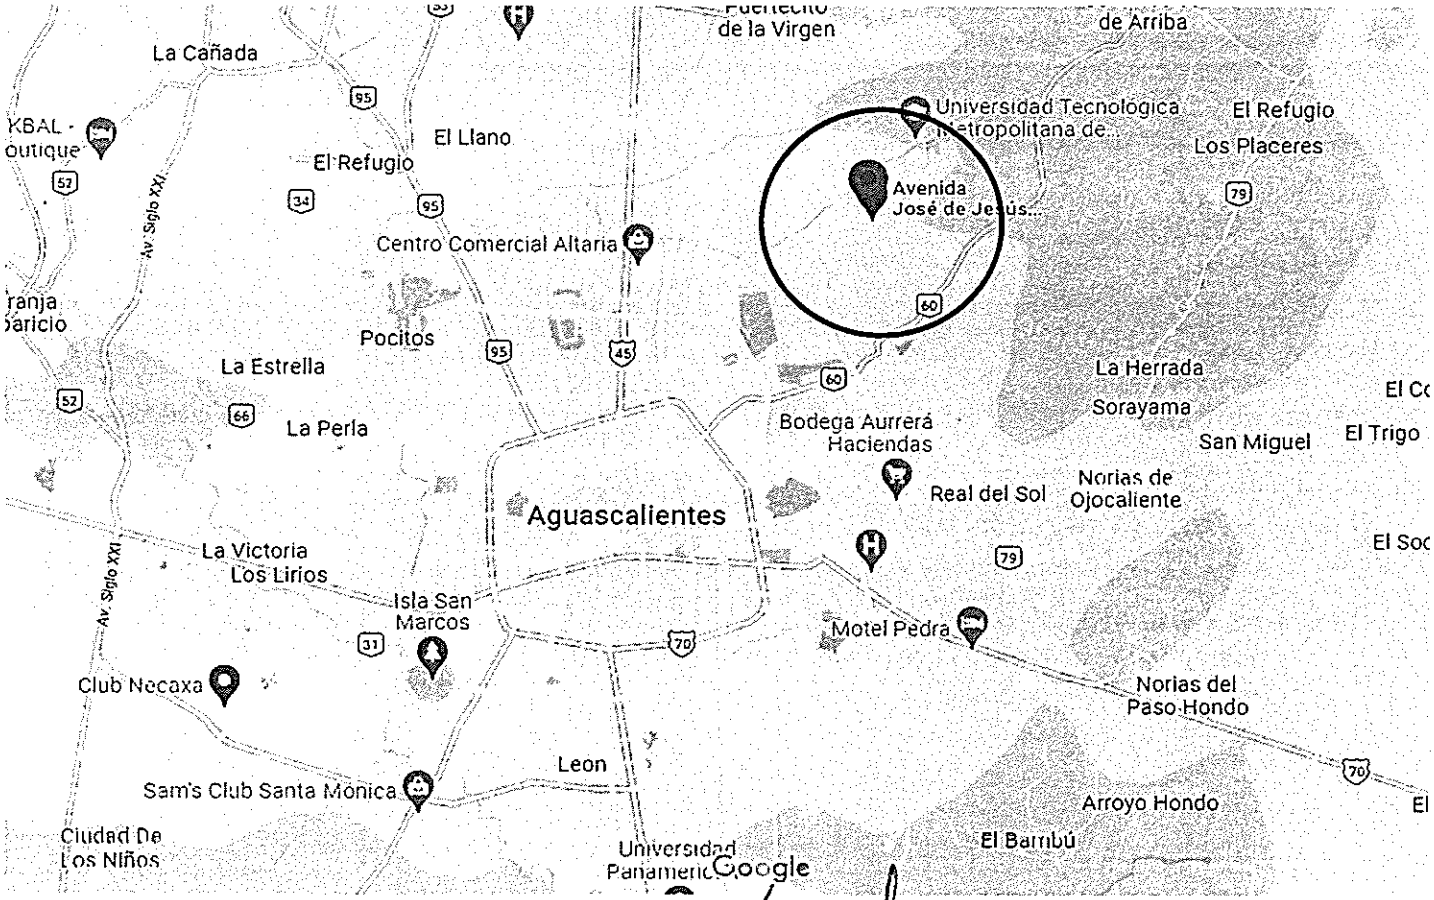

I.C. LAURA CECILIA MARTÍNEZ ALBA
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021 2024

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MICRO LOCALIZACIÓN

APROBACIÓN	**2022-FISMDF-0076-0411102-031**
NOMBRE DE LA OBRA:	**SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA (CALZADA NORTE)**
UBICACIÓN:	**TRAMO: ENTRE AV. GERÓNIMO DE LA CUEVA Y CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS, VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE Fracc. 1a. Secc.**
PROGRAMA:	**04 - URBANIZACIÓN MUNICIPAL**



I.C. LAURA CECILIA MARTÍNEZ ALBA
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

PROGRAMA DE OBRA DEFINITIVO

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

No. DE CONTRATO : FISMDF-0076-2022

PROGRAMA: 04 - URBANIZACIÓN MUNICIPAL

No. OBRA Y NOMBRE DE LA OBRA: 2022-FISMDF-0076-0411102-031 SOBRECARPETA ASFALTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA (CALZADA NORTE), TRAMO: ENTRE AV. GERÓNIMO DE LA CUEVA Y CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS, VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE Fracc. 1a. Secc.

INICIO VIGENTE: 10-septiembre-22

TERMINO REAL: 08-diciembre-22

CONCEPTO			RECURSO	2022																				PONDERACIÓN %	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					FINANCIERO	FÍSICO
				2022																					
				OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO							
DESCRIPCION		INVERSIÓN													10			8						%	%
SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA (CALZADA NORTE)																									
TRAMO: ENTRE AV. GERÓNIMO DE LA CUEVA Y CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS																									
DEMOLICIONES Y DESMONTAJES	$	-																							
PRELIMINARES	$	-																							
EXCAVACIONES, ACARREOS Y TER	$	-																							
PAVIMENTO HIDRÁULICO	$	-																							
DENTELLONES DE CONCRETO	$	-																							
BACHEO PROFUNDO	$	-																							
SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	$	-																							
EXTRAORDINARIOS	$	647,598.64	100												50 25									7.67	10.53
EXTRAORDINARIO	$	3,466,938.37	100												25 25 25 25									41.07	21.05
EXTRAORDINARIOS	$	2,724,206.64	100													25 25 25 25								32.27	21.05
EXTRAORDINARIO	$	423,859.10	100														25 25 25 25							5.06	21.05
EXTRAORDINARIOS	$	863,663.60	100															50 25 25						10.23	15.79
EXTRAORDINARIOS	$	312,065.74	100															25 25 50						3.70	10.53
		-																							
SUBTOTAL SIN IVA	$	8,441,397.28		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 2 2 1	2 1 1 2	1 1 2 2	2 0 0 0	0 0 0 0							
AVANCE SEMANAL %				0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 11% 11% 11%	11% 6% 6% 11%	6% 6% 11% 11%	11% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%							
AVANCE SEMANAL ACUMULADO %				0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 11% 21% 32%	37% 42% 47% 58%	63% 69% 79% 90%	90% 90% 90% 90%	90% 90% 90% 90%					100.00	100.0
EJERCIDO SEMANAL $				- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	1,100,533.91 1,100,533.91 865,734.59	1,547,661.75 681,007.16 681,007.16 787,781.95	105,711.79 105,711.79 536,546.62 371,950.28	371,950.28 - - -	- - - -					$ 8,441,397.20	
EJERCIDO MENSUAL $				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,247,802.42	$3,997,718.02	$1,123,909.68	$371,950.28	$0.00					$ 1,350,023.56	IVA 16
EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO $				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,247,802.42	6,945,520.44	8,069,446.92	8,441,397.20	8,441,397.20						
EJERCIDO SEMANAL %				0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%							
EJERCIDO MENSUAL %				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	38%	44%	13%	4%	0%					GRAN TOTAL EJERCIDO	
EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO %				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	38%	82%	95%	100%	100%					$ 9,792,020.76	

ING. LAURA CECILIA MARTÍNEZ ZAVALA
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

GENERALES

LOCALIDAD: SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA (CALZADA NORTE), TRAMO: ENTRE AV. GERÓNIMO DE LA CUEVA Y CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS, VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE Fracc. 1a. Secc.

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

PROGRAMA: 04 - URBANIZACIÓN MUNICIPAL

SUB-PROGRAMA:

OBRA A REALIZARSE: SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA (CALZADA NORTE)

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)

FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA

NUEVA CREACIÓN		CONSOLIDACIÓN	
COMPLEMENTARIA		AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN	X	EQUIPAMIENTO	

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA (CALZADA NORTE)

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

BUEN ESTADO	X	REGULAR		PESIMO ESTADO	

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

SE HACE ENTREGA DE LA OBRA DE ACUERDO A LAS METAS INICIALES, ATENDIENDO EL CONTRATISTA LOS DETALLES MARCADOS PREVIOS A LA ENTREGA.

PROCEDE SI X NO

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

I.C. LAURA CECILIA MARTINEZ ALBA
SUPERVISOR

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

GENERALES

EJERCICIO:	2022 APROBACION No: 2022-FISMDF-0076-0411102-031
LOCALIDAD:	TRAMO: ENTRE AV. GERÓNIMO DE LA CUEVA Y CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS, VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE Fracc. 1a. Secc.
MUNICIPIO:	AGUASCALIENTES, Mpio.
TIPO DE INVERSION	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
PROGRAMA:	04 URBANIZACION MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA:	
OBRA A REALIZARSE:	SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA (CALZADA NORTE)

DEPENDENCIA EJECUTORA:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)			
FORMACIÓN DE EJECUCION:	CONTRATO	NO. DE CONTRATO.	FISMDF-0076-2022	
NOMBRE CONTRATISTA:	GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V.			
REPRESENTANTE:	FRAUSTO DÍAZ, CARLOS DAVID, LIC.			
MONTO CONT. ORIGEN	$9,200,001.47	ANTICIPO:	$2,760,000.44	PLAZO 90 DÍAS
1A AMPLIACION $:	$ 592,019.27	1 AMPL DIAS		
2A AMPLIACION $:		2 AMPL DIAS		
FIRMA CONTRATO:	31/08/2022			
INICIO CONT: dd/mm/aa	01/09/2022	TERMINO CONT:	29/11/2022	
INICIO REAL: dd/mm/aa	10/09/2022	TERMINO REAL:	08/12/2022	

TIPO DE OBRA PROPUESTA

NUEVA CREACIÓN		CONSOLIDACIÓN	
COMPLEMENTARIA		AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN	X	EQUIPAMIENTO	

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO
COLOCACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO
PINTURA TERMOPLÁSTICA
VIALETAS SOLARES, VIALETAS ESTÁNDAR

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA: (SELECCIONAR UNO OBLIGATORIO)

BUEN ESTADO	X	REGULAR		PESIMO ESTADO	

FACTIBILIDAD DE LA OBRA: (CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA)

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA OPERARSE

PROCEDE: MARQUE SOLO UNA	SI:	X	NO:

I.C. LAURA CECILIA MARTÍNEZ ALBA
SUPERVISOR

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS


DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


MEMORIA FOTOGRÁFICA


OBRA:	SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA (CALZADA NORTE), TRAMO: ENTRE AV. GERÓNIMO DE LA CUEVA Y CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS, VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE Fracc. 1a. Secc.		
NO. DE CONTRATO:	FISMDF-0076-2022	CONTRATISTA:	GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V.

INICIO

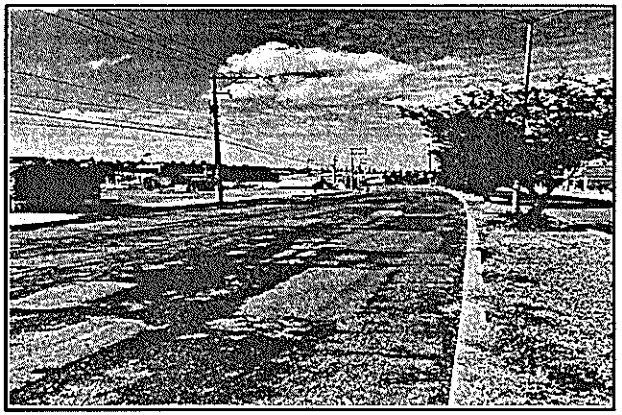

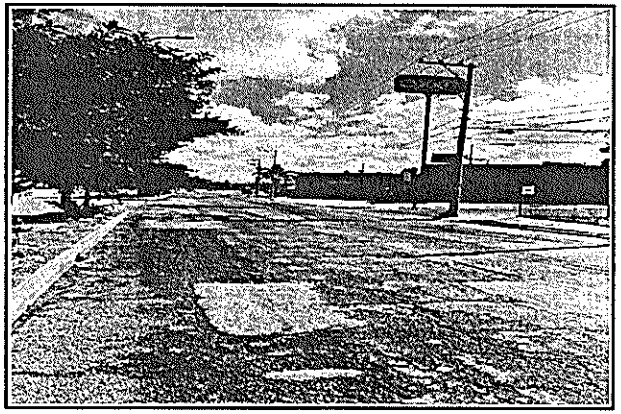

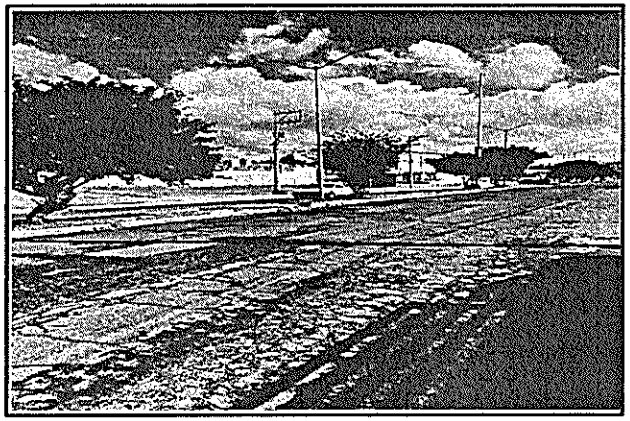

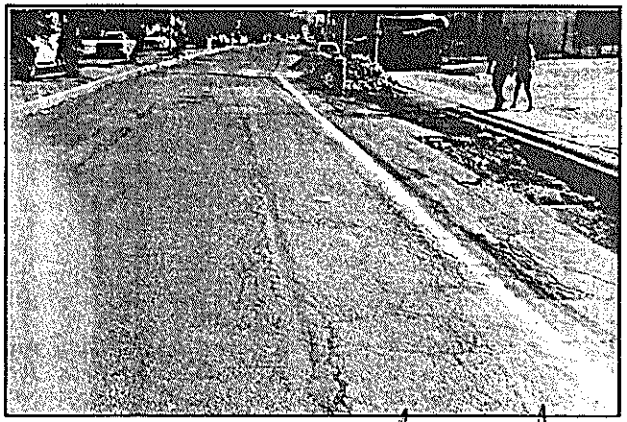

I.C. LAURA CECILIA MARTINEZ ALBA
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS


DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU Y DA


MEMORIA FOTOGRÁFICA


OBRA:	SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA (CALZADA NORTE), TRAMO: ENTRE AV. GERÓNIMO DE LA CUEVA Y CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS, VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE Fracc. 1a. Secc.		
NO. DE CONTRATO:	FISMDF-0076-2022	CONTRATISTA:	GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V.

PROCESO

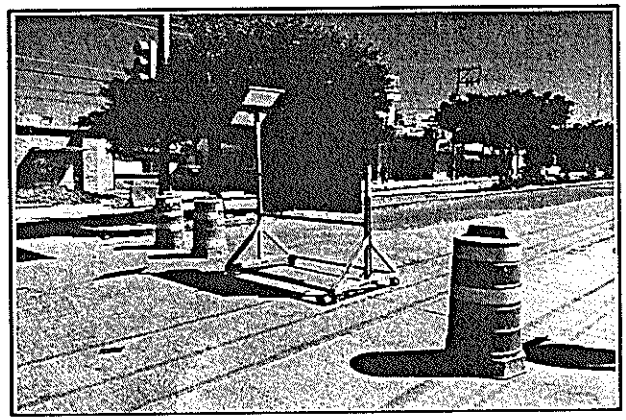

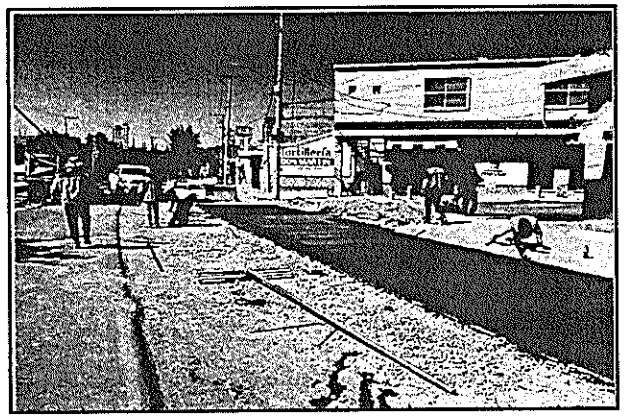

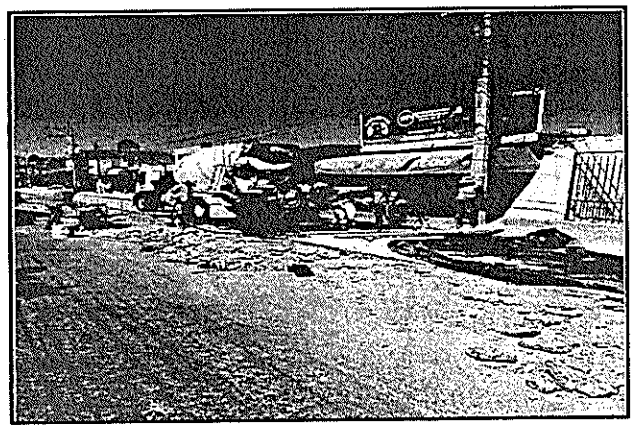

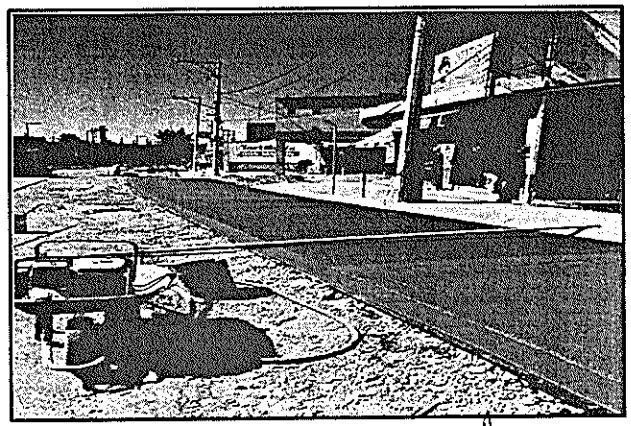

LIC. LAURA CECILIA MARTINEZ ALBA
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MEMORIA FOTOGRÁFICA


OBRA:	SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA (CALZADA NORTE), TRAMO: ENTRE AV. GERÓNIMO DE LA CUEVA Y CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS, VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE Fracc. 1a. Secc.		
NO. DE CONTRATO:	FISMDF-0076-2022	CONTRATISTA:	GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V.

FINAL







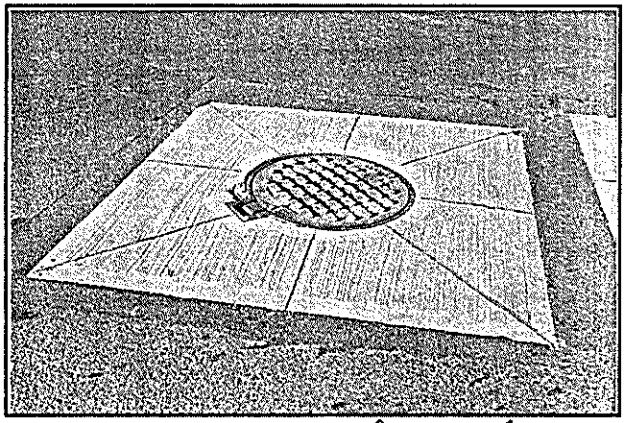

I.C. LAURA CECILIA MARTINEZ ALBA
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

EXPEDIENTE MODIFICADO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

EJERCICIO: 2022

N° DE CONTRATO: FISMDF-0076-2022

NOMBRE DE LA OBRA: SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. JOSE DE JESUS GONZÁLEZ GARCÍA (CALZADA NORTE), TRAMO: ENTRE AV. GERÓNIMO DE LA CUEVA Y CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS, VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE Fracc. 1a. Secc.

MONTO MODIFICADO FINAL: $9,792,020.74

VOLUMEN	UNIDAD	COMPONENTE DE LA OBRA	MONTO
408.78	M3	FRESADO UNIFORME DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN PAVIMENTO	$ 647,598.64
2546.37	M2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO	$ 3,466,938.37
4719.66	M2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE	$ 2,724,268.64
9.00	PZA	RENIVELACIÓN DE RASANTE (PARTE SUPERIOR) DE CAJA DE VÁLVULAS	$ 426,859.16
1100.00	M2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE " EN RAYA	$ 863,663.65
771.34	M2	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE	$ 312,068.74

MONTO BASE: $ 8,441,397.20

IVA: $ 1,350,623.55

TOTAL: $ 9,792,020.74

I.C. Laura Cecilia Martínez Alba
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

PRESUPUESTO MODIFICADO

Aguascalientes

Definitivo (2)
22, Diciembre '2

Obra: SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA (CALZADA NORTE)

Ubicación: TRAMO: ENTRE AV. GERÓNIMO DE LA CUEVA Y CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS, VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE Fracc. 1a Secc.

Contratista: GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V. (1010)

Grupo	Partida	Importe
PRELIMINARES		
	DEMOLICIONES Y DESMONTAJES	$0.00
	Subtotal por Grupo	**$0.00**
PAVIMENTO HIDRAULICO		
	PRELIMINARES	$0.00
	EXCAVACIONES, ACARREOS Y TERRACERIAS	$0.00
	PAVIMENTO HIDRAULICO	$0.00
	DENTELLONES DE CONCRETO	$0.00
	Subtotal por Grupo	**$0.00**
PAVIMENTO ASFALTICO		
	BACHEO PROFUNDO	$0.00
	SOBRE CARPETA ASFALTICA	$0.00
	Subtotal por Grupo	**$0.00**
EXTRAORDINARIO		
	EXTRAORDINARIOS	$647,598.64
	EXTRAORDINARIO	$3,466,938.37
	EXTRAORDINARIOS	$2,724,268.64
	EXTRAORDINARIO	$426,859.16
	EXTRAORDINARIOS	$863,663.65
	EXTRAORDINARIO	$312,068.74
	Subtotal por Grupo	**$8,441,397.19**

Totales Presup.		**$8,441,397.19**
Anticipo	+	**$2,379,310.72**
Amortizac. Ant.	-	**$2,379,310.72**
SubTotal. Ant.	=	**$8,441,397.18**
IVA	+	**$1,350,623.56**
Total	=	**$9,792,020.74**

PRESUPUESTO MODIFICADO

Obra: SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA (CALZADA NORTE)

Ubicación: TRAMO: ENTRE AV. GERÓNIMO DE LA CUEVA Y CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS, VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE Fracc 1a Secc

Contratista. **GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V. (1010)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **PRELIMINARES**				
	PARTIDA: **DEMOLICIONES Y DESMONTAJES**				
1	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN PAVIMENTOS, CALLES Y VIALIDADES CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: EJES, BANCO DE NIVEL, RENIVELACIONES LAS VECES NECESARIAS, CORRECCION DE RASANTE A PUNTOS OBLIGADOS (AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION), ESTACAS, VARILLAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPO DE PRECISION CALIBRADO, TRABAJO TERMINADO.P.U.O.T.	M2	0	$4.62	$0.00
2	CORTE CON DISCO DIAMANTADO DE 14" EN PISOS DE CONCRETO ASFALTICO DE HASTA 8.00 cm. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: TRAZO, EQUIPO Y OPERACION, LIMPIEZAS.	ML	0	$31.01	$0.00
5	FRESADO UNIFORME DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO 5-7 CM (6 cm de espesor promedio) MEDIANTE FRESADORA EN FRIO COMPACTA, EQUIPADA CON BANDA TRANSPORTADORA PARA CARGA DIRECTA SOBRE CAMION DE VOLTEO, INCLUYE: TRAMO DE PRUEBA AL INICIO DEL FRESADO PARA AUTORIZACION DE SUPERVISION (SUPERFICIE FRESADA UNIFORME Y SIN PROTUBERANCIAS NI ONDEOS), ACARREOS LOCALES, CARGA Y ACARREO A KM SUBSECUENTES (11 A 15 KM APROX) DE MATERIAL PRODUCTO DEL FRESADO DE CARPETA ASFALTICA EL TRASLADO SERA A PARQUE DE MAQUINARIA DE LA SOPMA, PIEZAS DE DESGASTE, COMBUSTIBLES, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, CUALQUIER VOLUMEN Y AREA,EQUIPO NECESARIO, LIMPIEZA FINA Y GRUESA, TRABAJO TERMINADO.	M3	0	$954.96	$0.00
				Totales por Partida	**$0.00**
				Totales por Grupo	**$0.00**

Obra: SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA (CALZADA NORTE)

Ubicación: TRAMO: ENTRE AV. GERÓNIMO DE LA CUEVA Y CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS, VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE Fracc 1a Secc

Contratista: GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V. (1010)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **PAVIMENTO HIDRAULICO**				
	PARTIDA: **PRELIMINARES**				
9	SONDEO A MANO O A MAQUINA PARA LOCALIZACION DE TUBERIAS CUALQUIER PROFUNDIDAD Y MATERIAL PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICO SANITARIAS CUIDANDO NO DAÑARLAS PARA NO INTERFERIR EN LOS SERVICIOS, INCLUYE: EXCAVACION, EQUIPO, MANO DE OBRA, REPORTE A LA SUPERVISION, RELLENOS, COMPACTACIONES, TRABAJO TERMINADO.	SONDE	0	$1,657.55	$0.00
			Totales por Partida		**$0.00**
	PARTIDA: **EXCAVACIONES, ACARREOS Y TERRACERIAS**				
10	EXCAVACION EN CORTE CON MAQUINA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 80 CM, EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DE MATERIAL, ACARREOS AL LUGAR DE ACOPIO PARA SU CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	0	$30.63	$0.00
11	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% DE SU P.V.S.M EN SU COMPACTACION., INCLUYE ESCARIFICADO, TENDIDO, HOMOGENIZADO, HUMEDECIDO OPTIMO NIVELADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM, CALIDAD Limite liquido máximo 50%, Valor de Soporte California (CBR) mínimo 15%, Expansión máxima 5%, Grado de Compactación minimo 90% ± 2, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M2	0	$5.45	$0.00
12	FORMACION Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE, CON EL USO DE EQUIPO MAYOR, HASTA ALCANZAR EL 100% AASHTO MODIFICADA. EN CAPAS DE 20 CM MAXIMO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON LA NORMA, HUMEDAD OPTIMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, EL MATERIAL DEBERA CUMPLIR CON UN C.B.R. DEL 60% PARA LO CUAL EL CONTRATISTA DEBERA PROPONER UN BANCO DE MATERIAL Y UN FRENTE, DEBERA PRESENTAR EL ESTUDIO DE CALIDAD QUE AVALE EL CUMPLIMIENTO AL 100 % DE LA NORMA Y DEMAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS, P.U.O.T.	M3	0	$317.78	$0.00
13	FORMACION Y COMPACTACION DE SUB-BASE PARA MAS DE UN MILLON DE EJES EQUIVALENTES, CON EL USO DE EQUIPO MAYOR, HASTA ALCANZAR EL 100% AASHTO MODIFICADA. EN CAPAS DE 20 CM MAXIMO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON LA NORMA, HUMEDAD OPTIMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, EL MATERIAL DEBERA CUMPLIR CON UN C.B.R. DEL 60% PARA LO CUAL EL CONTRATISTA DEBERA PROPONER UN BANCO DE MATERIAL Y UN FRENTE, DEBERA PRESENTAR EL ESTUDIO DE CALIDAD QUE AVALE EL CUMPLIMIENTO AL 100 % DE LA NORMA N-CMT-4-02-001. Y DEMAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS, P.U.O.T.	M3	0	$402.34	$0.00
14	FORMACION Y COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA PARA MAS DE UN MILLON DE EJES EQUIVALENTES DE 20 CMS. DE ESPESOR, PARA CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO, CON MATERIAL 100% TRITURADO (SOLAMENTE) 1 1/2" A FINOS QUE CUMPLA CON LA NORMA COMPACTADA AL 100 % DE PRUEBA AASHTO. COMBINANDO COMPACTADOR DE RODILLO EN BAJA Y MUERTO Y LLANTEO CON EQUIPO PESADO (CAMION DE VOLTEO CARGADO AL MAXIMO), INCLUYE HOMOGENEIZADO, TENDIDO, COMPACTADO, E INCORPORACION DE AGUA HASTA ALCANZAR LA HUMEDAD OPTIMA Y NIVELACIONES.	M3	0	$595.21	$0.00
15	CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO AL 1er. KM, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	0	$51.19	$0.00
			Totales por Partida		**$0.00**

Obra: SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA (CALZADA NORTE)

Ubicación: TRAMO: ENTRE AV. GERÓNIMO DE LA CUEVA Y CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS, VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE Fracc. 1a. Secc.

Contratista: GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V. (1010)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **PAVIMENTO HIDRAULICO**				
	PARTIDA: **PAVIMENTO HIDRAULICO**				
17	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KG/CM2 TMA 1 1/2" GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 6 A 8 CM FRAGUADO NORMAL DE 20 CM DE ESPESOR MODULADO EN LOSAS DE 3.5 MTS. (ANCHO) X 3.5 MTS (LARGO) COMO MAXIMO, CON CORTES EN LAS LOSAS DE 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA (7 CM) Y SELLADO CON MATERIAL ELASTOMERICO Y TIRA PREFORMADA EN JUNTAS Y CORTES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES COLA DE RATA DE 1/8", ASI COMO EL APROCHE CON GUARNICION Y DENTELLON. INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO CON INMERSION Y REGLA VIBRATORIA, DESCIMBRADO, REGLEADO FINAL, ACABADO CEPILLO DE ALUMINIO Y CON DOBLADOR, CALAFATEO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, P.U.O.T.	M2	0	$619.28	$0.00
			Totales por Partida		**$0.00**
	PARTIDA: **DENTELLONES DE CONCRETO**				
19	EXCAVACION A MANO CON PICO Y PALA EN MATERIAL TIPO II, EN SECO O PRESENCIA DE AGUA, INCLUYE. CORTE DE RAIZ DE CUALQUIER TAMAÑO Y GROSOR, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 40 CM DESPUES DE DESMONTE, DESPALME Y/O DEMOLICION DE SUPERFICIE O ELEMENTO ESTRUCTURAL O DE ACABADO, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, SIN DAÑAR AREAS ALEDAÑAS, CARGA Y ACARREO A TIRADERO OFICIAL, CONSERVACION DE LA MISMA, TRABAJO TERMINADO, LIMPIEZAS.	M3	0	$280.23	$0.00
22	CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO AL 1er. KM, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	0	$51.19	$0.00
23	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES, AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MAS CERCANO AUTORIZADO POR LA SUPERVISION, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3-KM	0	$8.32	$0.00
24	CONSTRUCCION DE DENTELLON RECTO Y/O CURVO 20-20X40 CM DE SECCION, CON CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KGF/CM2, TMA 1 1/2", R.R 3 DIAS. REVENIMIENTO NORMAL DE 10+-2 CM, GRAVA TRITURADA, ACABADO CON DOBLADOR Y PULIDO. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, , Y CURADO CON MEMBRANA QUIMICA APLICADA CON ASPERSOR Y LIMPIEZA, REMATE CON PAVIMENTO EXISTENTE DEL MISMO MATERIAL Y TIPO, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	ML	0	$350.31	$0.00
			Totales por Partida		**$0.00**
			Totales por Grupo		**$0.00**

Obra: **SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA (CALZADA NORTE)**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE AV. GERÓNIMO DE LA CUEVA Y CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS, VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE Fracc. 1a. Secc.**

Contratista: **GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V. (1010)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **PAVIMENTO ASFALTICO**				
	PARTIDA: **BACHEO PROFUNDO**				
31	BACHEO PROFUNDO AISLADO UTILIZANDO MATERIAL CALIDAD BASE HIDRAULICA PARA MAS DE UN MILLON DE EJES EQUIVALENTES DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA, INCISO N.CSV.CAR.1.02.004/03 DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARR. DE LA SCT, INCLUYE: PREPARACION, PERFILADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO NECESARIO QUE SE REQUIERA PARA LOGRAR LA COMPACTACION DE 100% PVSM, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, PREPARACION DE MATERIAL, HUMEDECIDO, NIVELADO, TRASLADO DE UN PUNTO A OTRO DENTRO DE LA OBRA, EN CUALQUIER VOLUMEN, MOVIMIENTO DE MAQUINARIA P.U.O.T	M3	0	$1,174.17	$0.00
				Totales por Partida	**$0.00**
	PARTIDA: **SOBRE CARPETA ASFALTICA**				
34	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE CONTACTO EN LOS EXTREMOS DONDE LA PERFILADORA NO ALCANCE POR LÍMITES CON LA GUARNICIÓN, CON UN RASPADO SUPERFICIAL CON RETROEXCAVADORA, ELIMINANDO TECATAS QUE HAYAN QUEDADO PARA RENIVELADO, BARRIDOS ENTRE PASADA DE MOTOCONFORMADORA Y EN REMATES DE EMPATES A DETALLE A MANO, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRADERO OFICIAL INDICADO.	M2	0	$31.76	$0.00
35	RENIVELACIONES CON CONCRETO ASFALTICO MEZCLA EN PLANTA EN CALIENTE ASFALTO MODIFICADO CON POLIMERO TIPO I, CUMPLIENDO LAS NORMAS SCT REFERENTES DE CONSTRUCCCION Y CONSERVACION, GRANULOMETRIA DENSA 3/8 A FINOS, MEDIDO COMPACTO AL NOVENTA Y CINCO PORCIENTO (95%), INCLUYE CARGA Y ACARREO EN TRAMOS AISLADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES, Y MAQUINARIA Y EQUIPO AL SIGUIENTE PUNTO EN CUALQUIER VOLUEN, PERFILADO, LIMPIEZA DE HUESO Y GRAVA SUELTA, DESVIO DE VEHICULOS, SEÑALETICA Y PROTECCION DE OBRA, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	M3	0	$6,687.43	$0.00
38	RIEGO DE LIGA CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-65 %), INCLUYE, SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, Y APLICACION DE LA EMULSION CON EQUIPO ESPECIAL PARA ESA ACTIVIDAD, ESPREAS O BACHADOR LIMPIAS Y ALINEADAS, CONTROL DE CALIDAD A CADA DOS REMESAS EN OBRA (INDEPENDIENTEMENTE DE LA CANTIDAD A UTILIZAR) EN LA PETROLIZADORA, A RAZON DE 0.8 LT DE EMULSION POR M2, O LO QUE INDIQUE EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, NO SE ACEPTAN "IMPREGNALIGA", TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T.	M2	0	$14.64	$0.00
39	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA ELABORADA CON ASFALTO MODIFICADO TIPO I, AGREGADO 3/4" A FINOS, DE 5 CM DE ESPESOR, FORMADA Y COMPACTADO AL 95%, INCLUYE MATERIALES, QUE CUMPLAN LA NORMATIVA SCT-N-CMT-04-04, SCT-CMT-4-05-002, SCT-CMT-4-05-003, SCT-CMT-4-05-004, SCT-CTR-CAR-1-04-006-14 APLICADAS AL DIA DE HOY, DISEÑO MARSHALL (DEVERÁ SER AUTORIZADO POR EL LABORATORIO DE CALIDAD DE SOPMA AL MENOS 3 DIAS ANTES DE INICIO DE TENDIDO DE LA MEZCLA ASFALTICA), INCUYE: TRAMO DE PRUEBA AL INICIO PARA REVISION Y AUTORIZACION DEL ESPESOR POR PARTE DEL SUPERVISOR, EL CONTRATISTA DEBERÁ PREVEER EL SUMINISTRO Y TIEMPOS MUERTOS POR MOVIMIENTOS DEL TREN DE MAQUINAS DE TRABAJO EN TRAMOS AISLADOS. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. Y LIMPIEZAS DE GRANZON Y HUESO LATERAL.	M2	0	$325.19	$0.00
				Totales por Partida	**$0.00**
				Totales por Grupo	**$0.00**

Obra: SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA (CALZADA NORTE)

Ubicación: TRAMO: ENTRE AV. GERÓNIMO DE LA CUEVA Y CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS, VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE Fracc. 1a. Secc.

Contratista: GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V. (1010)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **EXTRAORDINARIO**				
	PARTIDA: **EXTRAORDINARIOS**				
63	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN PAVIMENTOS, CALLES Y VIALIDADES CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: EJES, BANCO DE NIVEL, RENIVELACIONES LAS VECES NECESARIAS, CORRECCION DE RASANTE A PUNTOS OBLIGADOS (AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION), ESTACAS, VARILLAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPO DE PRECISION CALIBRADO, TRABAJO TERMINADO.P.U.O.T.	M2	)61.2969895167	$5.23	$41,637.58
64	CORTE CON DISCO DIAMANTADO DE 14" EN PISOS DE CONCRETO ASFALTICO DE HASTA 8.00 cm. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: TRAZO, EQUIPO Y OPERACION, LIMPIEZAS.	ML	1239.5	$29.04	$35,995.08
67	FRESADO UNIFORME DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO 5-7 CM (6 cm de espesor promedio) MEDIANTE FRESADORA EN FRIO COMPACTA, EQUIPADA CON BANDA TRANSPORTADORA PARA CARGA DIRECTA SOBRE CAMION DE VOLTEO, INCLUYE: TRAMO DE PRUEBA AL INICIO DEL FRESADO PARA AUTORIZACION DE SUPERVISION (SUPERFICIE FRESADA UNIFORME Y SIN PROTUBERANCIAS NI ONDEOS), ACARREOS LOCALES, CARGA Y ACARREO A KM SUBSECUENTES (11 A 15 KM APROX) DE MATERIAL PRODUCTO DEL FRESADO DE CARPETA ASFALTICA EL TRASLADO SERA A PARQUE DE MAQUINARIA DE LA SOPMA, PIEZAS DE DESGASTE, COMBUSTIBLES, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, CUALQUIER VOLUMEN Y AREA,EQUIPO NECESARIO, LIMPIEZA FINA Y GRUESA, TRABAJO TERMINADO.	M3	408.78	$1,090.44	$445,750.06
69	CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO AL 1er. KM, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	609.02	$59.21	$36,060.07
70	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES, AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MAS CERCANO AUTORIZADO POR LA SUPERVISION, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3-KM	9135.32	$9.65	$88,155.84
				Totales por Partida	**$647,598.64**
	PARTIDA: **EXTRAORDINARIO**				
71	SONDEO A MANO O A MAQUINA PARA LOCALIZACION DE TUBERIAS CUALQUIER PROFUNDIDAD Y MATERIAL PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICO SANITARIAS CUIDANDO NO DAÑARLAS PARA NO INTERFERIR EN LOS SERVICIOS, INCLUYE: EXCAVACION, EQUIPO, MANO DE OBRA, REPORTE A LA SUPERVISION, RELLENOS, COMPACTACIONES, TRABAJO TERMINADO.	SOND	95	$1,557.60	$147,972.00
72	EXCAVACION EN CORTE CON MAQUINA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 80 CM, EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DE MATERIAL, ACARREOS AL LUGAR DE ACOPIO PARA SU CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	1846	$33.02	$60,954.92
73	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% DE SU P.V.S.M EN SU COMPACTACION., INCLUYE ESCARIFICADO, TENDIDO, HOMOGENIZADO, HUMEDECIDO OPTIMO NIVELADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM, CALIDAD Limite liquido máximo 50%, Valor de Soporte California (CBR) mínimo 15%, Expansión máxima 5%, Grado de Compactación minimo 90% ± 2, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M2	2522.98	$5.95	$15,011.73

Obra: **SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA (CALZADA NORTE)**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE AV. GERÓNIMO DE LA CUEVA Y CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS, VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE Fracc. 1a. Secc.**

Contratista: **GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V. (1010)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **EXTRAORDINARIO**				
	PARTIDA: **EXTRAORDINARIO**				
74	FORMACION Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE, CON EL USO DE EQUIPO MAYOR, HASTA ALCANZAR EL 100% AASHTO MODIFICADA. EN CAPAS DE 20 CM MAXIMO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON LA NORMA, HUMEDAD OPTIMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, EL MATERIAL DEBERA CUMPLIR CON UN C.B.R. DEL 60% PARA LO CUAL EL CONTRATISTA DEBERA PROPONER UN BANCO DE MATERIAL Y UN FRENTE, DEBERA PRESENTAR EL ESTUDIO DE CALIDAD QUE AVALE EL CUMPLIMIENTO AL 100 % DE LA NORMA Y DEMAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS, P.U.O.T.	M3	517.17	$338.34	$174,979.30
75	FORMACION Y COMPACTACION DE SUB-BASE PARA MAS DE UN MILLON DE EJES EQUIVALENTES, CON EL USO DE EQUIPO MAYOR, HASTA ALCANZAR EL 100% AASHTO MODIFICADA. EN CAPAS DE 20 CM MAXIMO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON LA NORMA, HUMEDAD OPTIMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, EL MATERIAL DEBERA CUMPLIR CON UN C.B.R. DEL 60% PARA LO CUAL EL CONTRATISTA DEBERA PROPONER UN BANCO DE MATERIAL Y UN FRENTE, DEBERA PRESENTAR EL ESTUDIO DE CALIDAD QUE AVALE EL CUMPLIMIENTO AL 100 % DE LA NORMA N-CMT-4-02-001. Y DEMAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS, P.U.O.T.	M3	517.17	$407.12	$210,550.25
76	FORMACION Y COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA PARA MAS DE UN MILLON DE EJES EQUIVALENTES DE 20 CMS. DE ESPESOR, PARA CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO, CON MATERIAL 100% TRITURADO (SOLAMENTE) 1 1/2" A FINOS QUE CUMPLA CON LA NORMA COMPACTADA AL 100 % DE PRUEBA AASHTO. COMBINANDO COMPACTADOR DE RODILLO EN BAJA Y MUERTO Y LLANTEO CON EQUIPO PESADO (CAMION DE VOLTEO CARGADO AL MAXIMO), INCLUYE HOMOGENEIZADO, TENDIDO, COMPACTADO, E INCORPORACION DE AGUA HASTA ALCANZAR LA HUMEDAD OPTIMA Y NIVELACIONES,	M3	517.17	$563.48	$291,414.95
77	CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO AL 1er. KM, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	2014.8	$48.09	$96,891.73
78	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES, AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MAS CERCANO AUTORIZADO POR LA SUPERVISION, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3-KM	23015.64	$7.82	$179,982.30
79	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KG/CM2 TMA 1 1/2" GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 6 A 8 CM FRAGUADO NORMAL DE 20 CM DE ESPESOR MODULADO EN LOSAS DE 3.5 MTS. (ANCHO) X 3.5 MTS (LARGO) COMO MAXIMO, CON CORTES EN LAS LOSAS DE 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA (7 CM) Y SELLADO CON MATERIAL ELASTOMERICO Y TIRA PREFORMADA EN JUNTAS Y CORTES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES COLA DE RATA DE 1/8", ASI COMO EL APROCHE CON GUARNICION Y DENTELLON. INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO CON INMERSION Y REGLA VIBRATORIA, DESCIMBRADO, REGLEADO FINAL, ACABADO CEPILLO DE ALUMINIO Y CON DOBLADOR, CALAFATEO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, P.U.O.T.	M2	2546.37	$606.88	$1,545,341.03
80	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO PARA JUNTAS DE EXPANSION A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CELDAS CERRADAS (FOAMTECH) DE 1/2" DE ESPESOR Y 20 CM DE ALTURA DE ACUERDO AL DISEÑO ANEXO EN PLANOS, INCLUYE: MATERIAL, SELLADOR AUTONIVELANTE,MANO DE OBRA, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, ACARREO, FLETES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE CONTROL DE CALIDAD (LA FICHA TECNICA DEL FABRICANTE DEBERA CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA)	ML	786.32	$111.94	$88,020.66

Obra: SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA (CALZADA NORTE)

Ubicación: TRAMO: ENTRE AV. GERÓNIMO DE LA CUEVA Y CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS, VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE Fracc. 1a. Secc.

Contratista: GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V. (1010)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **EXTRAORDINARIO**				
	PARTIDA: **EXTRAORDINARIO**				
81	EXCAVACION A MANO CON PICO Y PALA EN MATERIAL TIPO II, EN SECO O PRESENCIA DE AGUA, INCLUYE. CORTE DE RAIZ DE CUALQUIER TAMAÑO Y GROSOR, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 40 CM DESPUES DE DESMONTE, DESPALME Y/O DEMOLICION DE SUPERFICIE O ELEMENTO ESTRUCTURAL O DE ACABADO, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, SIN DAÑAR AREAS ALEDAÑAS, CARGA Y ACARREO A TIRADERO OFICIAL, CONSERVACION DE LA MISMA, TRABAJO TERMINADO, LIMPIEZAS.	M3	209.993444181	$599.58	$125,907.87
82	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% DE SU P.V.S.M EN SU COMPACTACION., INCLUYE ESCARIFICADO, TENDIDO, HOMOGENIZADO, HUMEDECIDO OPTIMO NIVELADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM, CALIDAD Limite liquido máximo 50%, Valor de Soporte California (CBR) mínimo 15%, Expansión máxima 5%, Grado de Compactación minimo 90% ± 2, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M2	944.26	$25.21	$23,804.79
83	RELLENO COMPACTADO AL 90% CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM UTILIZANDO BAILARINA. INCLUYE: SUMINISTRO DE TEPETATE (MATERIAL DE BANCO) EN LA OBRA, ABUNDAMIENTO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CRIBADO, RETIRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	M3	188.85	$394.37	$74,476.77
84	CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO AL 1er. KM, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	210	$48.09	$10,098.90
85	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES, AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MAS CERCANO AUTORIZADO POR LA SUPERVISION, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	3150.06	$7.82	$24,633.47
86	CONSTRUCCION DE DENTELLON RECTO Y/O CURVO 20-20X40 CM DE SECCION, CON CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KGF/CM2, TMA 1 1/2", R.R 3 DIAS. REVENIMIENTO NORMAL DE 10+-2 CM, GRAVA TRITURADA, ACABADO CON DOBLADOR Y PULIDO. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, , Y CURADO CON MEMBRANA QUIMICA APLICADA CON ASPERSOR Y LIMPIEZA, REMATE CON PAVIMENTO EXISTENTE DEL MISMO MATERIAL Y TIPO, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	ML	1156.9	$343.07	$396,897.68
				Totales por Partida	**$3,466,938.37**
	PARTIDA: **EXTRAORDINARIOS**				
87	EXCAVACION A MAQUINA Y/O A MANO EN MATERIAL TIPO II, EN SECO O PRESENCIA DE AGUA, INCLUYE. CORTE DE RAIZ DE CUALQUIER TAMAÑO Y GROSOR, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 40 CM DESPUES DE DESMONTE, DESPALME Y/O DEMOLICION DE SUPERFICIE O ELEMENTO ESTRUCTURAL O DE ACABADO, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, SIN DAÑAR AREAS ALEDAÑAS, CARGA Y ACARREO A TIRADERO OFICIAL, CONSERVACION DE LA MISMA, TRABAJO TERMINADO, LIMPIEZAS.	M3	655.03	$263.34	$172,495.60
93	BACHEO PROFUNDO AISLADO UTILIZANDO MATERIAL CALIDAD BASE HIDRAULICA PARA MAS DE UN MILLON DE EJES EQUIVALENTES DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA, INCISO N.CSV.CAR.1.02.004/03 DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARR. DE LA SCT, INCLUYE: PREPARACION, PERFILADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO NECESARIO QUE SE REQUIERA PARA LOGRAR LA COMPACTACION DE 100% PVSM, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, PREPARACION DE MATERIAL, HUMEDECIDO, NIVELADO, TRASLADO DE UN PUNTO A OTRO DENTRO DE LA OBRA, EN CUALQUIER VOLUMEN, MOVIMIENTO DE MAQUINARIA P.U.O.T	M3	268	$1,309.82	$351,031.76

Obra: SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA (CALZADA NORTE)

Ubicación: TRAMO: ENTRE AV. GERÓNIMO DE LA CUEVA Y CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS, VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE Fracc. 1a. Secc.

Contratista: GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V. (1010)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
GRUPO: EXTRAORDINARIO					
PARTIDA: EXTRAORDINARIOS					
94	BACHEO PROFUNDO AISLADO UTILIZANDO MATERIAL CALIDAD BASE HIDRAULICA PARA MAS DE UN MILLON DE EJES EQUIVALENTES DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA, INCISO N.CSV.CAR-1.02.004/03 DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARR. DE LA SCT, BASE HIDRAULICA MEJORADA CON CEMENTO EN PROPORCION DE 40 KILOS DE CEMENTO POR CADA M3, INCLUYE: PREPARACION, PERFILADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO NECESARIO QUE SE REQUIERA PARA LOGRAR LA COMPACTACION DE 100 %, PVSM, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, PREPARACION DE MATERIAL, HUMEDECIDO, NIVELADO, TRASLADO DE UN PUNTO A OTRO DENTRO DE LA OBRA EN CUALQUIER VOLUMEN, MOVIMIENTO DE MAQUINARIA P.U.O.T	M3	84.6	$1,694.81	$143,380.93
96	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE CONTACTO EN LOS EXTREMOS DONDE LA PERFILADORA NO ALCANCE POR LÍMITES CON LA GUARNICIÓN, CON UN RASPADO SUPERFICIAL CON RETROEXCAVADORA, ELIMINANDO TECATAS QUE HAYAN QUEDADO PARA RENIVELADO, BARRIDOS ENTRE PASADA DE MOTOCONFORMADORA Y EN REMATES DE EMPATES A DETALLE A MANO, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRADERO OFICIAL INDICADO.	M2	120	$29.85	$3,582.00
97	RENIVELACIONES CON CONCRETO ASFALTICO MEZCLA EN PLANTA EN CALIENTE ASFALTO MODIFICADO CON POLIMERO TIPO I, CUMPLIENDO LAS NORMAS SCT REFERENTES DE CONSTRUCCCION Y CONSERVACION, GRANULOMETRIA DENSA 3/8 A FINOS, MEDIDO COMPACTO AL NOVENTA Y CINCO PORCIENTO (95%), INCLUYE CARGA Y ACARREO EN TRAMOS AISLADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES, Y MAQUINARIA Y EQUIPO AL SIGUIENTE PUNTO EN CUALQUIER VOLUEN, PERFILADO, LIMPIEZA DE HUESO Y GRAVA SUELTA, DESVIO DE VEHICULOS, SEÑALETICA Y PROTECCION DE OBRA, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	M3	87.75	$6,112.37	$536,360.47
100	RIEGO DE LIGA CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-65 %), INCLUYE, SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, Y APLICACION DE LA EMULSION CON EQUIPO ESPECIAL PARA ESA ACTIVIDAD, ESPREAS O BACHADOR LIMPIAS Y ALINEADAS, CONTROL DE CALIDAD A CADA DOS REMESAS EN OBRA (INDEPENDIENTEMENTE DE LA CANTIDAD A UTILIZAR) EN LA PETROLIZADORA, A RAZON DE 0.8 LT DE EMULSION POR M2, O LO QUE INDIQUE EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, NO SE ACEPTAN "IMPREGNALIGA", TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T.	M2	4719.66	$13.77	$64,989.72
101	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA ELABORADA CON ASFALTO MODIFICADO TIPO I, AGREGADO 3/4" A FINOS, DE 5 CM DE ESPESOR, FORMADA Y COMPACTADO AL 95%, INCLUYE MATERIALES, QUE CUMPLAN LA NORMATIVA SCT N CMT 04 04, SCT CMT 4 05 002, SCT CMT 4 05 003, SCT-CMT-4-05-004, SCT-CTR-CAR-1-04-006-14 APLICADAS AL DIA DE HOY, DISEÑO MARSHALL (DEVERÁ SER AUTORIZADO POR EL LABORATORIO DE CALIDAD DE SOPMA AL MENOS 3 DIAS ANTES DE INICIO DE TENDIDO DE LA MEZCLA ASFALTICA), INCUYE: TRAMO DE PRUEBA AL INICIO PARA REVISION Y AUTORIZACION DEL ESPESOR POR PARTE DEL SUPERVISOR, EL CONTRATISTA DEBERÁ PREVEER EL SUMINISTRO Y TIEMPOS MUERTOS POR MOVIMIENTOS DEL TREN DE MAQUINAS DE TRABAJO EN TRAMOS AISLADOS. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. Y LIMPIEZAS DE GRANZON Y HUESO LATERAL.	M2	4719.66	$307.74	$1,452,428.17
				Totales por Partida	$2,724,268.64

Obra: SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA (CALZADA NORTE)

Ubicación: TRAMO: ENTRE AV. GERÓNIMO DE LA CUEVA Y CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS, VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE Fracc. 1a. Secc.

Contratista: GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V. (1010)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **EXTRAORDINARIO**				
	PARTIDA: **EXTRAORDINARIO**				
103	RENIVELACION DE POZO DE VISITA HASTA 0.30 m DE ALTURA. INCLUYE: RETIRO SIN RECUPERACION DE BROCAL EXISTENTE, NIVELADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 28 cm DE ESPESOR, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, PLOMEADO, NIVELADO, DEMOLICIONES, CARGAS Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS	PZA	3	$3,475.16	$10,425.48
104	CONSTRUCCION DE LOSA DE DIAMANTE DE CONCRETO MR= 45 , T.M.A. DE 3/4" (19MM), GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 8+-2.5CM CM, FRAGUADO RAPIDOA A 3 DIAS, DE 25 CM DE ESPESOR, EN POZO DE VISITA, Y 1.50 M POR LADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD EN TODO EL PERIMETRO EXTERIOR DE 1/2" ASI COMO DE LAS JUNTAS DIAGONALES PARA FORMAR 4 PARTES, BROCAL Y TAPA DE Fo. Fo. TIPO PESADO, (165 KG), CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA QUIMICA BASE AGUA, APLANADO FINO EN RECEPCION DE BROCAL, CORTES CON CORTADORA DE DISCO DE 5 CM ENTRE JUNTAS DIAGONALES FORMADO 8 PIEZAS Y SELLADO DE JUNTAS Y CORTES CON MATERIAL PREFORMADO Y SELLADOR AUTONIVELANTE, MANO DE OBRA, ACARREOS DE MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	3	$8,877.60	$26,632.80
106	RENIVELACIÓN DE RASANTE (PARTE SUPERIOR) DE CAJA DE VÁLVULAS TIPO 3 DE HASTA 1.96 X 1. 75 MTS, NIVELADO HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 10 CM, Y MINIMA DE 5 CM. MEDIDAS INTERIORES INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN, PREPARACIONES , Y DEMOLICIONES, RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE TAPA DE FOFO EXISTENTE, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO COMÚN 7X14X28 CM DE 14 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2.00 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, LOSA DE CONCRETO F´C= 250 KG/CM2 T.M.A. 19 MM DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON VRS No. 3 @15 cm EN AMBOS SENTIDOS, CONTRAMARCO SENCILLO DE CANAL FoFo DE 100 mm, CONTRAMARCO CON TAPA DE FOFO, TIPO PESADO DE 50X50 CM, DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE APROCHES, CARGA Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, LIMPIEZA PREVIA, FINAL, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. PZA 2.00	PZA	9	$16,698.60	$150,287.40
107	RENIVELACIÓN DE RASANTE (PARTE SUPERIOR) DE CAJA DE VÁLVULAS TIPO 5 DE HASTA 1.58 X 1.16 MTS, NIVELADO HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 10 CM, Y MINIMA DE 5 CM. MEDIDAS INTERIORES INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN, PREPARACIONES , Y DEMOLICIONES, RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE TAPA DE FOFO EXISTENTE, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO COMÚN 7X14X28 CM DE 14 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2.00 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, LOSA DE CONCRETO F´C= 250 KG/CM2 T.M.A. 19 MM DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON VRS No. 3 @15 cm EN AMBOS SENTIDOS, 2 CONTRAMARCOS SENCILLOS DE CANAL FoFo DE 100 mm, CONTRAMARCO CON 2 TAPAS DE FOFO, TIPO PESADO DE 50X50 CM, DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE APROCHES, CARGA Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, LIMPIEZA PREVIA, FINAL, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. PZA 2.00	PZA	3	$24,435.24	$73,305.72

Obra: SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA (CALZADA NORTE)

Ubicación: TRAMO: ENTRE AV. GERÓNIMO DE LA CUEVA Y CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS, VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE Fracc. 1a. Secc.

Contratista: GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V. (1010)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **EXTRAORDINARIO**				
	PARTIDA: **EXTRAORDINARIO**				
108	RENIVELACIÓN DE RASANTE (PARTE SUPERIOR) DE CAJA DE VÁLVULAS TIPO 12 DE HASTA 1.96 X 1.66 MTS, NIVELADO HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 10 CM, Y MINIMA DE 5 CM. MEDIDAS INTERIORES INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN, PREPARACIONES , Y DEMOLICIONES, RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE TAPA DE FOFO EXISTENTE, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO COMÚN 7X14X28 CM DE 14 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2.00 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, LOSA DE CONCRETO F´C= 250 KG/CM2 T.M.A. 19 MM DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON VRS No. 3 @15 cm EN AMBOS SENTIDOS, 3 CONTRAMARCOS SENCILLOS DE CANAL FoFo DE 100 mm, CONTRAMARCO CON 3 TAPAS DE FOFO, TIPO PESADO DE 50X50 CM, DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE APROCHES, CARGA Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, LIMPIEZA PREVIA, FINAL, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. PZA 2.00	PZA	1.	$34,136.10	$34,136.10
110	LIMPIEZA GENERAL Y A DETALLE DE LA OBRA, INCLUYE: BARRIDO Y ACARREOS DE ESCOMBROS, RETIRO FUERA DE LA OBRA DEL MISMO, DESVIO VEHICULAR, SEÑALETICA, A MANO Y A MAQUINA.	M2	8477	$15.58	$132,071.66
			Totales por Partida		**$426,859.16**
	PARTIDA: **EXTRAORDINARIOS**				
111	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE COLOR AZUL (PANTONE 294) EN RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CUALQUIER SECCIÓN SEGÚN PLANOS. INCLUYE: TRAZO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	M2	40.5	$278.39	$11,274.80
112	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LOGOTIPO A (SILLA DE RUEDAS) EN PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE COLOR BLANCO EN RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD TAMAÑO Y DISEÑO SEGÚN PLANOS. INCLUYE: TRAZO, ENMASCARILLADO, PLANTILLA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	PZA	7	$358.31	$2,508.17
113	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE PARA MARCAS EN GUARNICIONES CLASIFICACION M-12.1, M12.2 APLICADA SOBRE GUARNICIONES Y DENTELLONES DE CUALQUIER COLOR, SEGÚN SE REQUIERA Y SEGÚN NORMA S.C.T. SECADO AL TACTO EN 5 MIN Y AL DURO EN 30 MIN CON MICRO ESFERA , DESARROLLO DE 35 CM. INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, TRAZO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	ML	527	$65.66	$34,602.82
114	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE PARA MARCAS EN GUARNICIONES CLASIFICACION M-12.1, M12.2 APLICADA SOBRE GUARNICIONES Y DENTELLONES DE CUALQUIER COLOR, SEGÚN SE REQUIERA Y SEGÚN NORMA S.C.T. SECADO AL TACTO EN 5 MIN Y AL DURO EN 30 MIN CON MICRO ESFERA , DESARROLLO DE 45 CM. INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, TRAZO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	ML	1200	$84.45	$101,340.00

Obra: SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA (CALZADA NORTE)

Ubicación: TRAMO: ENTRE AV. GERÓNIMO DE LA CUEVA Y CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS, VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE Fracc 1a Secc

Contratista: GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V. (1010)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **EXTRAORDINARIO**				
	PARTIDA: **EXTRAORDINARIOS**				
115	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE " EN RAYA SEPARADORA CLASIFICACIÓN M - 1.1, LÍNEA CONTINUA SENCILLA DE DIVISIÓN DE CARRILES DE FRENTE EN PISO, DE 10 CM DE ANCHO, COLOR BLANCO Y/O AMARILLO CON MICRO ESFERA SEGÚN NORMA SCT, SECADO AL TACTO EN 5 MIN Y AL DURO EN 30 MIN. INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	ML	115	$16.92	$1,945.80
116	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE " EN RAYA SEPARADORA CLASIFICACIÓN M - 1.2, DISCONTINUA SENCILLA, DE DIVISIÓN DE CARRILES PARA VELOCIDADES MENORES A 60 KM/HR DE FRENTE EN PISO, DESARROLLO DE 2.50 ML X 0.10 MTS DE ANCHO, CON UNA SEPARACIÓN DE 5.00 MTS ENTRE SI PROMEDIO, A BASE DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR BLANCO CON MICRO ESFERA SEGÚN NORMA SCT, INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	ML	1100	$16.92	$18,612.00
117	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE " EN RAYA SEPARADORA CLASIFICACIÓN M - 3.3, CONTINUA IZQUIERDA, PARA VIALIDADES URBANAS DE FRENTE EN PISO, SEPARADA 15 CM. DE LA GUARNICION, A BASE DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR BLANCO CON MICRO ESFERA SEGÚN NORMA SCT, INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	ML	600	$16.92	$10,152.00
118	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE " EN RAYA DE ALTO CLASIFICACIÓN M - 6, PARA INDICAR ALTO EN CRUCEROS, COLOR BLANCO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN NORMA SCT DE 0.60 MTS DE ANCHO DE LONGITUD VARIABLE, INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	ML	15	$84.53	$1,267.95
119	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE " EN RAYA PARA CRUCE PEATONAL CLASIFICACIÓN M 7.1, PARA INDICAR " CRUCE PEATONAL EN VIAS PRIMARIAS", COLOR AMARILLO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGUN NORMA SCT DE 0.40 MTS DE ANCHO Y 3.5 MTS. DE LONGITUD POR EL ANCHO DE LA VIALIDAD, CON UNA SEPARACIÓN DE 0.40 MTS. ENTRE ELLAS, INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	M2	1100	$150.39	$165,429.00

Obra: **SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA (CALZADA NORTE)**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE AV. GERÓNIMO DE LA CUEVA Y CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS, VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE Fracc. 1a. Secc.**

Contratista: **GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V. (1010)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **EXTRAORDINARIO**				
	PARTIDA: **EXTRAORDINARIOS**				
120	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE " EN FLECHAS CLASIFICACIÓN M - 11.1, "FLECHA SENCILLA" PARA INDICAR SENTIDO DE CIRCULACIÓN , EN VIALIDADES PARA VELOCIDAD MENOR A 60KM POR HORA DIFERENTES DIMENSIONES (VER PLANO DE SEÑALAMIENTOS) COLOR BLANCO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN NORMA SCT, INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	PZA	46	$690.77	$31,775.42
121	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE " EN FLECHAS CLASIFICACIÓN M - 11.1, " FLECHA CABEZA DOBLE" PARA INDICAR SENTIDO DE CIRCULACIÓN (VUELTA IZQUIERDA O DERECHA) , EN VIALIDADES PARA VELOCIDAD MENOR A 60KM POR HORA DIFERENTES DIMENSIONES (VER PLANO DE SEÑALAMIENTOS) COLOR BLANCO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN NORMA SCT, INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	PZA	6	$1,243.32	$7,459.92
122	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA STANDARD (S-200) DE 10X10CM. COLOR: CUERPO AMARILLO Y REFLEJANTE AMARILLO 1 CARA MARCA SEA O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE FICHA TECNICA, ANCLADO EN PAVIMENTO SISTEMA DE SUJECION DE ALTO AGARRE BASE CUÑAS CON AB PEGAMENTO EPOXICO 50/50 RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (VER PLANO DE DETALLES DE SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL Y VERTICAL). INCLUYE: TRAZO, ALINEACION, ELEVACION CUALQUIER ALTURA, TRABAJO TERMINADO, LIMPIEZAS.	PZA	245	$46.95	$11,502.75
123	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA SOLAR DE 10X10CM. COLOR: CUERPO ALUMINIO 3 LED DOS CARAS REFLEJANTES MARCA CREATIVAL VT-29 O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE FICHA TECNICA, ANCLADO EN PAVIMENTO SISTEMA DE SUJECION DE ALTO AGARRE BASE CUÑAS CON AB PEGAMENTO EPOXICO 50/50 RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (VER PLANO DE DETALLES DE SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL Y VERTICAL). INCLUYE: TRAZO, ALINEACION, ELEVACION CUALQUIER ALTURA, TRABAJO TERMINADO, LIMPIEZAS.	PZA	75	$595.17	$44,637.75
124	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL DE RESTRICCION SR-9 (VELOCIDAD MAXIMA), DISEÑO NORMATIVO SCT, HECHO A ABASE DE LAMINA GALVANIZADA CON CEJA DE 72 X 72 CM CALIBRE 16, CON TERMINADO GRADO INGENIERIA EN SU TOTALIDAD, EL COLOR SERA REFLEJANTE GRADO INGENIERIA Y SIMBOLOS EN COLOR REFLEJANTE, TODOS LOS COLORES RESISTENTES A LA INTEMPERIE, FIJADA MEDIANTE BARRENADO Y TORNILLOS DE 2 1/2" X 5/16" A UN POSTE DE PTR DE 2 X 2" CALIBRE 14 EN ACABADO GALVANIZADO Y CON UNA ALTURA DE 2.5 MTS AL NIVEL DE BANQUETA A LA PARTE INFERIOR DE LA LAMINA MAS EL EXCEDENTE REQUERIDO PARA FIJAR LAS LAMINAS Y ANCLADO DE 50 CM DE PROFUNDIDAD CON ANGULO TRANSVERSAL DE 1 X 1" DE 25 CM, EN DADO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 30 CM DE LADO (VER PLANO DE DETALLES CRITERIOS DE ANCLAJE DE SEÑALAMIENTO VERTICAL, DETALLE SEÑ-02 Y SEÑ 03), MCA ASEA O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LIMPIEZAS Y RETIRO DEL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO OFICIAL, TRABAJO TERMINADO.	PZA	4	$3,020.11	$12,080.44

Obra: **SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA (CALZADA NORTE)**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE AV. GERÓNIMO DE LA CUEVA Y CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS, VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE Fracc. 1a. Secc.**

Contratista: **GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V. (1010)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **EXTRAORDINARIO**				
	PARTIDA: **EXTRAORDINARIOS**				
125	EXCAVACION EN ZANJA CON MAQUINA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 150 CM, EN MAERIAL TIPO II,INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DE MATERIAL, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	609.02	$33.02	$20,109.84
126	DESAZOLVE EN CAJA DE VALVULAS DE MATERIAL PRODUCTO DE LLUVIAS Y ACUMULADO EN CAJA de 0.00 a 6.00 m2 de area de caja	PZA	14	$806.52	$11,291.28
127	FORMACION DE PLANTILLA CON MAT. SELECCIONADO PRODUCTO DE EXC. APIZONADO CON PIZON DE MANO	M3	52.73	$189.77	$10,006.57
128	SUMINISTRO Y COL. DE TUBERIA DE AGUA POTABLE RD-26 DE 8" DE DIAM. p.u.o.t. segun normas	ML	493	$488.20	$240,682.60
131	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO SEMICOMPACTO CON UN ESPESOR MINIMO DE 0.30 M POR ENCIMA DEL LOMO DEL TUBO producto de excavacion	M3	214.5	$75.51	$16,196.90
132	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTO CON UN ESPESOR MAXIMO DE 0.30 M. EN CAPAS COM AL 95% producto de excavacion	M3	404.58	$85.74	$34,688.69
135	SUMINISTRO Y COL. DE ABRAZADERA DE PVC DE 8" CPN SALIDA DE 1/2" PARA LA COL. DEL INSERTOR DE NYLON MACHO, INC. COL. DE LA MISMA Y PERFORACION DEL TUBO DE PVC	PZA	25	$291.96	$7,299.00
136	REPARACION DE TOMAS DOM. INC TAPONAMIENTO PROVISIONAL, COPLE MANGUERA A MANGUERA MCA PHILMAC 0.50M. DE TUBO KITEK DE 5/8", EXCAVACION Y COLOCACION DEL TUBO DE 5/8" PARA LA TOMA Y COLOCACION DE COPLE, TRABAJO TERMINADO.	PZA	78	$697.09	$54,373.02
138	REPARACION DE ABRAZADERAS DE 3" DAÑADAS POR LAS EXCAVACIONES, INC. EXC. SUMINISTRO DE ABRAZADERA DE 3", TAPON MACHO GAL, TRABAJO TERMINADO.	PZA	33	$437.18	$14,426.94
				Totales por Partida	**$863,663.65**
	PARTIDA: **EXTRAORDINARIO**				
144	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", R.N. GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTI DE 10+-2 CM, ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2" SECCION DE LOSAS COMO INDIQUE PROYECTO, INCLUYE: JUNTA A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CELDAS CERRADAS DE 1/2" EN JUNTAS FRIAS LONGITUDINALES CON MUROS Y TRANSVERSALES DEL ELEMENTO, ASI COMO SU UNION CON ELEMENTOS VIEJOS O CAMBIO DE ELEMENTO, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CORTES CON CORTADORA DE DISCO, SELLADO DE CORTES CON SELLADOR AUTONIVELANTE Y TIRA DE RELLENO PREFORMADA NO ADHERENTE DE 1/8" (EN TODAS LAS JUNTAS DE CONTRACCCION Y CONSTRUCCION TRANSVERSALES), CURADO CON MEMBRANA QUIMICA APLICADA CON ASPERSOR, TRABAJO TERMINADO	M2	771.34	$404.58	$312,068.74
				Totales por Partida	**$312,068.74**
				Totales por Grupo	**$8,441,397.19**


Obra: SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA (CALZADA NORTE)


Ubicación: TRAMO: ENTRE AV. GERÓNIMO DE LA CUEVA Y CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS, VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE Fracc. 1a. Secc.

Contratista: GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V. (1010)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total


Totales Presup.		$8,441,397.19
Anticipo	+	$2,379,310.72
Amortizac. Ant.	-	$2,379,310.72
SubTotal. Ant.	=	$8,441,397.18
IVA	+	$1,350,623.56
Total	=	$9,792,020.74

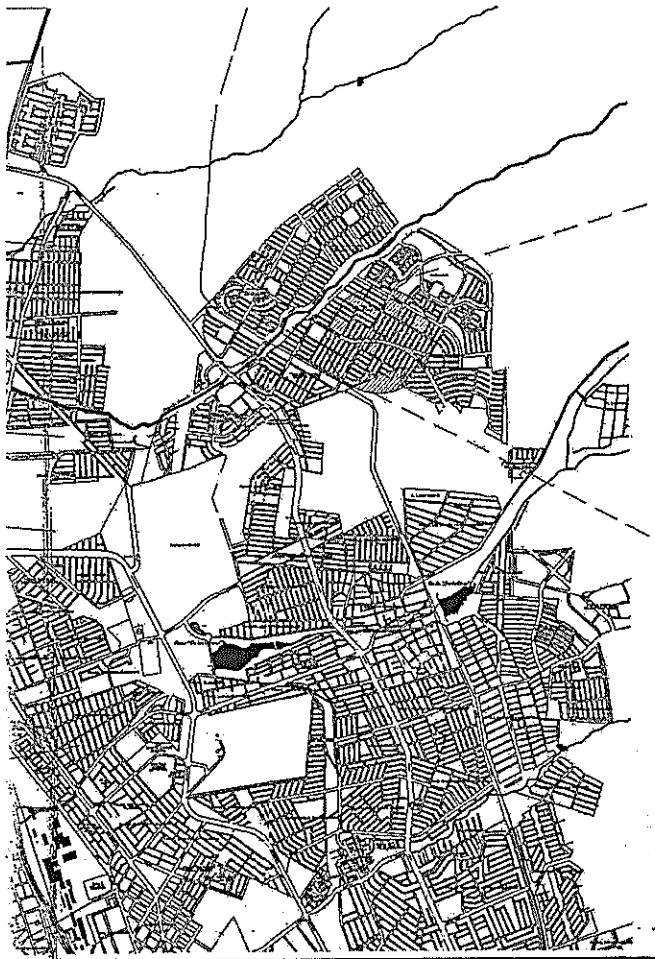

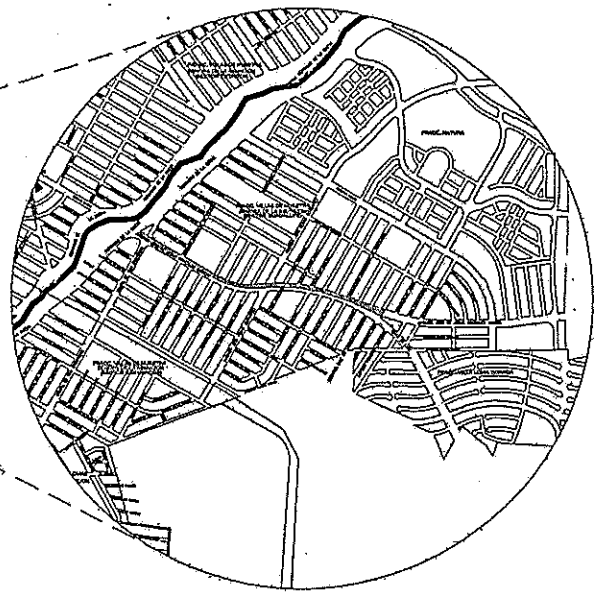

MACROLOCALIZACIÓN

ESCALA S/E AV. JOSE DE JESÚS GONZALEZ GARCÍA



SIMBOLOGÍA

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.C.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV. FECHA OBSERVACIONES

V°B°. DE LA SECRETARÍA


RESP. DE PROY. EXTERNO | LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL
PROYECTÓ | REVISO | AUTORIZO

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra | Secretaría de Obras Públicas
PROYECTISTA | COORDINADOR
JEFE DE DEP. | DIRECTOR


PROYECTO
AV. JOSE DE JESUS GONZALEZ CALZADA NTE
UBICACIÓN
ENTRE EL BOULEVARD DE LA CUEVA Y CERRADA NUEVO CHALCO
FRACC. VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN
CONTENIDO
PLANO DE LOCALIZACIÓN

CLAVE: MAC 01 | No. PLANO: 01
FECHA: JUNIO 2022 | ESCALA: INDICADA
ACOTACIÓN: METROS | No. EXP.: S-050-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

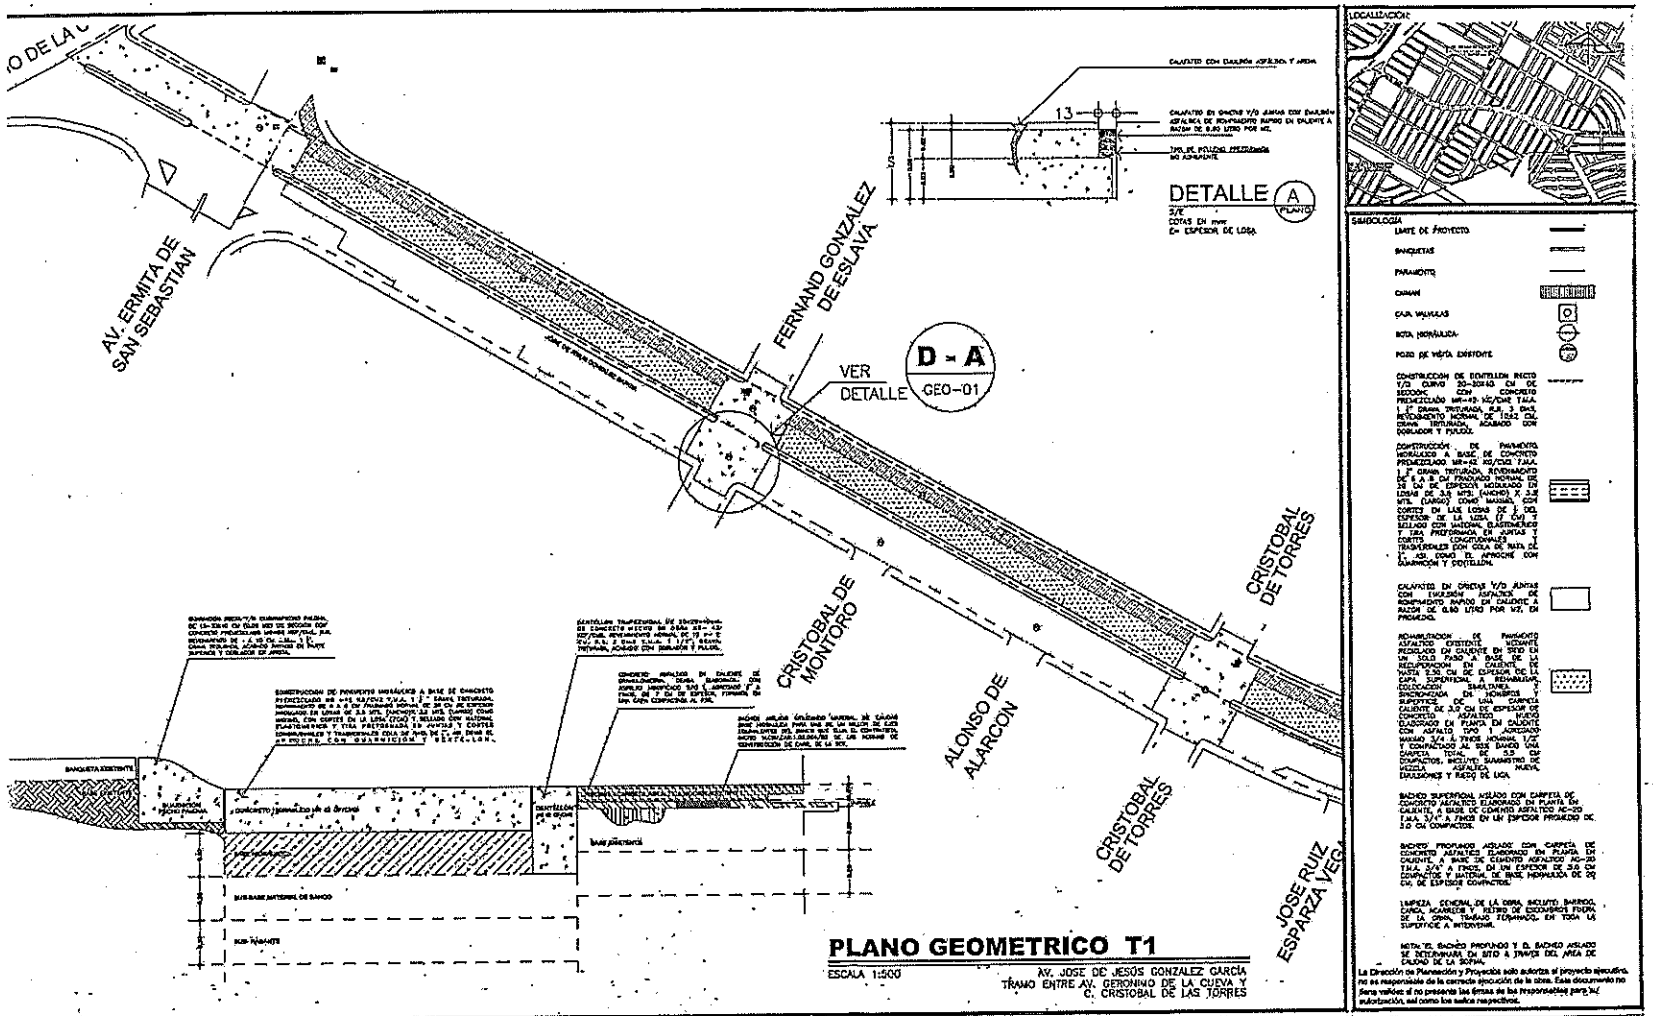

PRESIDENTE MUNICIPAL M.P.P. Leonardo Montañez Castro ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPNA Arq. Gloria Guadalupe Castillo González	REV. FECHA OBSERVACIONES	No. RELOJ DE DERRIBERA	RESP. DE PROY. EXTERNO CED. PROFESIONAL PROYECTO / REVISO / AUTORIZO	LOGO EXTERNO	Dirección de Planeación y Proyectos de Obra Secretaría de Obras Públicas PROYECTISTA / COORDINADOR DIRECTOR	PROYECTO DIRECCIÓN Y RESEÑA HISTÓRICA AV. JOSÉ DE JESÚS GONZALEZ UBICACION TRAMO ENTRE AV. GERONIMO DE LA CUEVA Y C. CRISTOBAL DE LAS TORRES CONTENIDO PLANO GEOMETRICO TRAMO 1, DETALLE	CLAVE GEO 01 FECHA JUNIO 2022 ACOTACION METROS	No. PLANO 09 ESCALA INDICADA No. EXP. R-005-22	Aguascalientes LA CIUDAD DE TU VIDA

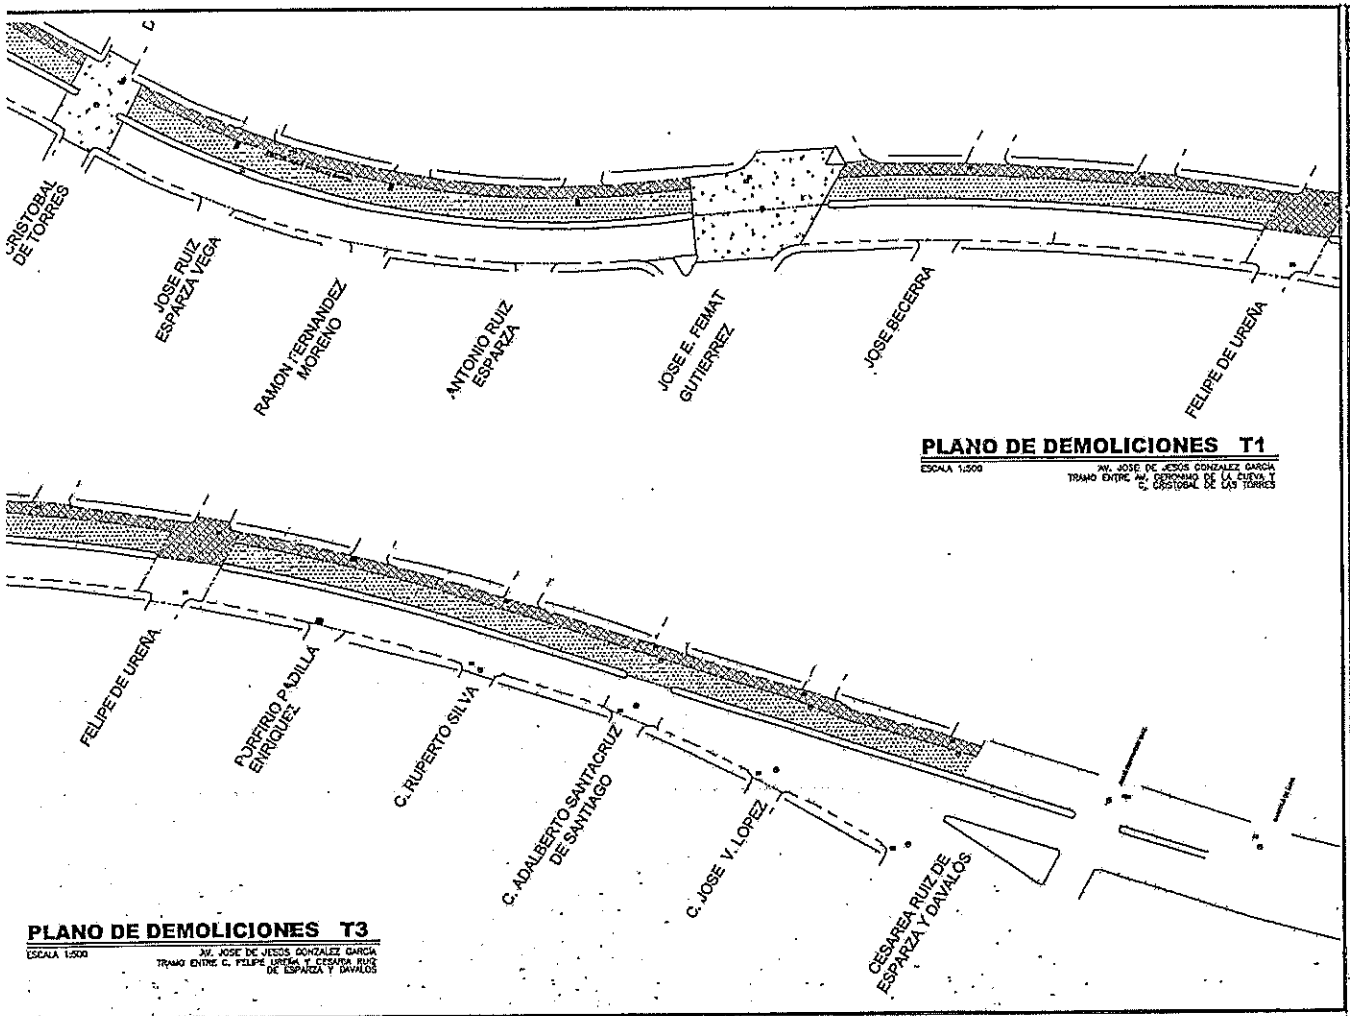

PLANO DE DEMOLICIONES T1

ESCALA 1:500

AV. JOSE DE JESUS GONZALEZ GARCIA
TRAMO ENTRE Av. DEMONIO DE LA CUEVA Y C. CRISTOBAL DE LAS TORRES

PLANO DE DEMOLICIONES T3

ESCALA 1:500

AV. JOSE DE JESUS GONZALEZ GARCIA
TRAMO ENTRE C. FELIPE UREÑA Y CESAREA RUIZ DE ESPARZA Y DAVALOS

LOCALIZACIÓN

SIMBOLOGÍA

- LIMITE DE PROYECTO
- BANQUETAS
- PAVIMENTO
- CAMAN
- CAJA VALVULAS
- BOTA HIDRÁULICA
- POZO DE VISITA EXISTENTE

CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN RECTO Y/O CURVO 25-20X40 CM DE SECCIÓN, CON CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KG/CM2 T.M.A. 1 1" GRAVA TRITURADA, F'R. 3 DIAS, REVENIMIENTO NORMAL DE 10±2 CM, GRAVA TRITURADA, ACABADO CON DORLADOR Y PULIDO.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KG/CM2 T.M.A. 1 1" GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM FRAGUADO NORMAL DE 20 CM DE ESPESOR MODULADO EN LOSAS DE 3.5 MTS. (ANCHO) X 3.5 MTS. (LARGO) COMO MÁXIMO, CON CORTES EN LAS LOSAS DE 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA (7.00) Y SELLADO CON MATERIAL ELASTOMÉRICO Y TIRA PREFORMADA EN JUNTAS Y CORTES LONGITUDINALES Y TRASVERSALES CON COLA DE RATA DE 1", ASÍ COMO EL APROCHE CON GUARNICIÓN Y DOVELLÓN.

CALAFATEO EN GRIETAS Y/O JUNTAS CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO EN CALIENTE A RAZÓN DE 0.50 LITRO POR M2, EN PROMEDIO.

REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE MEDIANTE RECICLADO EN CALIENTE EN SITIO EN UN SOLO PASO A BASE DE LA RECUPERACIÓN EN CALIENTE DE HASTA 2.50 CM DE ESPESOR DE LA CAPA SUPERFICIAL A REHABILITAR, COLOCACION GRAVITARIA Y SINCRONIZADA DI NIVELES Y SUPERFICIE DE UNA CARPETA CALIENTE DE 3.0 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ASFALTICO NUEVO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE CON ASFALTO TIPO I AGREGADO MAXIMO 3/4 A 3%% NOMINAL 1/2" Y COMPACTADO AL 95% DANDO UNA CARPETA TOTAL DE 5.5 CM COMPACTOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA NUEVA, EMULSIONES, Y RIEGO DE LIGA.

RIEGO SUPERFICIAL AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20, T.M.A. 3/4" A 7%% EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 5.0 CM COMPACTOS.

La Dirección de Planeación y Proyectos sólo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPSHA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV	FECHA	OBSERVACIONES

RESP. DE PROY. EXTERNO	LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL	
PROYECTO / REVISO / AUTORIZO	


Dirección de Planeación y Proyectos de Obra — Secretaría de Obras Públicas

PROYECTISTA	COORDINADOR
ARQ. BLANCA LÓPEZ ACUÑA PÉREZ	ARQ. ALEJANDRO JAIME LEAL
C.P. MA. [illegible]	DIRECTOR
ARQ. JESÚS [illegible] GONZÁLEZ	M.ARQ. JESÚS MUÑOZ GARCÍA

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE RIEGO CARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA
UBICACIÓN
TRAMO: ENTRE C. CRISTOBAL DE LAS TORRES Y C. FELIPE DE UREÑA Y DE CESAREA RUIZ DE ESPARZA Y DAVALOS
FRACC. VILLA DE NAZARETH SECCIÓN DE LA ASUNCIÓN
CONTENIDO
PLANO GEOMETRICO TRAMO 2 Y 3

CLAVE	No. PLANO
GEO 02	10
FECHA: MAYO 2022	ESCALA: INDICADA
ACOTACIÓN: METROS	No. EXP.: E-050-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

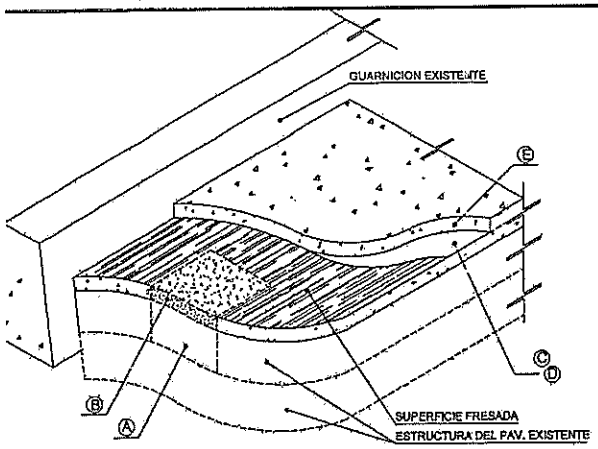

SIMBOLOGIA

a) BACHEO PROFUNDO AISLADO UTILIZANDO MATERIAL CALIDAD BASE HIDRAULICA PARA MAS DE UN MILLON DE EJES EQUIVALENTES DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA, INCISO N.CSV.CAR..02.004/03 DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARR. DE LA SCT.


b) RENIVELACIONES CON CONCRETO ASFALTICO MEZCLA EN PLANTA EN CALIENTE ASFALTO MODIFICADO CON POLIMERO TIPO I, CUMPLIENDO CON LAS NORMAS SCT REFERENTES DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION , GRANULOMETRIA DENSA 3/4"A FINOS, MEDIDO COMPACTO AL NOVENTA Y CINCO PORCIENTO (95%)

c) RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION DE ROMPIMIENTO LENTO (ECL-60 %), INCLUYE BARRIDO DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA A DETALLE, SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, Y APLICACION DE LA EMULSION CON EQUIPO ESPECIAL PARA ESA ACTIVIDAD, ESPREAS LIMPIAS Y ALINEADAS, EN CASO DE RECOMENDARLO EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL CONTRATISTA SE DEBERA DAR UN RIEGO MATAPOLVO ANTES DE COLOCAR LA CAPA DE IMPREGNACION, A RAZON DE 1.3 LT DE EMULSION POR M2, O LO QUE INDIQUE EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL CONTRATISTA

d) RIEGO DE LIGA CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-65 %), INCLUYE, SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, Y APLICACION DE LA EMULSION CON EQUIPO ESPECIAL PARA ESA ACTIVIDAD, ESPREAS O BACHADOR LIMPIAS Y ALINEADAS, EN LA PETROLIZADORA, A RAZON DE 0.8 LT DE EMULSION POR M2, O LO QUE INDIQUE EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, NO SE ACEPTAN "IMPREGNALIGA"


e) CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA ELABORADA CON ASFALTO PG 64-22, AGREGADO 3/4" A FINOS, DE 5 CM DE ESPESOR TOTAL, FORMADA Y COMPACTADO AL 95%, INCLUYE MATERIALES, QUE CUMPLAN LA NORMATIVA SCT-N-CMT-04-04, SCT-CMT-4-05-002, SCT-CMT-4-05-003, SCT-CMT-4-05-004, SCT-CTR-CAR-1-04-006-14 APLICABLES AL DIA DE HOY, DISEÑO MARSHALL (DEVERA SER AUTORIZADO POR EL LABORATORIO DE CALIDAD DE SOPESA, AL MENOS 3 DIAS ANTES DE INICIO DE TENDIDO DE LA MEZCLA ASFALTICA)

UCTURA DE PAVIMENTO

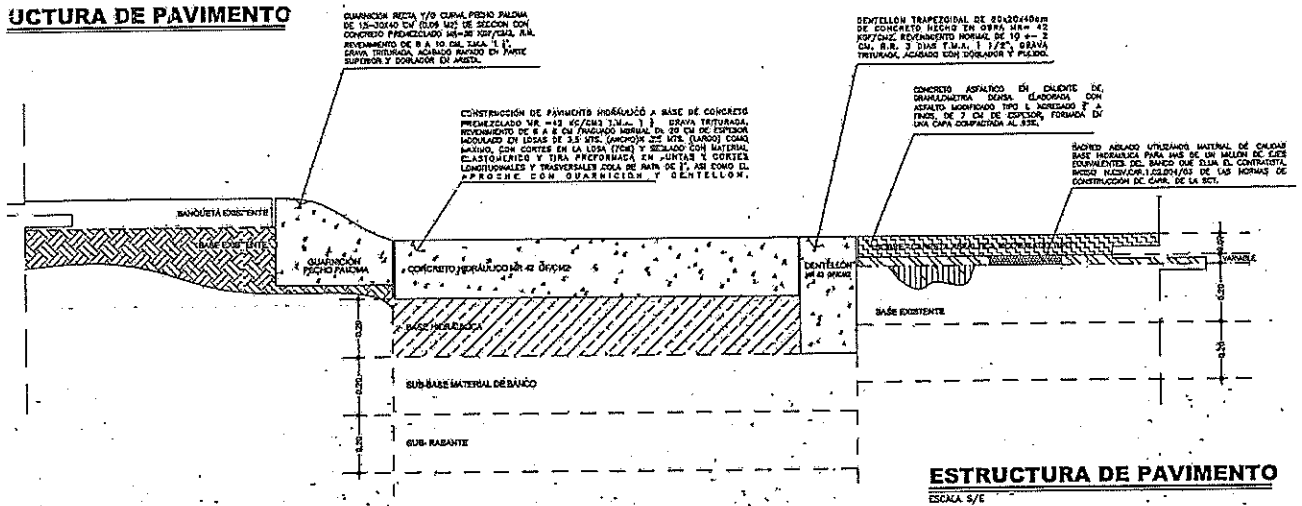

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

ESCALA S/E



SIMBOLOGIA

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPSPA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV.	FECHA	OBSERVACIONES

VISTO BUENO

RESP. DE REV. EXTERNO	LOCO EXTERNO
CED. PROFESIONAL	
PROYECTO	REVISO	AUTORIZO


Dirección de Planeación y Proyectos de Obra — Secretaría de Obras Públicas

PROYECTISTA: ARQ. BLANCA ESTHER ALCANTAR PEREZ
COORDINADOR: ARQ. ALEJANDRO JAIME LEAL
REVISO: ARQ. [illegible]
DIRECTOR: ARQ. JOSÉ LUIS ARÉCHIGA

PROYECTO: CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA Y/O CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. JOSE DE JESUS GONZALEZ EZ. CALZADA NORTE
UBICACION: TRAMO COMPRENDIDO DE LA CALZADA TIC CONSULAR DE CERVANTES Y CALLE PRINCE. VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
CONTENIDO: DETALLE DE ASFALTO Y PAVIMENTO HIDRAULICO
DETALLE S/E


CLAVE	No. PLANO
GEO 03	11
FECHA: MAYO 2022	ESCALA: INDICADA
ACOTACIÓN: METROS	No. EXP.: E-000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

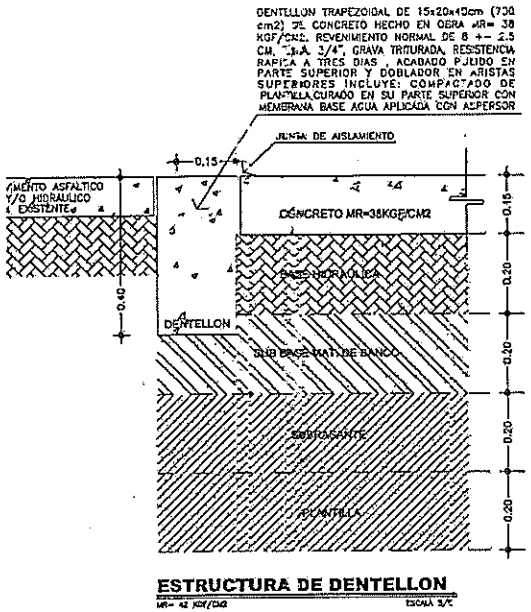

ESTRUCTURA DE DENTELLON


MR= 42 KGF/CM2 ESCALA S/E

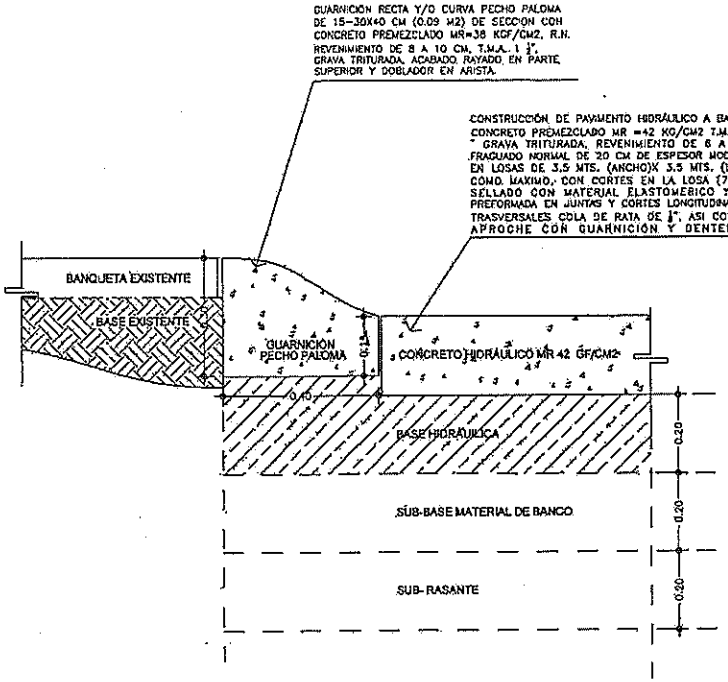

ESTRUCTURA DE GUARNICIÓN

MR= 35 KGF/CM2 ESCALA S/E

LOCALIZACIÓN:



SIMBOLOGÍA

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOFMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV.	FECHA	OBSERVACIONES

V°B° DE LA DIRECCIÓN

RESP. DEPTO. Y EXTERNO		LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL		
PROYECTO	REVISO	AUTORIZO


Dirección de Planeación y Proyectos de Obra — Secretaría de Obras Públicas


PROYECTISTA: ARQ. ESPE. NOHEMI ROSELANIA ALEJANDRO JAIME LEA
COORDINADOR
DIRECTOR: ARQ. JOSE FELIPE COLUSIN MUÑOZ DE LOS MANEZIAGA

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICO AV. VIRGEN DE JESUS DE NAZARETH CALZADA NORTE
UBICACION: FRACC. VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
CONTENIDO: DETALLE DE DENTELLÓN DETALLE DE GUANICION

CLAVE	No. PLANO
GEO 04	12
FECHA: JUNIO 2022	ESCALA: INDICADA
ACOTACIÓN: METROS	No. EXP.: S-000-22

Aguascalientes ... LA CIUDAD DE TU VIDA

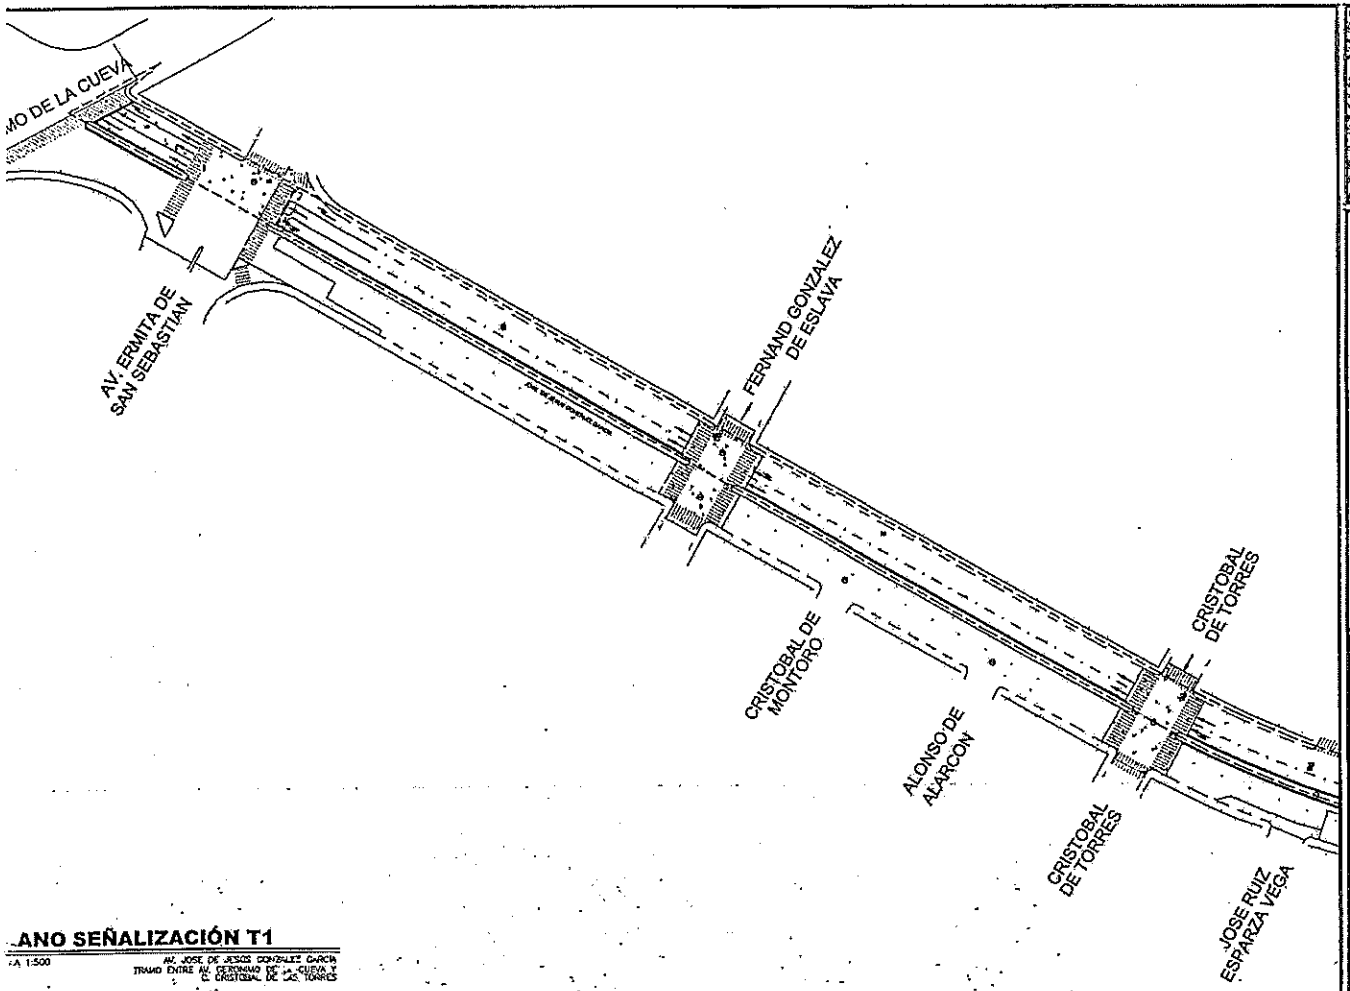



SIMBOLOGÍA

La Dirección de Planeación y Proyectos sella autoriza el proyectos ejecutivo, no de responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

ANO SEÑALIZACIÓN T1

A 1:500

AV. JOSE DE JESUS GONZALEZ GARCIA
TRAMO ENTRE AV. GERONIMO DE LA CUEVA Y C. CRISTOBAL DE LAS TORRES

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV	FECHA	OBSERVACIONES


RESP. DE PROY. EXTERNO | LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL
PROYECTO | REVISO | AUTORIZO

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra | Secretaría de Obras Públicas
PROYECTISTA | COORDINADOR
DIBUJO | DIRECTOR

PROYECTO: SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL
AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA NORTE
UBICACIÓN: TRAMO ENTRE AV. GERÓNIMO DE LA CUEVA Y C. CRISTOBAL DE LAS TORRES FRACC. VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN
CONTENIDO: PLANO DE SEÑALIZACION TRAMO 1, DETALLES

CLAVE	No. PLANO
SEN. 01	13
FECHA: JUNIO 2023	ESCALA: INDICADA
ACOTACIÓN: METROS	No. EXP.: IS-000-23

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

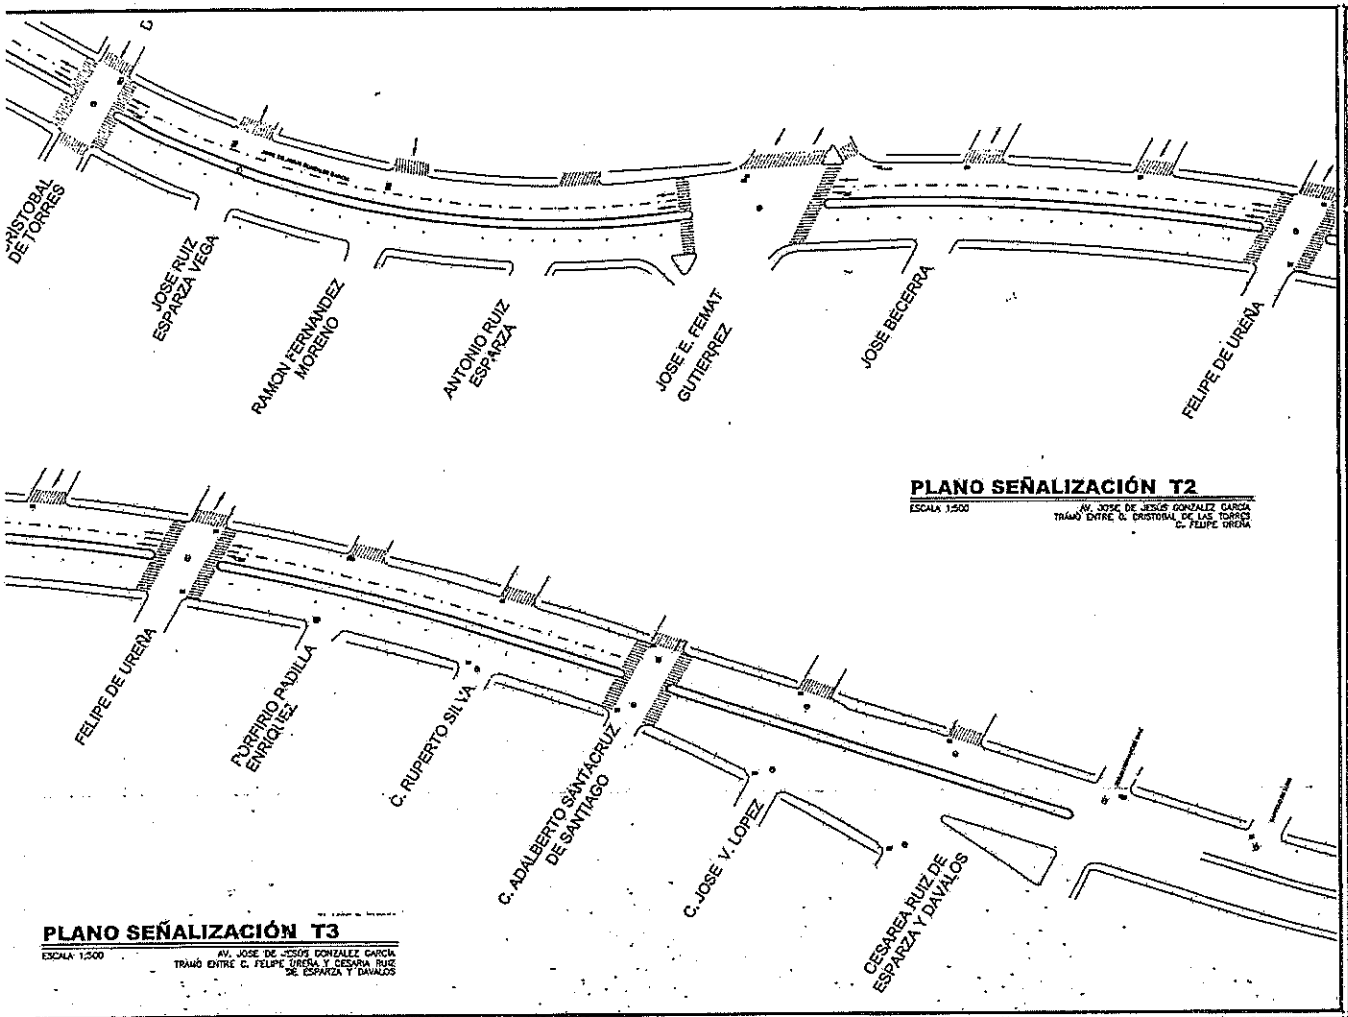

PLANO SEÑALIZACIÓN T2

ESCALA 1:500

AV. JOSE DE JESUS GONZALEZ GARCIA
TRAMO ENTRE C. CRISTOBAL DE LAS TORRES
C. FELIPE UREÑA

PLANO SEÑALIZACIÓN T3

ESCALA 1:500

AV. JOSE DE JESUS GONZALEZ GARCIA
TRAMO ENTRE C. FELIPE UREÑA Y CESAREA RUIZ DE ESPARZA Y DAVALOS

LOCALIZACIÓN:

SIMBOLOGÍA

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento es será valídez si no presenta los datos de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV	FECHA	OBSERVACIONES


RESP. DE PROY. EXTERNO | LOGO EXTERNO
DES. PROFESIONAL
PROYECTO | REVISO | AUTORIZO

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra | Secretaría de Obras Públicas
PROYECTISTA: BLANCA ESTHER QUIJANO PEREZ | COORDINADOR: ARQ. ALEJANDRO JAIME LEAL
REVISO: ARQ. J. YSAAC LOPEZ GONZALEZN | DIRECTOR: ARQ. [illegible]

PROYECTO: [illegible] AV. JOSE DE JESUS GONZALEZ GARCIA
UBICACIÓN: TRAMO ENTRE CRISTOBAL DE LAS TORRES Y CESAREA RUIZ DE ESPARZA Y DAVALOS
FRACC. VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN
CONTENIDO: PLANO DE SEÑALIZACIÓN TRAMO 2 Y 3


CLAVE	No. PLANO
SEN 02	14
FECHA: JUNIO 2022	ESCALA: INDICADA
ACOTACIÓN: METROS	No. EXP.: S-000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA




SEÑALIZACION EN PISO

ESCALA 1:200 COTAS EN m




DETALLE DE FLECHAS EN PAVIMENTO PARA VELOCIDADES HASTA DE 60KM/H

COTAS EN cm ESCALA 1:50




SEÑALIZACION EN PISO

ESCALA 1:200 COTAS EN m



DETALLE DE FLECHAS EN PAVIMENTO PARA VELOCIDADES MAYORES DE 60KM/H


COTAS EN cm ESCALA 1:50



DETALLE DE CRUCERO

ESCALA 1:200 COTAS EN m

LOCALIZACIÓN



SIMBOLOGIA

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no se responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no será valido si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOFMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV.	FECHA	OBSERVACIONES

V.B. EN LA CONGRUENCIA

RESP. DE PROY. EXTERNO		LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL		
PROYECTO	REVISO	AUTORIZO


Dirección de Planeación y Proyectos de Obra — Secretaría de Obras Públicas

PROYECTISTA	COORDINADOR
ARQ. ELSA ROCIO PEREZ	ARQ. ALEJANDRO JAIME LEAL
JEFE DE AREA	DIRECTOR
ARQ. JOSE PABLO GONZALEZ	ARQ. JOSE LUIS MENDOZA

PROYECTO
CONSTRUCCION DE SUPERCARRETERA DE LUCES PANORAMICAS EN AV. JOSE DE JESUS OCHOA ELIZALDE, CALVILLO NORTE
UBICACION
TRAMO ENTRE AL CRUCERO DE LA CARRETERA CALVILLO-RINCON DE ROMOS Y EL FRACC. VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
CONTENIDO
DETALLES DE SEÑALIZACION

CLAVE	No. PLANO
SEN 03	15
FECHA	ESCALA
JUNIO 2022	INDICADA
ACOTACION	No. EXP.
METROS	6-000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

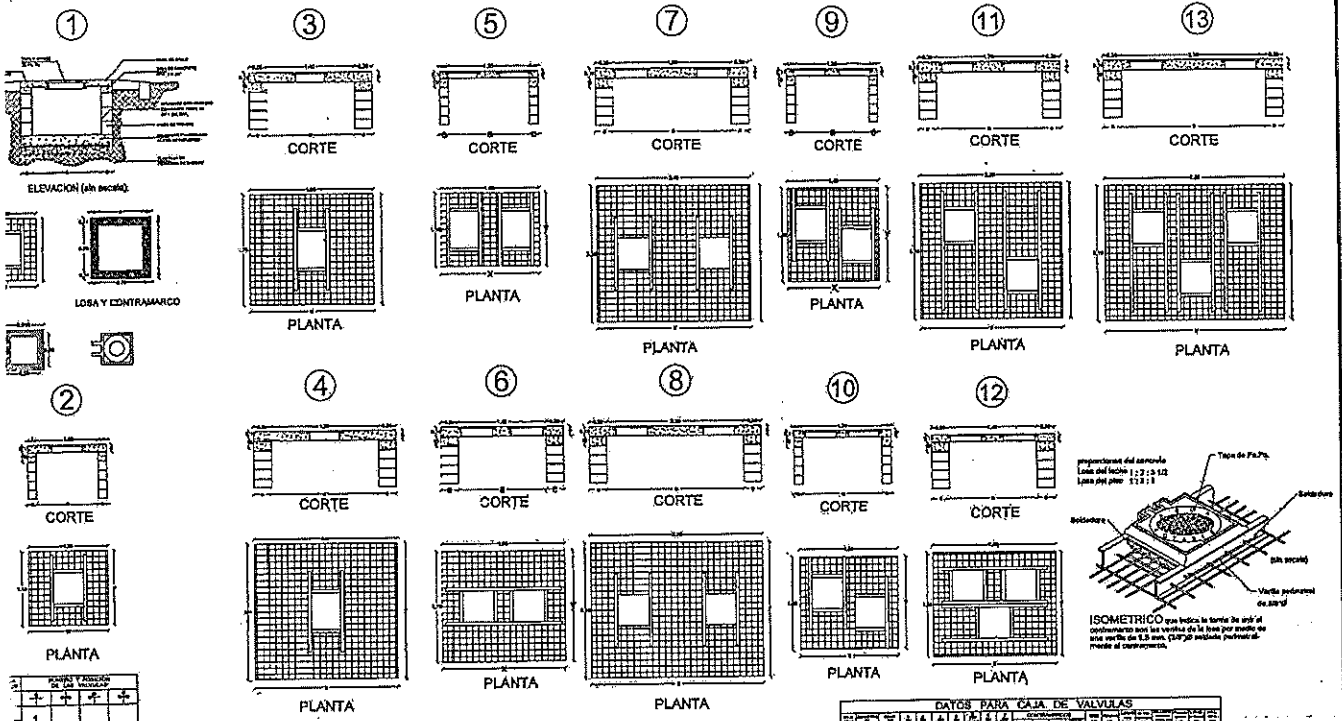

ISOMETRICO que indica la forma de unir el contramarco con las varillas de la losa por medio de una varilla de 3.5 mm. (1/8") soldada perimetralmente al contramarco.

NUMERO Y POSICION DE LAS VALVULAS			
+	+	+	+
1	5	9	12
2			
3	6	10	13
	7	11	
4	8		

NOTAS:

1.- TODAS LAS DIMENSIONES INDICADAS EN ESTA LÁMINA LAS ACOTACIONES "A" & "Y" SON GENERALES PARA TODOS LOS LADOS DE LONGITUD/ANCHO DE LAS CAJAS EXCEPTO LAS INDICADAS EN ESTAS ACOTACIONES "A" & "Y" Y SON GENERALES PARA TODOS LOS LADOS DE LONGITUD/ANCHO DE LAS CAJAS COMO LOS "A" "B" Y "Y" DE LA PLANTA DE MURO DE LA CAJA.

2.- LOS TORNILLOS SERÁN ACTUALIZADOS (16 mm [5/8] DE PERNO) DE PERNO EMPLEADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CONTRAMARCO, SERÁ DE TIPO LIVIANO

3.- EL DADO DE CIMENTACIÓN DE LA CASETA PERIMETRAL DE BARRA SUBIDA DESPACHO, CONSULTAPA DE LA CAJA.

4.- A LOS CONTRAMARCOS SE LES ACOMODARÁ UNA VARILLA PERIMETRAL COMO LO INDICA EL ISOMETRICO CON EL OBJETO DE ACOMODARLA SOLIDAMENTE EL CONTRAMARCO CON DEL TECHO.

5.- LOSA DEL TECHO TENDRÁ EL ESPESOR INDICADO EN LA TABLA "Y" LLEVARÁ LAS BARRAS LISAS DE VARILLA DE 3/4" DIAMETRO @ 15 cms. EN AMBOS SENTIDOS EL REFUERZO IRÁ EN SU CENTRO CONTRO

6.- LA LOSA DEL PISO SERÁ DE 15 cms DE ESPESOR CON REFUERZO DE VARILLA 3/8" A 30 cms EN AMBOS SENTIDOS

7.- QUEDA A JUICIO DELA RESIDENTE/PIONERO EL PONER DE LA CAJA UN TUBO DE 20 cms [8"] DE DIAMETRO PARA DESASOLVAR LA CAJA EN CASO NECESARIO PERO RECOMENDAMOS DICHO TUBO DEBERÁ IR A UN POZO DE VISITA DEL ALCANTARILLADO

8.- EL PISO QUE SE DETALLA EN ESTA LAMINA SE CONSTRUIRA SIMPLEMENTE QUE SE DESPLANTARÁ SOBRE TIERRA O OTRO MATERIAL SEMEJANTE, EL EL TERRENO DE CIMENTACIÓN EN TERRENOS ORDINARIOS, ROCA FIRME PIZARRA, SE COMETERÁ UNA LOSA DE PISO DE 10 cms DE ROCA FIRME BANCO, SE DESPLANTARÁN SOBRE DICHO PISO, DESPLANTÁNDOSE LOS MUROS DIRECTAMENTE SOBRE EL TERRENO

9.- LAS TAPAS PARA VALVULAS DE 4 cms [16"] DE DIAMETRO Y MAYORES QUE LLEVEN FORMATO DE 3/4" [20 mm] Y SE COLOCARÁN DON UNA O MAS VALVULAS SERÁN OBJETO DE UN DISEÑO ESPECIAL.

10.- QUEDA A JUICIO DELA RESIDENTE/INSPECTOR, EMPLEAR UNA O VARIAS CAJAS TIPO EN UN CRUCERO, DE ACUERDO CON EL NUMERO Y DISPOSICION DE LAS VALVULAS

DATOS PARA CAJA DE VALVULAS

No.	DIAMETRO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	20 cm [8"]	1	0.60	0.70	0.80	0.70	0.60	0.80	0.80	0.60	0.60	0.60	0.60	1	1	1.00	0.80	0.80	0.80	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
2	30 cm [12"]	1	0.60	0.70	0.80	0.70	0.60	0.80	0.80	0.60	0.60	0.60	0.60	1	1	1.00	0.80	0.80	0.80	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
3	40 cm [16"]	1	0.60	0.70	0.80	0.70	0.60	0.80	0.80	0.60	0.60	0.60	0.60	1	1	1.00	0.80	0.80	0.80	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
4	50 cm [20"]	1	0.60	0.70	0.80	0.70	0.60	0.80	0.80	0.60	0.60	0.60	0.60	1	1	1.00	0.80	0.80	0.80	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
5	60 cm [24"]	1	0.60	0.70	0.80	0.70	0.60	0.80	0.80	0.60	0.60	0.60	0.60	1	1	1.00	0.80	0.80	0.80	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
6	20 cm [8"]	2	0.70	0.80	0.90	0.80	0.70	0.90	0.90	0.70	0.70	0.70	0.70	1	1	1.00	0.90	0.90	0.90	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
7	30 cm [12"]	2	0.70	0.80	0.90	0.80	0.70	0.90	0.90	0.70	0.70	0.70	0.70	1	1	1.00	0.90	0.90	0.90	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
8	40 cm [16"]	2	0.70	0.80	0.90	0.80	0.70	0.90	0.90	0.70	0.70	0.70	0.70	1	1	1.00	0.90	0.90	0.90	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
9	50 cm [20"]	2	0.70	0.80	0.90	0.80	0.70	0.90	0.90	0.70	0.70	0.70	0.70	1	1	1.00	0.90	0.90	0.90	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
10	60 cm [24"]	2	0.70	0.80	0.90	0.80	0.70	0.90	0.90	0.70	0.70	0.70	0.70	1	1	1.00	0.90	0.90	0.90	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
11	20 cm [8"]	3	0.80	0.90	1.00	0.90	0.80	1.00	1.00	0.80	0.80	0.80	0.80	1	1	1.00	1.00	1.00	1.00	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
12	30 cm [12"]	3	0.80	0.90	1.00	0.90	0.80	1.00	1.00	0.80	0.80	0.80	0.80	1	1	1.00	1.00	1.00	1.00	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
13	40 cm [16"]	3	0.80	0.90	1.00	0.90	0.80	1.00	1.00	0.80	0.80	0.80	0.80	1	1	1.00	1.00	1.00	1.00	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
14	50 cm [20"]	3	0.80	0.90	1.00	0.90	0.80	1.00	1.00	0.80	0.80	0.80	0.80	1	1	1.00	1.00	1.00	1.00	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
15	60 cm [24"]	3	0.80	0.90	1.00	0.90	0.80	1.00	1.00	0.80	0.80	0.80	0.80	1	1	1.00	1.00	1.00	1.00	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20

LOCALIZACION

SIMBOLOGÍA

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no se responsabiliza de la correcta ejecución de la obra. Este documento tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SÍNDICA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

No.	FECHA	OBSERVACIONES

V°B° DE LA DIRECTORA

RESP. DE PROY. EXTERNO		LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL		
PROYECTO	REVISO	AUTORIZO


Dirección de Planeación y Proyectos de Obra
PROYECTISTA
BLANCA ESTHER ADAME PEDRAZA
SUPERVISO
ARQ. J. JESÚS GONZÁLEZ CONTRERAS

Secretaría de Obras Públicas
COORDINADOR
ARQ. ALEJANDRO JAIME LEAL
DIRECTOR
ARQ. JESÚS MONTAÑEZ GARCÍA

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA PERIMETRAL EN EL FRACCIONAMIENTO AV. JOSE DE JESUS GONZALEZ CALZADA NORTE
UBICACION
TRAMO ENTRE EL BOULEVARD DE LA CUEVA Y EL CAMINO A LOS OLIVOS EN LOS TERRENOS DEL FRACC. VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
CONTENIDO
CASETA DE OBRA COMPLEMENTARIA
CAJA DE VALVULAS

CLAVE	No. PLANO
OB 01	16
FECHA: JUNIO 2022	ESCALA: INDICADA
ACOTACION: METROS	No. EXP.: S-000-22


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

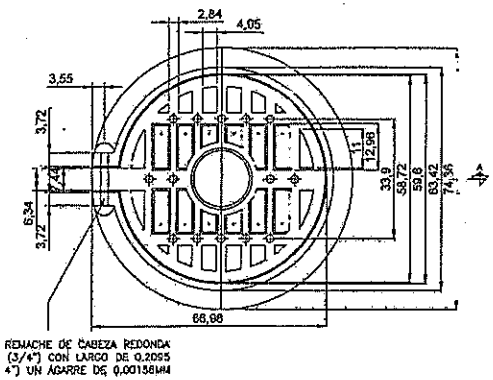


REMACHE DE CABEZA REDONDA
(3/4") CON LARGO DE 0.2095
4") UN AGARRE DE 0.00158M4


DETALLE DE BROCAL Y TAPA

PLANTA SIN ESCALA



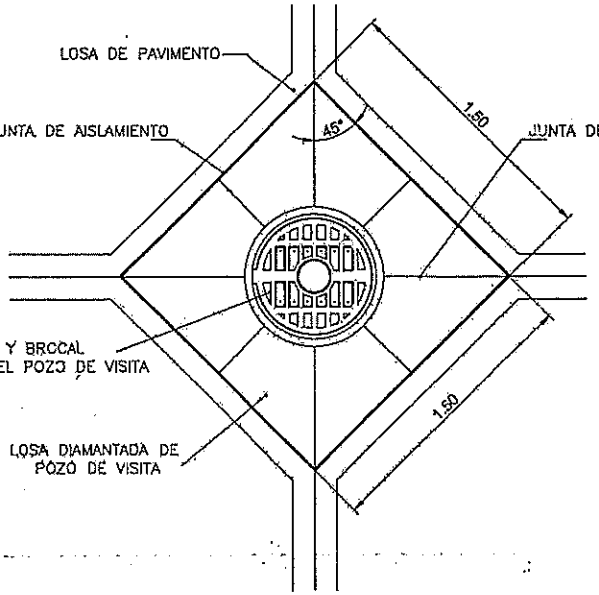

LOCALIZACIÓN:



SIMBOLOGÍA

La Dirección de Planeación y Proyectos sólo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tendrá validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL M.P.P. Leonardo Montañez Castro ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA Arq. Gloria Guadalupe Castillo González	REV. FECHA OBSERVACIONES	VAL. DE LA INFORMACIÓN	RESP. DE PROY. EXTERNO CED. PROFESIONAL PROYECTÓ REVISÓ AUTORIZÓ	LOGO EXTERNO	Dirección de Planeación y Proyectos de Obra Secretaría de Obras Públicas PROYECTISTA COORDINADOR DIRECTOR	PROYECTO UBICACIÓN CONTENIDO OBRA COMPLEMENTARIA DETALLE DE LOSA DIAMANTE	CLAVE OB 02 FECHA JUNIO 2022 ACOTACIÓN METROS	No. PLANO 17 ESCALA INDICADA No. EXP. 5-020-22	Aguascalientes LA CIUDAD, ES TU VIDA		
