Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

Dirección de Programación Presupuestal
Núm. Oficio AMPP/0421/22
Aguascalientes, Ags. 5 de Octubre del 2022
Asunto: Validación de Expediente Técnico

C.P. SERGIO ARTURO LOZANO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 17 fracción XV, 60 fracción XVI y 76 fracción VI del Reglamento del Sistema Integral de Desarrollo Municipal y del Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes, hago referencia al oficio SOPMA/2153/2022 recibido por este Instituto el día 5 de Septiembre del 2022 por parte de la Secretaría de Obras Públicas, mediante el cual remiten el expediente técnico original de la siguiente obra para su análisis, registro y priorización, conforme al Programa Anual de Obra Pública y Programas Sociales para el ejercicio presupuestal 2022:

| | |
|---|---|
| DEPENDENCIA EJECUTORA: | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS |
| NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO: | OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN |
| UBICACIÓN: | AV DE LA CONVENCIÓN 1914 NTE (CALZADA ORIENTE), ENTRE AV. JOSÉ H. ESCOBEDO Y BLVD. A ZACATECAS, VARIAS COLONIAS, AGUASCALIENTES, AGS. |
| FONDO DE INVERSIÓN: | PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL |
| IMPORTE: | $925,062.32 (ET FINAL) |
| No. DE OBRA: | 2022-PDM-0055-UR-0503 |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | CONTRATO |
| EJE: | MUNICIPIO SOBRESALIENTE |
| ESTRATEGIA: | OBRA PÚBLICA INTELIGENTE |
| POLITICA: | 5.8.1.REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIALIDADES, CAMINOS, CALLES, ÁREAS DE TERRACERÍA Y CAUCES (COM. |

Al respecto, hago de su conocimiento que dicho expediente ha sido analizado en su integración técnica y documental, con base en el artículo 168 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Asimismo, le comento que este Instituto valida dicha obra acorde a lo establecido en los artículos 14, 22 párrafo segundo y 23 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la cual se encuentra alineada al Plan de Desarrollo Municipal vigente, para dar cumplimiento a las metas establecidas en el mismo.

Cabe hacer mención que los recursos solicitados para este proyecto de inversión, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal para el presente ejercicio fiscal que determine la Secretaría a su digno cargo. Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

LIC. CÉSAR ALEJANDRO ANDRADE ROMO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE IMPLAN

CAAR / JDBC
C.c.p. I.C. Arq. Gloria Guadalupe Castillo González .- Secretaría de Obras Públicas.-Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes
Antonio Acevedo Escobedo 103 A. Col. Centro
Aguascalientes. Ags. C.P. 20000
(449) 9101010 Ext. 3117
www.implanags.gob.mx

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

IMPLAN

## ANÁLISIS INTEGRAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE OBRA (PAOP 2020): | 2022-PDM-0055-UR-0503 | REGISTRO No. | 222 |
| OFICIO DE VALIDACIÓN: | AMPP/0421/22 | FECHA RECIBIDO PARA REVISIÓN: | 5 de Octubre del 2022 |
| PROGRAMA: | URBANIZACIÓN | LOCALIDAD O COLONIA: | VARIAS COLONIAS |
| SUB-PROGRAMA: | Vialidades Urbanas ( Construcción, Ampliación y Rehabilitación) | DELEGACIÓN: | Aguascalientes |
| DEPENDENCIA: | Secretaría de Obras Públicas | MOD. DE EJECUCIÓN: | CONTRATO |
| NOMBRE DE LA OBRA: | OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN, AV DE LA CONVENCIÓN 1914 NTE (CALZADA ORIENTE), ENTRE AV. JOSÉ H. ESCOBEDO Y BLVD. A ZACATECAS | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL, PDM | | |
| INVERSIÓN: | $925,062.32 | CLASIFICACIÓN DE OBRA: | BIENES DE DOMINIO PUBLICA |

| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | BENEFICIARIOS | OTROS | DIFERENCIA ENTRE MOD. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $925,062.32 | 0.00 | 0.00 | $925,062.32 | 0.00 | 0.00 | *$21.159,04* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE EXPENDIENTE: | ET FINAL | AÑO: 2022 | AÑO: | AÑO: | | |
| AVANCES. | Financiero. 30 % | | Físico. 99 % | | | |
| FECHA DE INICIO: | 11 de Junio del 2022 | FECHA DE TÉRMINO: | 10 de Julio del 2022 | REGISTRO SIMA: | 55 | |

## CHEK LIST DE LOS ANEXOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

| | |
|---|---|
| CÉDULA DE REGISTRO DE OBRA | ✓ |
| DICTAMEN DE FACTIBILIDAD | ✓ |
| MEMORIA DESCRIPTIVA | ✓ |
| PRESUPUESTO BASE | ✓ |
| FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO | ✓ |
| CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO) | ✓ |
| CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO) | ✓ |
| PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES | ✓ |
| PLANOS O ESTUDIOS TÉCNICOS | ✓ |
| PADRÓN DE BENEFICIARIOS | N/A |
| ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO | N/A |
| DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL | N/A |
| CONVENIO DE CONCERTACIÓN | N/A |
| ACTA CONSTITUTIVA | N/A |

| METAS | | BENEFICIARIOS | | PERIODO DE EJECUCION | | OBRA PROPUESTA | | CLAVE SISCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD DE MEDIDA | CANT | TIPO DE BENEFICIARIOS | CANTIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | CONCEPTO | JORNALES A GENERAR | |
| OBRA | 1 | Personas | 450 | 2022-06-11 | 2022-07-10 | Señalética | 2405 | 2330 |

## INCLUIDO EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES

RECIBIO: ING. JOSÉ DAVID BURGUETE CLAUSTRO
Analista de Programación e Inversión de Obra Pública

5 de Octubre del 2022
Fecha de validación

5 de Octubre del 2022
Fecha de validación Expediente

PROCEDE Si ✓ No

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

# AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

## CEDULA DE REGISTRO POR OBRA

Aguascalientes

**050400-001E00E05-05-2-2-1-00-1-E-0510-0-17-0055-21-1520-6144**

| | |
|---|---|
| **2022-PDM-0055-UR-05-010** | Obra **OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. CONVENCIÓN 1914 (CALZADA ORIENTE)** |
| Tipo DEFINITIVO 1 2022<br>Folio SISCO **2330** | Ubic. TRAMO: ENTRE AV. JOSÉ H. ESCOBEDO Y BLVD. A ZACATECAS, AGUASCALIENTES Mpio. |

Ent. Ejecutora : **050400001E00E05**

| | |
|---|---|
| Eje: **05** | MUNICIPIO SOBRESALIENTE |
| Finalidad: **2** | DESARROLLO SOCIAL |
| Función: **2** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| Subfunción: **1** | URBANIZACIÓN |
| Tema: **00** | SIN TEMA |
| Cuenta del Gasto **1** | GASTO PROGRAMABLE |
| Clasif. Programatica: **E** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS |
| Programa: **0510** | Movilidad Urbana |
| SubPrograma: **0** | SUBPROGRAMA GENÉRICO |
| Proyecto: **17** | |
| Tipo de Gasto: **21** | GASTO INVERSIÓN / OBRA PÚBLICA |

### I N V E R S I O N 2022

| | | | |
|---|---|---|---|
| Municipal | 1520 | FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2022 | $925,062.32 |
| | | Folio SIMA 55 Total | $925,062.32 |

### M E T A S

| Unidad de Medida | Cantidad | Descripción |
|---|---|---|
| OBRA | 1 | OBRA OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. CONVENCIÓN 1914 (CALZADA ORIENTE) |

Inversión Ejercida Total al 31 de Diciembre de 2021 $0.00

Avance Fisico Acumulado al 31 de Diciembre de 2021

Avance Fisico Acumulado Programado al 31 de Diciembre de 2022 100 %

Fecha de Inicio 11 Jun 2022 Fecha de Terminación 10 Jul 2022

Jornales a Generar en 2022 2405

Modalidad de ejecución CONTRATO

Clasificación de la Obra Bienes de Dominio Público

Registro del Patrimonio: Obras del dominio público

OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

GENERALES

Nombre del Proyecto : OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. CONVENCIÓN 1914 (CALZADA ORIENTE)

TRAMO: ENTRE AV. JOSÉ H. ESCOBEDO Y BLVD. A ZACATECAS, AGUASCALIENTES Mpio.

Programa : UR URBANIZACIÓN

Subprograma : 05 VIALIDADES URBANAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION) (c).- Semáforos, Señalización y Sincronización (señales, placas, nomenclatura, pintura y otras))

Clave del Municipio : AGUASCALIENTES

Localidad :

Barrio, Colonia o Ejido : AGUASCALIENTES Mpio.

Tipo de Obra : NUEVA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. CONVENCIÓN 1914 (CALZADA ORIENTE) 1.00 OBRA

Beneficiarios ( No. y Tipo ) :

| 450 | PERSONAS |
|---|---|

OBRAS PÚBLICAS



No. Folio SISCO 2330

Los abajo firmantes, hacen constar que el presente proyecto :

OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. CONVENCIÓN 1914 (CALZADA ORIENTE)

TRAMO: ENTRE AV. JOSÉ H. ESCOBEDO Y BLVD. A ZACATECAS, AGUASCALIENTES Mpio.

cumple con los Requisitos y Normas Técnicas establecidas por la Dependencia Normativa, por lo que es viable su ejecución. Comprometiéndose la misma a proporcionar la supervisión y asistencia técnica necesaria durante el proceso administrativo.

Por la Dependencia Ejecutora

Arq. Gloria Guadalupe Castillo González
Encargada de Despacho de la Secretaría de Obras Públicas

Lic. Jaime Gallo Camacho
Secretario de Desarrollo Urbano

LUGAR :AGUASCALIENTES, AGS.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

# AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

## FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

LOCALIZACION: TRAMO: ENTRE AV. JOSÉ H. ESCOBEDO Y BLVD. A ZACATECAS, AGUASCALIENTES Mpio.

PROGRAMA: URBANIZACIÓN

SUBPROGRAMA: VIALIDADES URBANAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION) (c).- Semáforos, Señalización y Sincronización (señales, placas, nomenclatura, pintura y otras))

OBRA A REALIZAR: OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. CONVENCIÓN 1914 (CALZADA ORIENTE)

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

FORMA DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA: NUEVA

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. CONVENCIÓN 1914 (CALZADA ORIENTE)

CARACTERISTICAS DE LA OBRA: Bueno

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE REQUIERE PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

PROCEDE: SI [X] NO [ ]

REVISÓ: Jefa del Departamento de Expedientes Tecnicos y Costos

NOMBRE: Arq. Blanca Margarita Martinez Amador

FIRMA: _____

FECHA: 28 Sep 2022

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278


(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

No. Folio SISCO 2330

# H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
## SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
## DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA
# UBICACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | DM-0055-2022 - OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. CONVENCIÓN 1914 (CALZADA ORIENTE) | | | | |
| NO. DE CONT | DM-0055-2022 | CONTRATISTA: | ATECO, S.A. DE C.V. | | |

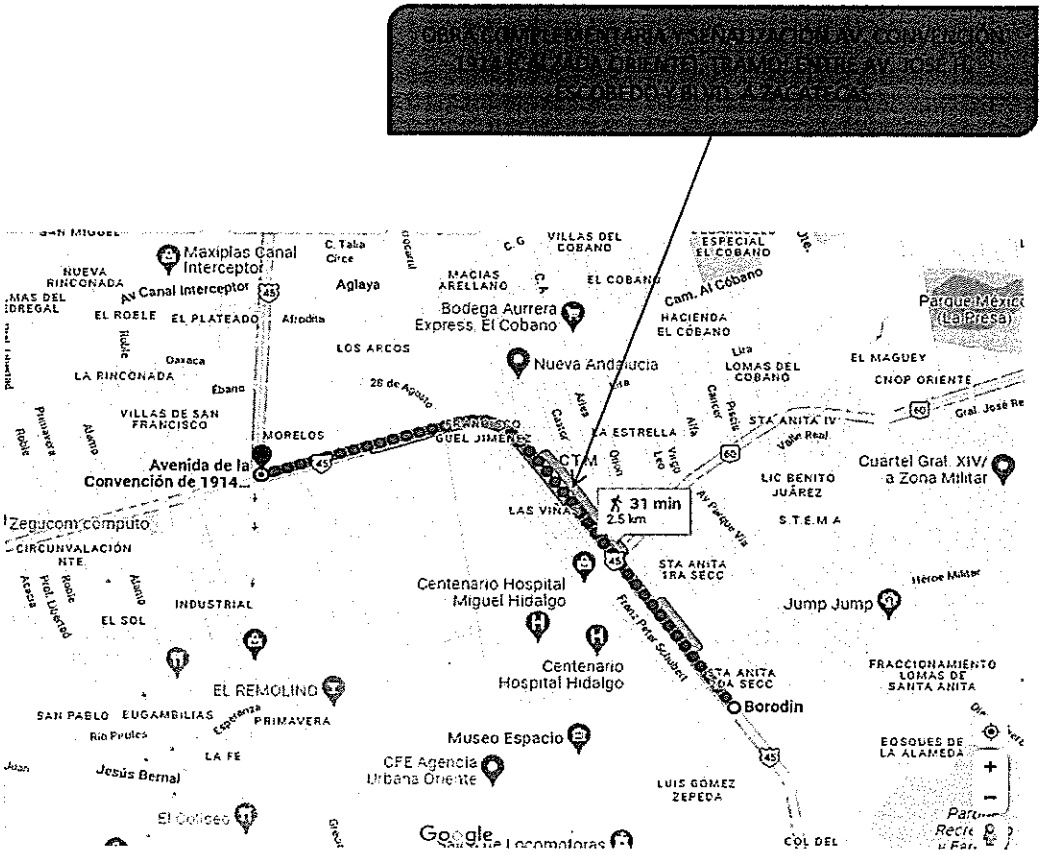



ING. RICARDO MACÍAS MERCADO
SUPERVISOR DE OBRA.

# H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
## SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
## DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA
# LOCALIZACION

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | DM-0055-2022 - OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. CONVENCIÓN 1914 (CALZADA ORIENTE) | | | | | |
| NO. DE CONT | DM-0055-2022 | CONTRATISTA: | ATECO, S.A. DE C.V. | | | |

OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. CONVENCIÓN 1914 (CALZADA ORIENTE), TRAMO: ENTRE AV. JOSÉ H. ESCOBEDO Y BLVD. A ZACATECAS

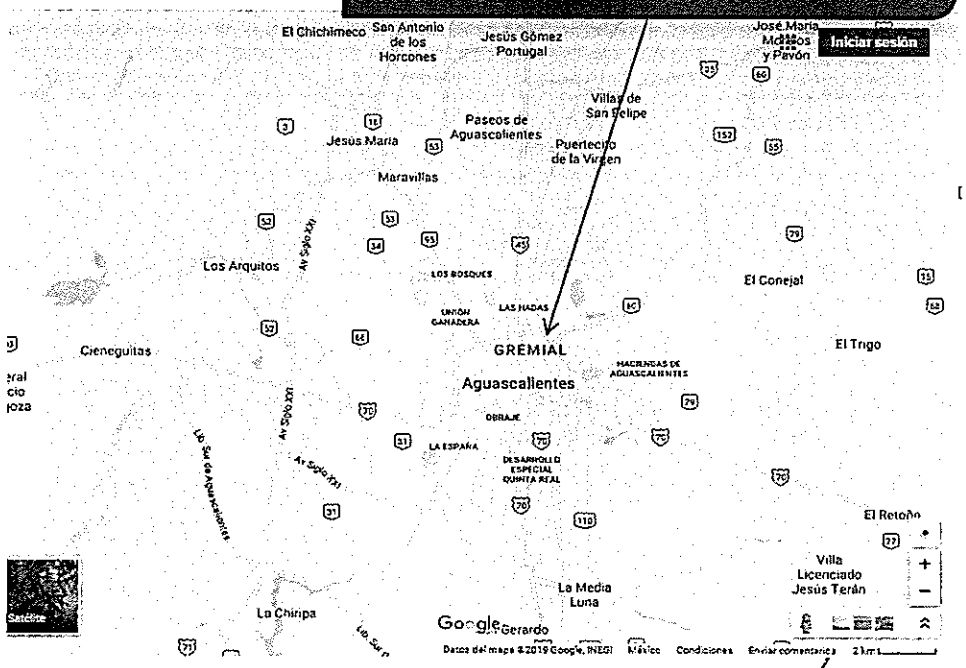


ING. RICARDO MACÍAS MERCADO
SUPERVISOR DE OBRA.

| RO3-POS-SOS-7.5.1-04 | |
|---|---|
| REVISION: | 00 |
| FECHA DE REVISION: | |
| RESPONSABLE: | SUPERVISOR DE OBRA |
| TIEMPO DE RET: | 02 AÑOS |

Aguascalientes

# PROGRAMA DE OBRA DEFINITIVO

No. DE CONTRATO : DM-0055-2022

PROGRAMA: UR-URBANIZACIÓN

INICIO VIGENTE: 11-junio-22

No. OBRA Y NOMBRE DE LA OBRA: DM-0055-2022 - OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. CONVENCIÓN 1914 (CALZADA ORIENTE)

TERMINO REAL: 10-julio-22

RECURSO 7 — 2022

| CONCEPTO | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | PONDERACIÓN % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO 11-jun | JULIO 10-jul | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | | | | | FINANCIERO | FÍSICO |
| DESCRIPCION | INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | % |
| DM-0055-2022 - OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. CONVENCIÓN 1914 (CALZADA ORIENTE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRUCE ENTRE AV. JOSÉ H. ESCOBEDO Y BLVD. A ZACATECAS, AGUASCALIENTES Mpio. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRELIMINARES | $ 535.48 | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 0.07 | 14.29 |
| OBRA COMPLEMENTARIA | $ 53,369.65 | 100 | | | | | | 30 | 70 | | | | | | | | | | 6.69 | 28.57 |
| SEÑALIZACION | $ 741,371.36 | 100 | | | | | | 40 | 60 | | | | | | | | | | 92.97 | 28.57 |
| EXTRAORDINARIOS | $ 2,191.03 | 100 | | | | | | 10 | 90 | | | | | | | | | | 0.27 | 28.57 |
| SUBTOTAL SIN IVA | $ 797,467.52 | $ 7.00 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 2 2 2 1 | 1 1 1 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | | |
| AVANCE SEMANAL % | | | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 29% 29% 29% 14% | 14% 14% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | | |
| AVANCE SEMANAL ACUMULADO % | | | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 29% 57% 71% 86% | 100% 100% 100% 100% | 100% 100% 100% 100% | 100% 100% 100% 100% | 100% 100% 100% 100% | 100% 100% 100% 100% | 100% 100% 100% 100% | 100% 100% 100% 100% | 100% 100% 100% 100% | 100% 100% 100% 100% | 100% 100% 100% 100% | | 100.00 | 100.00 |
| EJERCIDO SEMANAL $ | | | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | 10,546.17 333,907.30 444,822.02 | 219.10 1,971.93 - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | $ | 797,467.52 | |
| EJERCIDO MENSUAL $ | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $789,276.49 | $2,191.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $ | 127,594.80 | IVA 0% |
| EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO $ | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 789,276.49 | 797,467.52 | 797,467.52 | 797,467.52 | 797,467.52 | 797,467.52 | 797,467.52 | 797,467.52 | 797,467.52 | 797,467.52 | 797,467.52 | | |
| EJERCIDO SEMANAL % | | | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 1% 1% 1% 42% | 56% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | | |
| EJERCIDO MENSUAL % | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | GRAN TOTRAL EJERCIDO | |
| EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO % | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | $ | 925,062.32 |

ING. RICARDO GARCÍAS MERCADO
SUPERVISOR

# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

## FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

**GENERALES**

EJERCICIO: 2022 APROBACION No: 2022-PDM-0055-UR-05-010
LOCALIDAD: TRAMO: ENTRE AV. JOSÉ H. ESCOBEDO Y BLVD. A ZACATECAS, AGUASCALIENTES Mpio.
MUNICIPIO: AGUASCALIENTES, AGS
TIPO DE INVERSION: PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (1520 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS)

PROGRAMA: UR-URBANIZACIÓN
SUB-PROGRAMA: 05-VIALIDADES URBANAS, (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION) (C).- SEMAFOROS, SEÑALIZACION Y SICRONIZACION (SEÑALES, PLACAS, NOMENCLATURA, PINTURA Y OTRAS))

OBRA A REALIZARSE: DM-0055-2022 - OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. CONVENCIÓN 1914 (CALZADA ORIENTE)

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)
FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO NO. DE CONTRATO: DM-0055-2022
NOMBRE CONTRATISTA: ATECO, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: LUIS FERNANDO GUTIERREZ PADILLA, ARQ.
MONTO CONT. ORIGEN $939,729.58 ANTICIPO: $281,918.87 30 DIAS
1A AMPLIACION $: 0 1 AMPL DIAS 0
2A AMPLIACION $: 0 2 AMPL DIAS 0
FIRMA CONTRATO: 08/06/2022
INICIO CONT: dd/mm/aa 9 de junio de 2022 TERMINO CONT 8 de julio de 2022
INICIO REAL: dd/mm/aa 11 de junio de 2022 TERMINO REAL: 10 de julio de 2022

**TIPO DE OBRA PROPUESTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NUEVA CREACIÓN | | CONSOLIDACIÓN | |
| COMPLEMENTARIA | | AMPLIACIÓN | |
| REHABILITACIÓN | X | EQUIPAMIENTO | |

**CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:**

OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. CONVENCIÓN 1914 ORIENTE (CALZADA ORIENTE) en el tramo entre Av. José H. Escobedo y BLVD. a Zacatecas, ya que las bases de la vialidad se encuentras en buen estado (funcionables), se renivelarán los brocales de los pozos de visita y las tapas de registros de valvulas existentes en la calzada y se pintará la señaletica horizontal con pintura de trafico como se tiene la distribución vial según las normas de la SCT.

BUEN ESTADO X REGULAR PESIMO ESTADO

**FACTIBILIDAD DE LA OBRA: (CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA)**

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA OPERARSE

**PROCEDE:** SI: X NO:
MARQUE SOLO UNA

ING. RICARDO MACÍAS MERCADO
**SUPERVISOR**

# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

## FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

**GENERALES**

LOCALIDAD: TRAMO: ENTRE AV. JOSÉ H. ESCOBEDO Y BLVD. A ZACATECAS, AGUASCALIENTES Mpio.
MUNICIPIO: AGUASCALIENTES, AGS
PROGRAMA: UR-URBANIZACIÓN
SUB-PROGRAMA: 05-VIALIDADES URBANAS, (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION) (C).- SEMAFOROS, SEÑALIZACION Y SICRONIZACION (SEÑALES, PLACAS, NOMENCLATURA, PINTURA Y OTRAS))
OBRA A REALIZARSE: DM-0055-2022 - OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. CONVENCIÓN 1914 (CALZADA ORIENTE)

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)
FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO

**TIPO DE OBRA PROPUESTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NUEVA CREACIÓN | | CONSOLIDACIÓN | |
| COMPLEMENTARIA | | AMPLIACIÓN | |
| REHABILITACIÓN | X | EQUIPAMIENTO | |

**CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:**

OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. CONVENCIÓN 1914 ORIENTE (CALZADA ORIENTE) en el tramo entre Av. José H. Escobedo y BLVD. a Zacatecas, ya que las bases de la vialidad se encuentras en buen estado (funcionables), se renivelarán los brocales de los pozos de visita y las tapas de registros de valvulas existentes en la calzada y se pintará la señaletica horizontal con pintura de trafico como se tiene la distribución vial según las normas de la SCT.

**CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BUEN ESTADO: | X | REGULAR: | | PESIMO ESTADO: | |

**FACTIBILIDAD DE LA OBRA:**

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA OPERARSE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PROCEDE** | **SI:** | X | **NO:** | |

ING. RICARDO MACÍAS MERCADO
**SUPERVISOR**

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

## SECRETARIA DE OBRA PUBLICAS MUNICIPALES

DIRECCION DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA

**CONTRATO:** DM-0055-2022

**OBRA:** OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. CONVENCIÓN 1914 (CALZADA ORIENTE), TRAMO: ENTRE AV. JOSÉ H. ESCOBEDO Y BLVD. A ZACATECAS, AGUASCALIENTES Mpio.

**MONTO MODIFICADO FINAL:** $925,062.32

| VOLUMEN | UNIDAD | COMPONENTE DE OBRA | MONTO | PU |
|---|---|---|---|---|
| 1.94 | M3 | LIMPIA, CORTE CON DISCO, DEMOLICION, CARGA Y ACARREO | $ 535.48 | $ 276.02 |
| 4.00 | PZAS | RENIVELACIONES DE TAPAS DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE (POZOS, CAJAS DE VALVULAS, REGISTROS DE VOZ | $ 55,560.68 | $ 13,890.17 |
| 8692.28 | ML | SEÑALIZACION HORIZONTAL SEGÚN NORMA SCT | $ 741,371.36 | $ 85.29 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | $ 797,467.52 | |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

# PRESUPUESTO MODIFICADO

Aguascalientes

Obra: **OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. CONVENCIÓN 1914 (CALZADA ORIENTE)**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE AV. JOSÉ H. ESCOBEDO Y BLVD. A ZACATECAS, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **ATECO, S.A. DE C.V. (102)**

| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | GRUPO: **OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION** | | | | |
| | PARTIDA: **PRELIMINARES** | | | | |
| 1 | CORTE CON DISCO DIAMANTADO DE 14" EN PISOS DE CONCRETO ASFÁLTICO DE HASTA (HASTA 8.00 cm. DE PROFUNDIDAD). INCLUYE: TRAZO, EQUIPO Y OPERACIÓN, LIMPIEZAS. | ML | 0 | $29.93 | $0.00 |
| 2 | DEMOLICIÓN A MANO Y MECÁNICA DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y/O ASFÁLTICO EN CUALQUIER ESPESOR, EN PAVIMENTOS, LOSAS DIAMANTE, LOSAS DE CAJAS DE VÁLVULAS, LOSAS DE LLAVE HIDRAULICA, CAIMANES, ETC., CON O SIN ARMADO DE ACERO SIN RECUPERACIÓN., INCLUYE: CARGA Y ACARREO LOCAL DE MATERIAL AL LUGAR DE ACOPIO, HERRAMIENTA NECESARIA, CORTES CON DISCO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LIMPIEZA, TRABAJO TERMINADO. | M3 | 1.94 | $249.79 | $484.59 |
| 4 | CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO AL 1er. KM, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. | M3 | 1.94 | $26.23 | $50.89 |
| | | | | **Totales por Partida** | **$535.48** |
| | PARTIDA: **OBRA COMPLEMENTARIA** | | | | |
| 6 | RE NIVELACIÓN DE POZO DE VISITA HASTA 30 cm DE ALTURA. INCLUYE: RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE BROCAL EXISTENTE, DEMOLICIONES, NIVELADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 28 cm DE ESPESOR, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 , PLOMEADO, NIVELADO, DEMOLICIONES, CARGAS Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL. | PZA | 4 | $2,808.50 | $11,234.00 |
| 7 | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DIAMANTE A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR= 45 KG/CM2, T.M.A. 3/4" (19 mm), GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 8+-2.5 cm, RESISTENCIA RÁPIDA A 3 DÍAS, DE 25 CM DE ESPESOR, EN POZO DE VISITA, SECCIÓN DE 1.50 M X 1.50 M , INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA PREVIA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, COMPACTACIÓN DE TERRENO AL 95% DE SU PVSM, ESCARIFICADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE APROCHES, ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD EN TODO EL PERÍMETRO EXTERIOR DE 1/2", ASÍ COMO EN LAS JUNTAS DIAGONALES PARA FORMAR 4 PARTES, BROCAL Y TAPA DE Fo. Fo. TIPO PESADO (165 KG), CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA QUÍMICA BASE AGUA, APLANADO FINO EN RECEPCIÓN DE BROCAL, CORTES CON CORTADORA DE DISCO DE 5 CM ENTRE JUNTAS DIAGONALES FORMANDO 8 PIEZAS Y SELLADO DE JUNTAS, CORTES RELLENOS CON MATERIAL PREFORMADO Y SELLADOR AUTONIVELANTE, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREOS DE MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | PZA | 4 | $7,886.72 | $31,546.88 |
| 9 | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE POZOS DE VISITA Y LÍNEAS DE ALCANTARILLADO EXISTENTE CON CAMIÓN TIPO VACTOR. INCLUYE: RESANE INTERIOR DEL POZO Y REMATE DE POZO CON TUBO SELLADOR FESTER Y MORTERO 1:3, MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LIMPIEZAS, RENTA DE CAMIÓN VACTOR HASTA LA CORRECTA LIMPIEZA DE LAS LÍNEAS EXISTENTES DE POZO A POZO ASÍ COMO EL TRASLADO DE LOS DESECHOS HASTA TIRADERO AUTORIZADO, LA UNIDAD DE MEDIDA SE PAGARA DE POZO A POZO. | LOTE | 3 | $3,529.59 | $10,588.77 |
| | | | | **Totales por Partida** | **$53,369.65** |

Obra: **OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. CONVENCIÓN 1914 (CALZADA ORIENTE)**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE AV. JOSÉ H. ESCOBEDO Y BLVD. A ZACATECAS, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **ATECO, S.A. DE C.V. (102)**

| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | GRUPO: **OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION** | | | | |
| | PARTIDA: **SEÑALIZACION HORIZONTAL** | | | | |
| 14 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE COLOR AZUL (PANTONE 294) EN RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CUALQUIER SECCIÓN SEGÚN PLANOS. INCLUYE: TRAZO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO. (pintura esmalte, area efectiva) | M2 | 14.54 | $125.29 | $1,821.72 |
| 15 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE PARA INDICAR "CRUCE PEATONAL EN CAJON DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD", COLOR AZUL (PANTONE 294) DE 0.40 MTS DE ANCHO Y LONGITUD VARIABLE, CON UNA SEPARACIÓN DE 0.40 MTS. ENTRE ELLAS, INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO. (pintura esmalte, area efectiva) | M2 | 14.31 | $141.88 | $2,030.30 |
| 16 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LOGOTIPO A (SILLA DE RUEDAS) EN PINTURA BASE SOLVENTE COLOR BLANCO EN RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD TAMAÑO Y DISEÑO SEGÚN PLANOS. INCLUYE: TRAZO, ENMASCARILLADO, PLANTILLA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 6 | $244.97 | $1,469.82 |
| 17 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LOGOTIPO B (SILLA DE RUEDAS) EN PINTURA BASE SOLVENTE COLOR BLANCO CON FONDO AZUL (PANTONE 294) EN CAJON DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD TAMAÑO Y DISEÑO SEGÚN PLANOS. INCLUYE: TRAZO, ENMASCARILLADO, PLANTILLA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 7 | $357.30 | $2,501.10 |
| 18 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE PARA MARCAS EN GUARNICIONES CLASIFICACION M-12.1, M12.2 APLICADA SOBRE GUARNICIONES Y DENTELLONES DE CUALQUIER COLOR, SEGÚN SE REQUIERA Y SEGÚN NORMA S.C.T. SECADO AL TACTO EN 5 MIN Y AL DURO EN 30 MIN CON MICRO ESFERA , DESARROLLO DE 35 CM. INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, TRAZO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO. (pintura esmalte, ML efectivo) | ML | 3476.16 | $47.36 | $164,630.94 |
| 19 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE " EN RAYA SEPARADORA CLASIFICACIÓN M - 1.1, LÍNEA CONTINUA SENCILLA DE DIVISIÓN DE CARRILES DE FRENTE EN PISO, DE 10 CM DE ANCHO, COLOR BLANCO Y/O AMARILLO CON MICRO ESFERA SEGÚN NORMA SCT, SECADO AL TACTO EN 5 MIN Y AL DURO EN 30 MIN. INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO. | ML | 735.1 | $40.68 | $29,903.87 |

Obra: **OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. CONVENCIÓN 1914 (CALZADA ORIENTE)**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE AV. JOSÉ H. ESCOBEDO Y BLVD. A ZACATECAS, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **ATECO, S.A. DE C.V. (102)**

| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | GRUPO: **OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION** | | | | |
| | PARTIDA: **SEÑALIZACION HORIZONTAL** | | | | |
| 20 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE " EN RAYA SEPARADORA CLASIFICACIÓN M - 1.2, DISCONTINUA SENCILLA, DE DIVISIÓN DE CARRILES PARA VELOCIDADES MENORES A 60 KM/HR DE FRENTE EN PISO, DESARROLLO DE 2.50 ML X 0.10 MTS DE ANCHO, CON UNA SEPARACIÓN DE 5.00 MTS ENTRE SI PROMEDIO, A BASE DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR BLANCO CON MICRO ESFERA SEGÚN NORMA SCT, INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO. | ML | 702.5 | $38.83 | $27,278.08 |
| 21 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE " EN RAYA SEPARADORA CLASIFICACIÓN M -1.6, CONTINUA DOBLE, PARA DELIMITAR CARRIL EXCLUSIVO DE FRENTE EN PISO, 0.10 MTS DE ANCHO, CON UNA SEPARACIÓN IGUAL AL ANCHO DE LA LINEA A BASE DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO CON MICRO ESFERA SEGÚN NORMA SCT, INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO. | ML | 145 | $53.04 | $7,690.80 |
| 22 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE " EN RAYA SEPARADORA DE CARRILES CLASIFICACIÓN M - 2.2 LÍNEA CONTINUA DOBLE DE DIVISIÓN DE CARRILES DE FRENTE EN PISO, DE 10 CM DE ANCHO Y SEPARACIÓN IGUAL AL ANCHO DE LINEA, COLOR BLANCO Y/O AMARILLO CON MICRO ESFERA SEGÚN NORMA SCT, SECADO AL TACTO EN 5 MIN Y AL DURO EN 30 MIN. INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, ¡TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO. | ML | 33 | $69.07 | $2,279.31 |
| 23 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE " EN RAYA SEPARADORA CLASIFICACIÓN M - 3.3, CONTINUA IZQUIERDA, PARA VIALIDADES URBANAS DE FRENTE EN PISO, SEPARADA 15 CM. DE LA GUARNICION, A BASE DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR BLANCO CON MICRO ESFERA SEGÚN NORMA SCT, INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO. | ML | 2699.28 | $40.68 | $109,806.71 |

Obra: **OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. CONVENCIÓN 1914 (CALZADA ORIENTE)**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE AV. JOSÉ H. ESCOBEDO Y BLVD. A ZACATECAS, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **ATECO, S.A. DE C.V. (102)**

| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | GRUPO: **OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION** | | | | |
| | PARTIDA: **SEÑALIZACION HORIZONTAL** | | | | |
| 25 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE " EN RAYA CANALIZADORA CLASIFICACIÓN M - 5, PARA INDICAR ENTRADA Y SALIDA EN BIFURCACIONES, COLOR BLANCO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN NORMA SCT DE 0.20 MTS DE ANCHO DE LONGITUD Y TRAZO VARIABLE (SEGUN PROYECTO), INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO. | ML | 255.44 | $53.60 | $13,691.58 |
| 26 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE " EN RAYA DE ALTO CLASIFICACIÓN M - 6, PARA INDICAR ALTO EN CRUCEROS, COLOR BLANCO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN NORMA SCT DE 0.60 MTS DE ANCHO DE LONGITUD VARIABLE, INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO. | ML | 71.3 | $144.45 | $10,299.28 |
| 27 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE " EN RAYA PARA CRUCE PEATONAL CLASIFICACIÓN M - 7.1, PARA INDICAR " CRUCE PEATONAL EN VIAS PRIMARIAS", COLOR AMARILLO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN NORMA SCT DE 0.40 MTS DE ANCHO Y 3.5 MTS. DE LONGITUD POR EL ANCHO DE LA VIALIDAD, CON UNA SEPARACIÓN DE 0.40 MTS. ENTRE ELLAS, INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO. | M2 | 201.18 | $176.83 | $35,574.66 |
| 28 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE " EN FLECHAS CLASIFICACIÓN M - 11.1, "FLECHA SENCILLA" PARA INDICAR SENTIDO DE CIRCULACIÓN , EN VIALIDADES PARA VELOCIDAD MENOR A 60KM POR HORA DIFERENTES DIMENSIONES (VER PLANO DE SEÑALAMIENTOS) COLOR BLANCO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN NORMA SCT, INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 36 | $294.71 | $10,609.56 |
| 29 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE " EN FLECHAS CLASIFICACIÓN M - 11.1, " FLECHA CABEZA DOBLE" PARA INDICAR SENTIDO DE CIRCULACIÓN (VUELTA IZQUIERDA O DERECHA) , EN VIALIDADES PARA VELOCIDAD MENOR A 60KM POR HORA DIFERENTES DIMENSIONES (VER PLANO DE SEÑALAMIENTOS) COLOR BLANCO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN NORMA SCT, INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 4 | $403.73 | $1,614.92 |

Obra: **OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. CONVENCIÓN 1914 (CALZADA ORIENTE)**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE AV. JOSÉ H. ESCOBEDO Y BLVD. A ZACATECAS, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **ATECO, S.A. DE C.V. (102)**

| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | GRUPO: **OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION** | | | | |
| | PARTIDA: **SEÑALIZACION HORIZONTAL** | | | | |
| 30 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE " EN LETRAS Y NUMEROS CLASIFICACIÓN M - 11.1 "LETRAS Y NUMEROS" EN VIALIDADES PARA VELOCIDAD MENOR A 60KM POR HORA DIFERENTES DIMENSIONES (VER PLANO DE SEÑALAMIENTOS) COLOR BLANCO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN NORMA SCT DE (VER DETALLES EN PLANOS) INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 156 | $402.96 | $62,861.76 |
| 31 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE " EN LETRAS Y NUMEROS CLASIFICACIÓN M - 11.2 "FLECHA SIN CUERPO" PARA ESTABLECER LUGARES DE PARADA, (VER PLANO DE SEÑALAMIENTOS) COLOR BLANCO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN NORMA SCT DE (VER DETALLES EN PLANOS) INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 15 | $423.19 | $6,347.85 |
| 32 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE " EN LETRAS Y NUMEROS CLASIFICACIÓN M - 11.2 "LEYENDA SOLO BUS" PARA VELOCIDAD MENOR A 60KM POR HORA DIFERENTES DIMENSIONES (VER PLANO DE SEÑALAMIENTOS) COLOR BLANCO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN NORMA SCT DE (VER DETALLES EN PLANOS) INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 5 | $1,560.43 | $7,802.15 |
| 33 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE " EN LETRAS Y NUMEROS CLASIFICACIÓN M - 11.4 "L INVERTIDA" PARA ESTABLECER LUGAR DE PARADA CUYO LADO MAYOR EN UNA LÍNEA DE 20 CM DE ANCHO POR 20 MTS DE LARGO Y SU LADO MENOR EN UNA LÍNEA DE 50 CM DE ANCHO POR EL ANCHO DEL CARRIL, SOBRE PAVIMENTO EN VIALIDADES PARA VELOCIDAD MENOR A 60KM POR HORA DIFERENTES DIMENSIONES (VER PLANO DE SEÑALAMIENTOS) COLOR BLANCO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN NORMA SCT DE (VER DETALLES EN PLANOS) INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 5 | $1,458.27 | $7,291.35 |
| 34 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA STANDARD (S-200) DE 10X10CM. COLOR: CUERPO AMARILLO Y/O BLANCO Y REFLEJANTE AMARILLO 1 CARA MARCA SEA O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE FICHA TÉCNICA, FIJADO EN PAVIMENTO CON SISTEMA DE SUJECIÓN DE ALTO AGARRE PEGAMENTO EPOXICO 100 A/B (RESINA EPÓXICA/RESINA POLIAMIDA MODIFICADA), RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (VER PLANO DE DETALLES DE SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL), INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE LA SUPERFICIE, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZO, ALINEACIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 735 | $67.98 | $49,965.30 |

Obra: **OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. CONVENCIÓN 1914 (CALZADA ORIENTE)**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE AV. JOSÉ H. ESCOBEDO Y BLVD. A ZACATECAS, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **ATECO, S.A. DE C.V. (102)**

| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO: **OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION** | | | | | |
| PARTIDA: **SEÑALIZACION HORIZONTAL** | | | | | |
| 35 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA SOLAR DE 10X10CM. COLOR: CUERPO ALUMINIO 3 LED DOS CARAS REFLEJANTES MARCA CREATIVAL VT-29 O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE FICHA TÉCNICA, FIJADO EN PAVIMENTO CON SISTEMA DE SUJECIÓN DE ALTO AGARRE PEGAMENTO EPOXICO 100 A/B (RESINA EPÓXICA/RESINA POLIAMIDA MODIFICADA), RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (VER PLANO DE DETALLES DE SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL), INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE LA SUPERFICIE+C92, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZO, ALINEACIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 245 | $587.21 | $143,866.45 |
| 36 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOYA DE PLÁSTICO OJO DE GATO (VT-38). MARCA CREATIVIAL O SIMILAR EN CALIDAD, CON REFLEJANTE COLOR BLANCO GRADO ALTA INTENSIDAD. FIJACIÓN A SUPERFICIE asfaltica CON CLAVOS DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALINEADO, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO. | PZA | 185 | $227.21 | $42,033.85 |
| | | | | **Totales por Partida** | **$741,371.36** |
| | | | | **Totales por Grupo** | **$795,276.49** |

Obra: **OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. CONVENCIÓN 1914 (CALZADA ORIENTE)**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE AV. JOSÉ H. ESCOBEDO Y BLVD. A ZACATECAS, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **ATECO, S.A. DE C.V. (102)**

| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | GRUPO: **EXTRAORDINARIO** | | | | |
| | PARTIDA: **EXTRAORDINARIO** | | | | |
| 43 | RENIVELACIONES CON CONCRETO ASFALTICO MEZCLA EN PLANTA EN CALIENTE ASFALTO MODIFICADO CON POLIMERO TIPO I, CUMPLIENDO LAS NORMAS SCT REFERENTES DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION. GRANULOMETRIA DENSA 3/4" A FINOS MEDIDO COMPACTO AL NOVENTAY CINCO POR CIENTO (95%), INCLUYE:CARGA Y ACARREO EN RAMOS AISLADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES, Y MAQUINARIA Y EQUIPO AL SIGUIENTE PUNTO EN CUALQUIER VOILUMEN, PERFILADO, LIMPIEZA DE HUESO Y GRAVA SUELTA, TABAJO TERMINADO, P.U.O.T | M3 | 1.69 | $6,911.74 | $11,680.84 |
| 44 | INDIRECTOS NO COMPROBADOS (DEDUCTIVA) | OBRA | -1.18622625 | $8,000.00 | -$9,489.81 |
| | | | **Totales por Partida** | | **$2,191.03** |
| | | | **Totales por Grupo** | | **$2,191.03** |
| | | | **Totales Presup.** | | **$797,467.52** |
| | | | **Anticipo** | **+** | **$243,033.51** |
| | | | **Amortizac. Ant.** | **-** | **$243,033.51** |
| | | | **SubTotal. Ant.** | **=** | **$797,467.52** |
| | | | **IVA** | **+** | **$127,594.80** |
| | | | **Total** | **=** | **$925,062.32** |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

# PRESUPUESTO MODIFICADO

Aguascalientes

Obra: **OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. CONVENCIÓN 1914 (CALZADA ORIENTE)**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE AV. JOSÉ H. ESCOBEDO Y BLVD. A ZACATECAS, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **ATECO, S.A. DE C.V. (102)**

| Grupo | Partida | Importe |
|---|---|---|
| **OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION** | | |
| | PRELIMINARES | $535.48 |
| | OBRA COMPLEMENTARIA | $53,369.65 |
| | SEÑALIZACION HORIZONTAL | $741,371.36 |
| | **Subtotal por Grupo** | **$795,276.49** |
| **EXTRAORDINARIO** | | |
| | EXTRAORDINARIO | $2,191.03 |
| | **Subtotal por Grupo** | **$2,191.03** |

| | | |
|---|---|---|
| **Totales Presup.** | | **$797,467.52** |
| **Anticipo** | + | **$243,033.51** |
| **Amortizac. Ant.** | - | **$243,033.51** |
| **SubTotal. Ant.** | = | **$797,467.52** |
| **IVA** | + | **$127,594.80** |
| **Total** | = | **$925,062.32** |


H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**
**DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA**


Aguascalientes
LA CIUDAD ES TU VIDA

# MEMORIA FOTOGRAFICA


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | DM-0055-2022 - OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. CONVENCIÓN 1914 (CALZADA ORIENTE) | | | | |
| NO. DE CONTRATO: | DM-0055-2022 | | CONTRATISTA: | ATECO, S.A. DE C.V. | |

## INICIO.

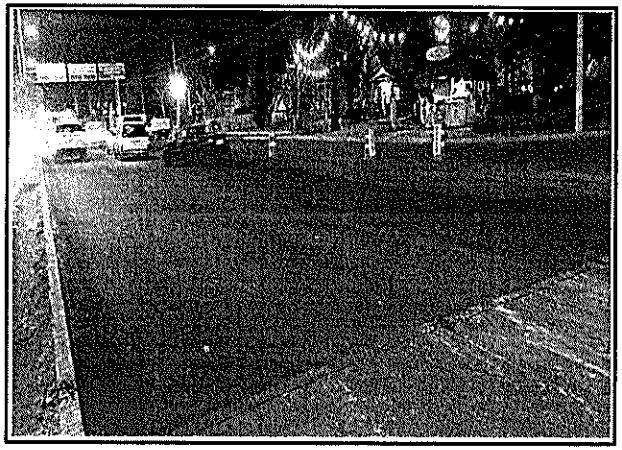





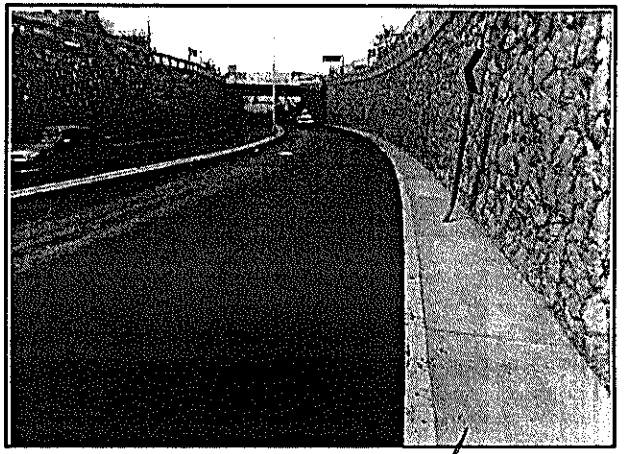

ING. RICARDO MACÍAS MERCADO
SUPERVISOR DE OBRA.


SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

# MEMORIA FOTOGRAFICA


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | DM-0055-2022 - OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. CONVENCIÓN 1914 (CALZADA ORIENTE) | | | | | |
| NO. DE CONTRATO: | DM-0055-2022 | | CONTRATISTA: | ATECO, S.A. DE C.V. | | |

## PROCESO

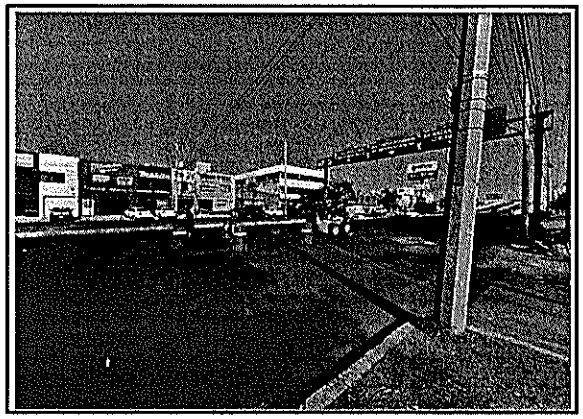





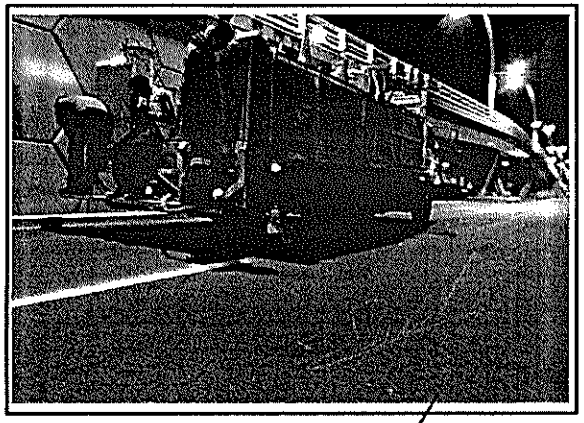

ING. RICARDO MACÍAS MERCADO
SUPERVISOR DE OBRA.

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**

**DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA**


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

# MEMORIA FOTOGRAFICA


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | DM-0055-2022 - OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. CONVENCIÓN 1914 (CALZADA ORIENTE) | | | | | |
| NO. DE CONTRATO: | DM-0055-2022 | | CONTRATISTA: | ATECO, S.A. DE C.V. | | |

## TERMINO




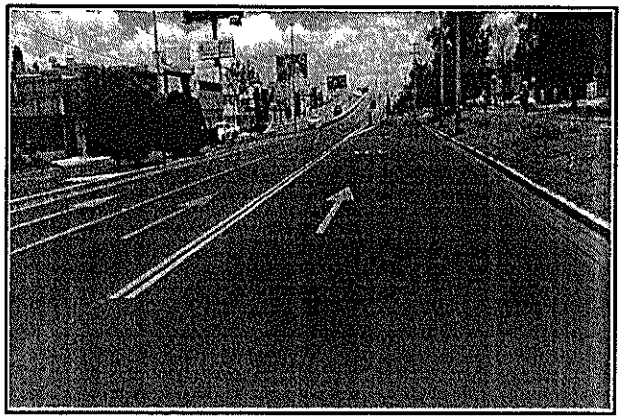



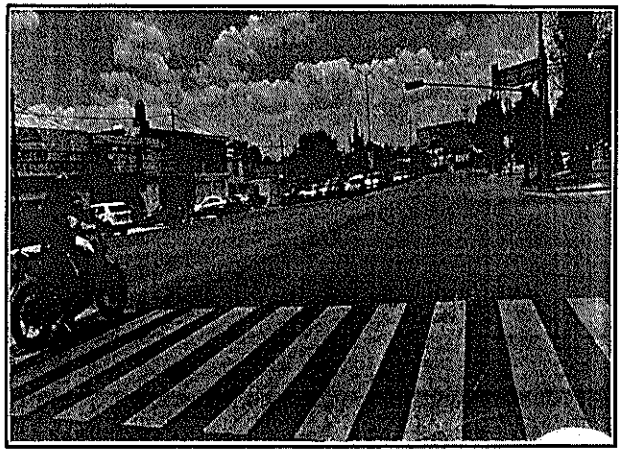

ING. RICARDO MACÍAS MERCADO
SUPERVISOR DE OBRA.

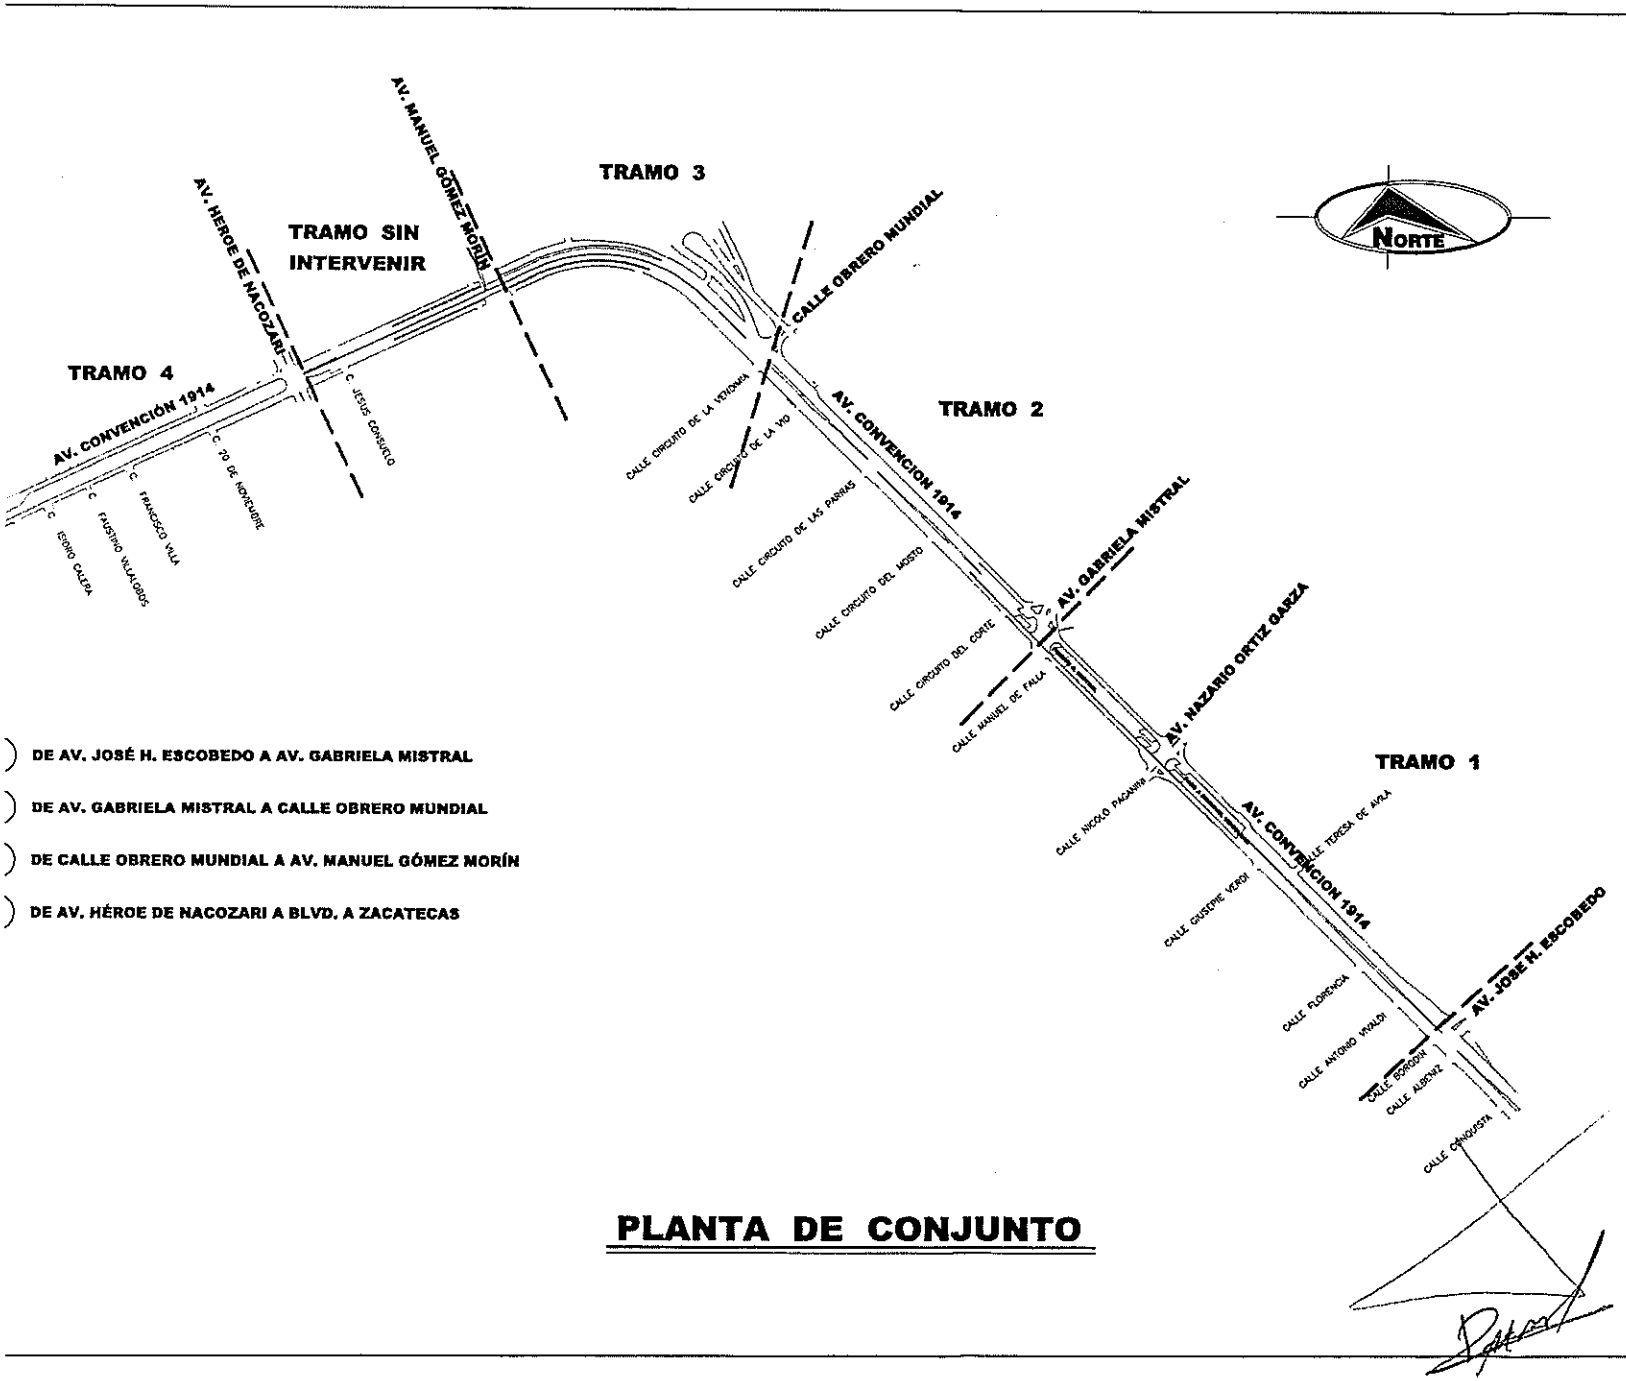


) DE AV. JOSÉ H. ESCOBEDO A AV. GABRIELA MISTRAL


) DE AV. GABRIELA MISTRAL A CALLE OBRERO MUNDIAL

) DE CALLE OBRERO MUNDIAL A AV. MANUEL GÓMEZ MORÍN

) DE AV. HÉROE DE NACOZARI A BLVD. A ZACATECAS

# PLANTA DE CONJUNTO

LOCALIZACIÓN:



CONTRATISTA:

ATECO

PLANOS ACTUALIZADOS

DM-0055-2022

PROYECTO:
OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. CIRCUNVALACIÓN 1914 (CALZADA ORIENTE)

UBICACIÓN:
AV. CIRCUNVALACIÓN 1914 (CALZADA ORIENTE) TRAMO ENTRE BLVD. A ZACATECAS Y AV. JOSÉ H. ESCOBEDO

CONTRATO:
DM-0055-2022


CONTRATISTA:
ATECO S.A. DE C.V.

SUPERVISOR:
ING. RICARDO MACÍAS MERCADO


CONTENIDO:
PLANTA CONJUNTO

| ESCALA: | FECHA: |
|---|---|
| SIN ESCALA | JULIO 2022 |

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

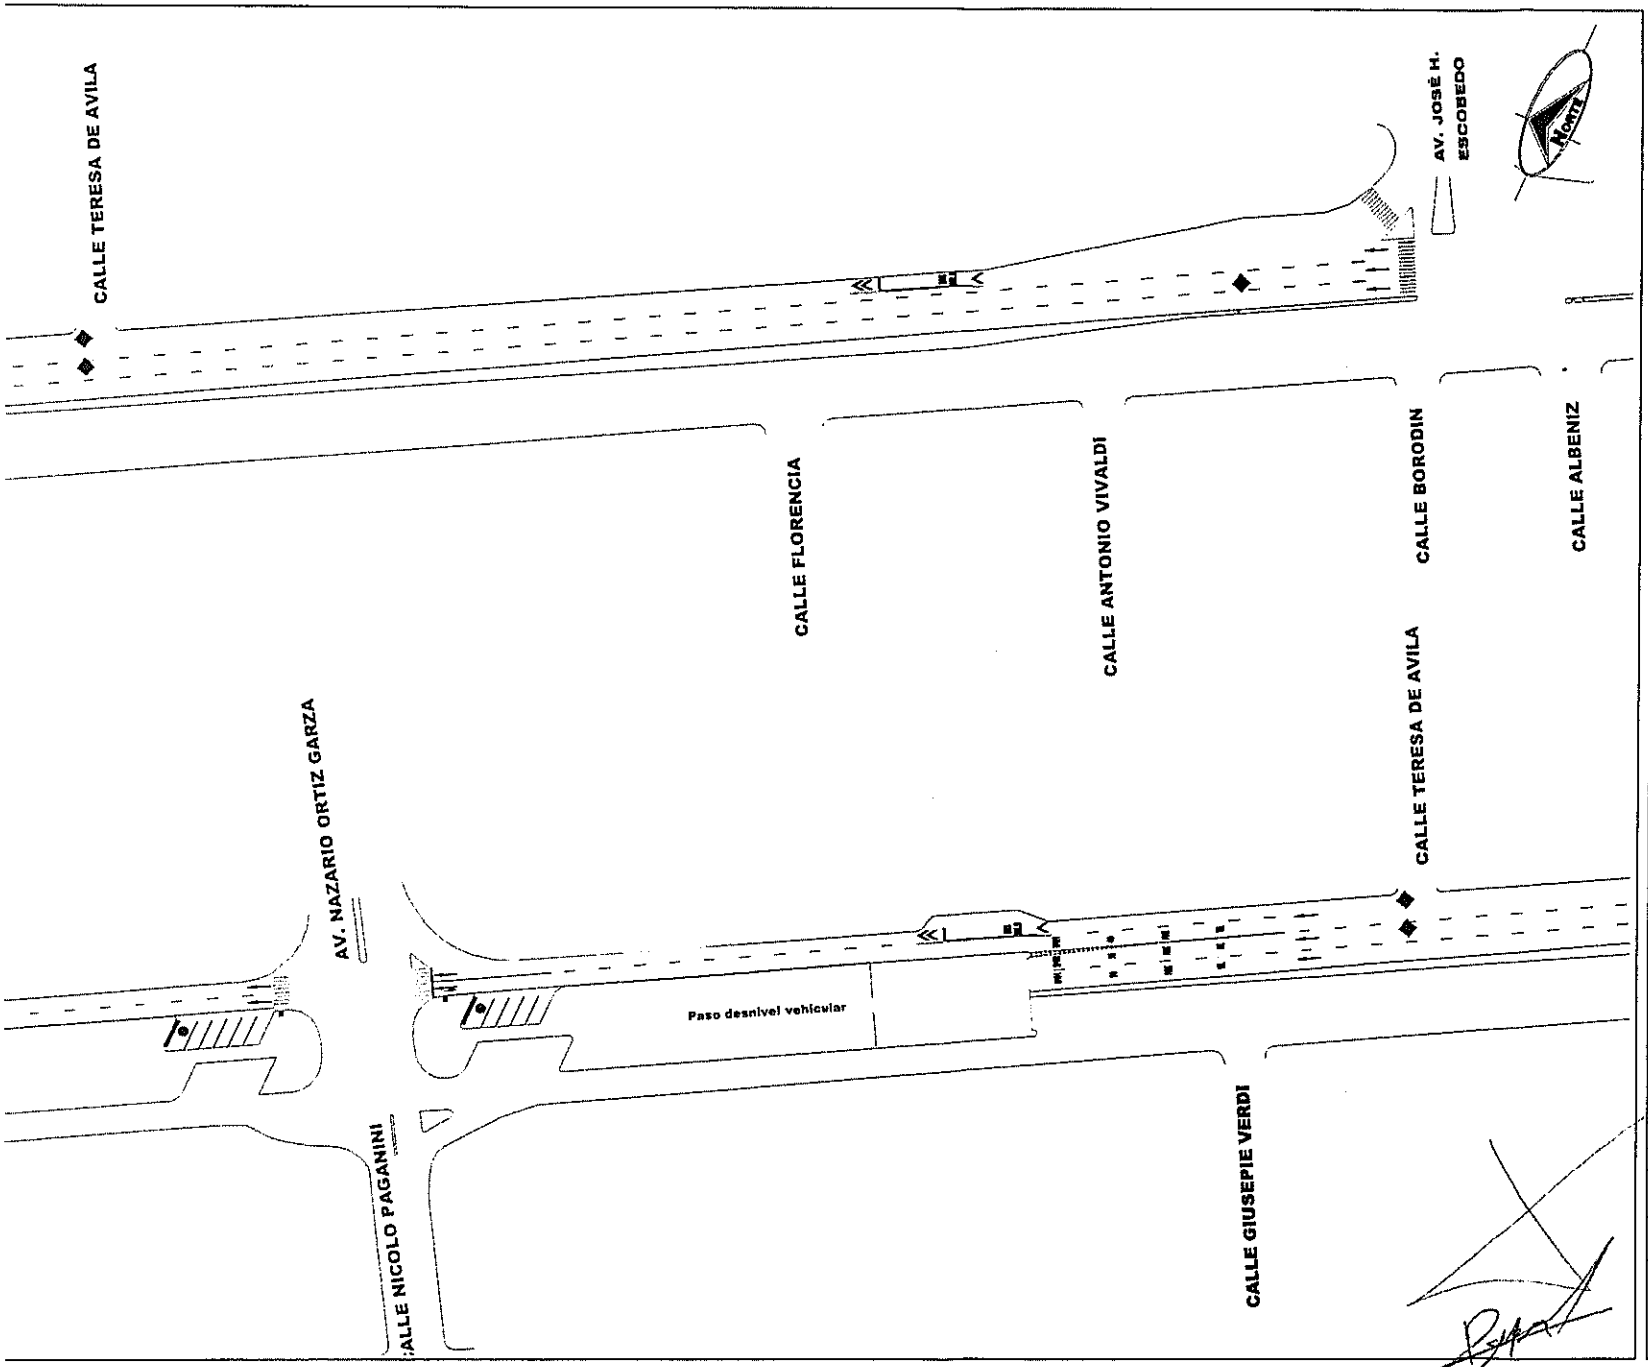


LOCALIZACIÓN:



CONTRATISTA:

ATECO

## SIMBOLOGÍA

- BANQUETAS
- PARAMENTO
- VIALETA ESTANDAR
- VIALETA SOLAR
- FLECHA DE SENTIDO
- LINEAS AMARILLAS DE CRUCE PEATONAL
- LINEA DE ALTO
- POZO DE VISITAS
- CAJA DE VÁLVULAS
- CAMÁN
- PARADA DE AUTOBUS

PROYECTO:
OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. CIRCUNVALACIÓN 1914 (CALZADA ORIENTE)

UBICACIÓN:
AV. CIRCUNVALACIÓN 1914 (CALZADA ORIENTE) TRAMO ENTRE BLVD. A ZACATECAS Y AV. JOSÉ H. ESCOBEDO

CONTRATO:
DM-0055-2022


CONTRATISTA:
ATECO S.A. DE C.V.

SUPERVISOR:
ING. RICARDO MACÍAS MERCADO


CONTENIDO:
SEÑALIZACIÓN 01

| ESCALA: | FECHA: |
|---|---|
| SIN ESCALA | JULIO 2022 |

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

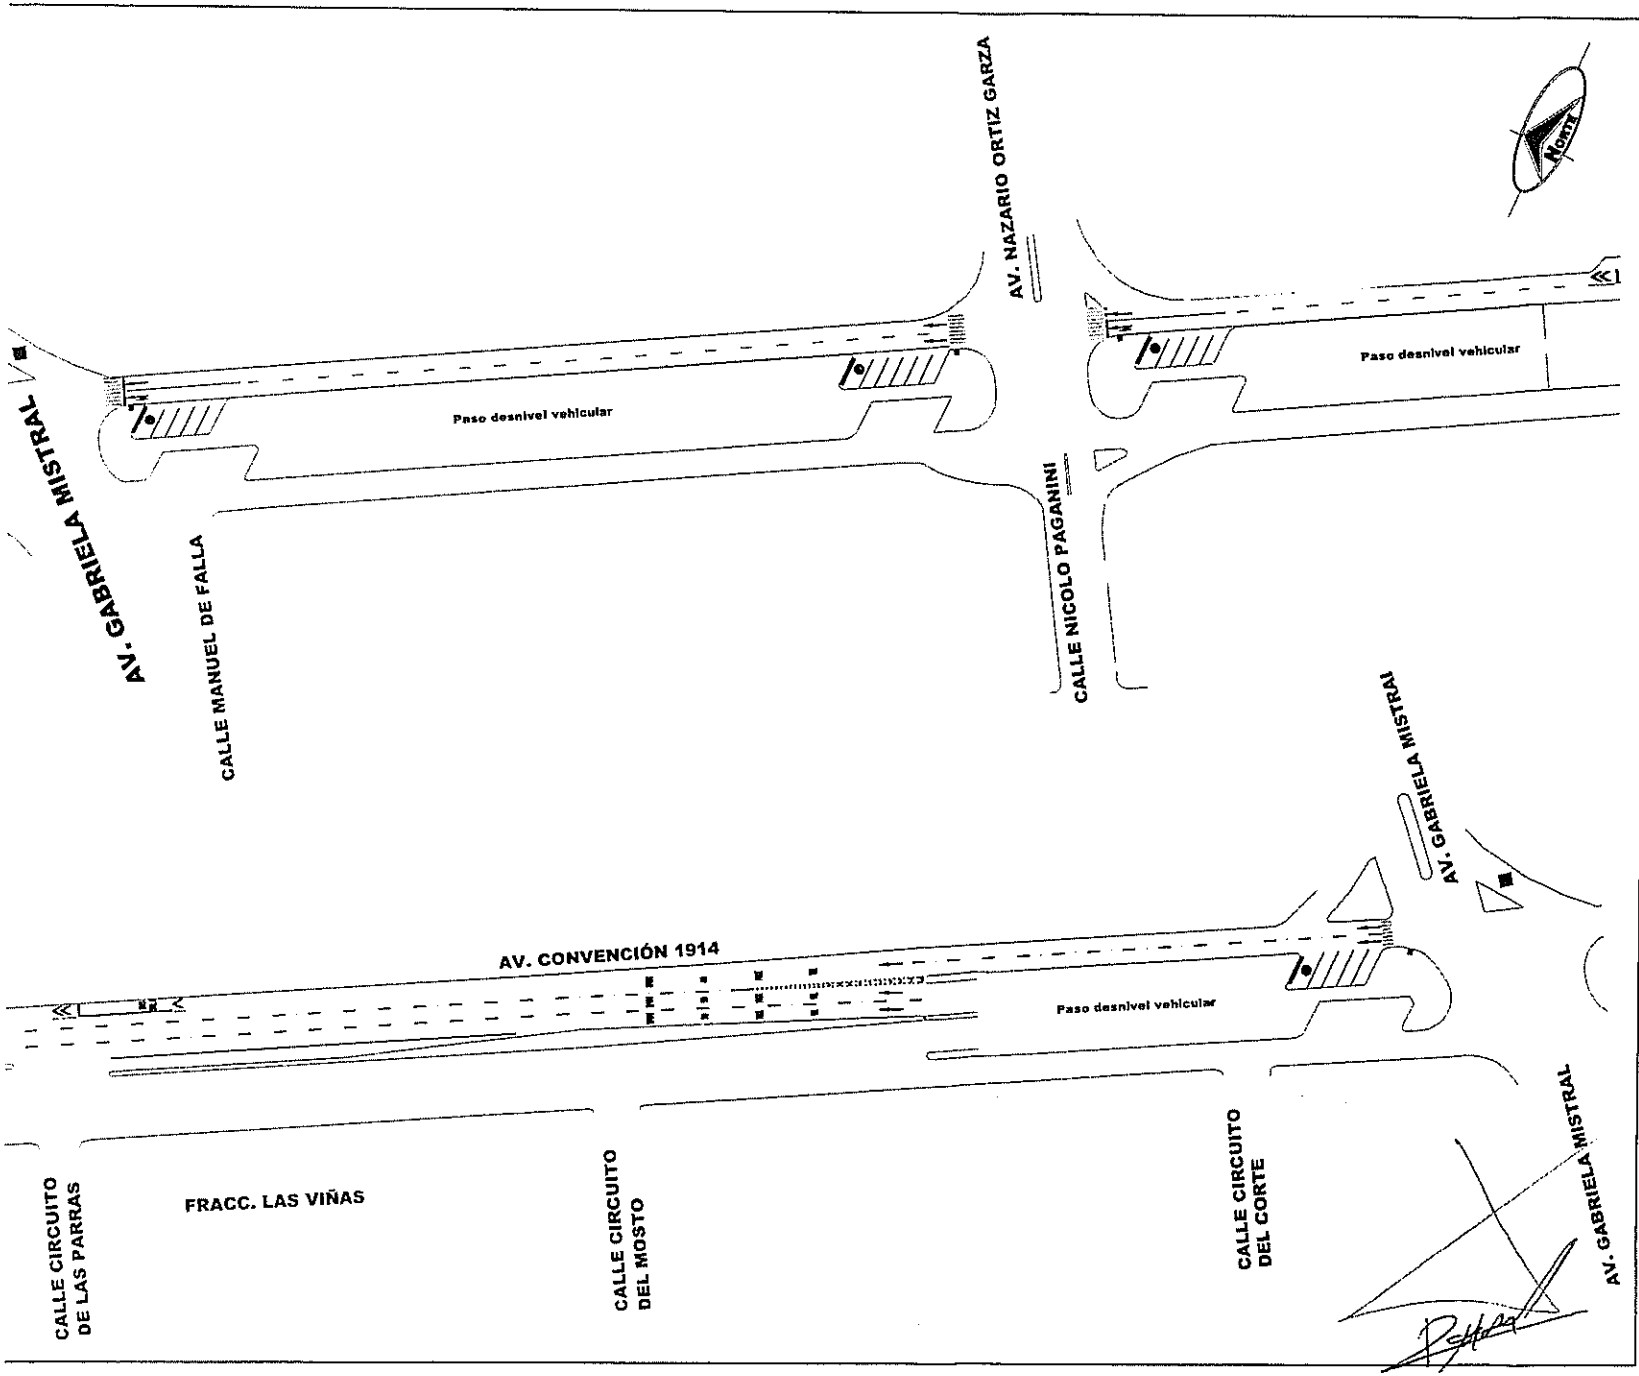


LOCALIZACIÓN:



CONTRATISTA:

ATECO

## SIMBOLOGÍA

- BANQUETAS
- PARAMENTO
- VIALETA ESTANDAR
- VIALETA SOLAR
- FLECHA DE SENTIDO
- LINEAS AMARILLAS DE CRUCE PEATONAL
- LINEA DE ALTO
- POZO DE VISITAS
- CAJA DE VÁLVULAS
- CAIMÁN
- PARADA DE AUTOBUS

PROYECTO:
OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. CIRCUNVALACIÓN 1914 (CALZADA ORIENTE)

UBICACIÓN:
AV. CIRCUNVALACIÓN 1914 (CALZADA ORIENTE) TRAMO ENTRE BLVD. A ZACATECAS Y AV. JOSÉ H. ESCOBEDO

CONTRATO:
DM-0055-2022


CONTRATISTA:
ATECO S.A. DE C.V.

SUPERVISOR:
ING. RICARDO MACÍAS MERCADO


CONTENIDO:
SEÑALIZACIÓN 02

| ESCALA: | FECHA: |
|---|---|
| SIN ESCALA | JULIO 2022 |

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

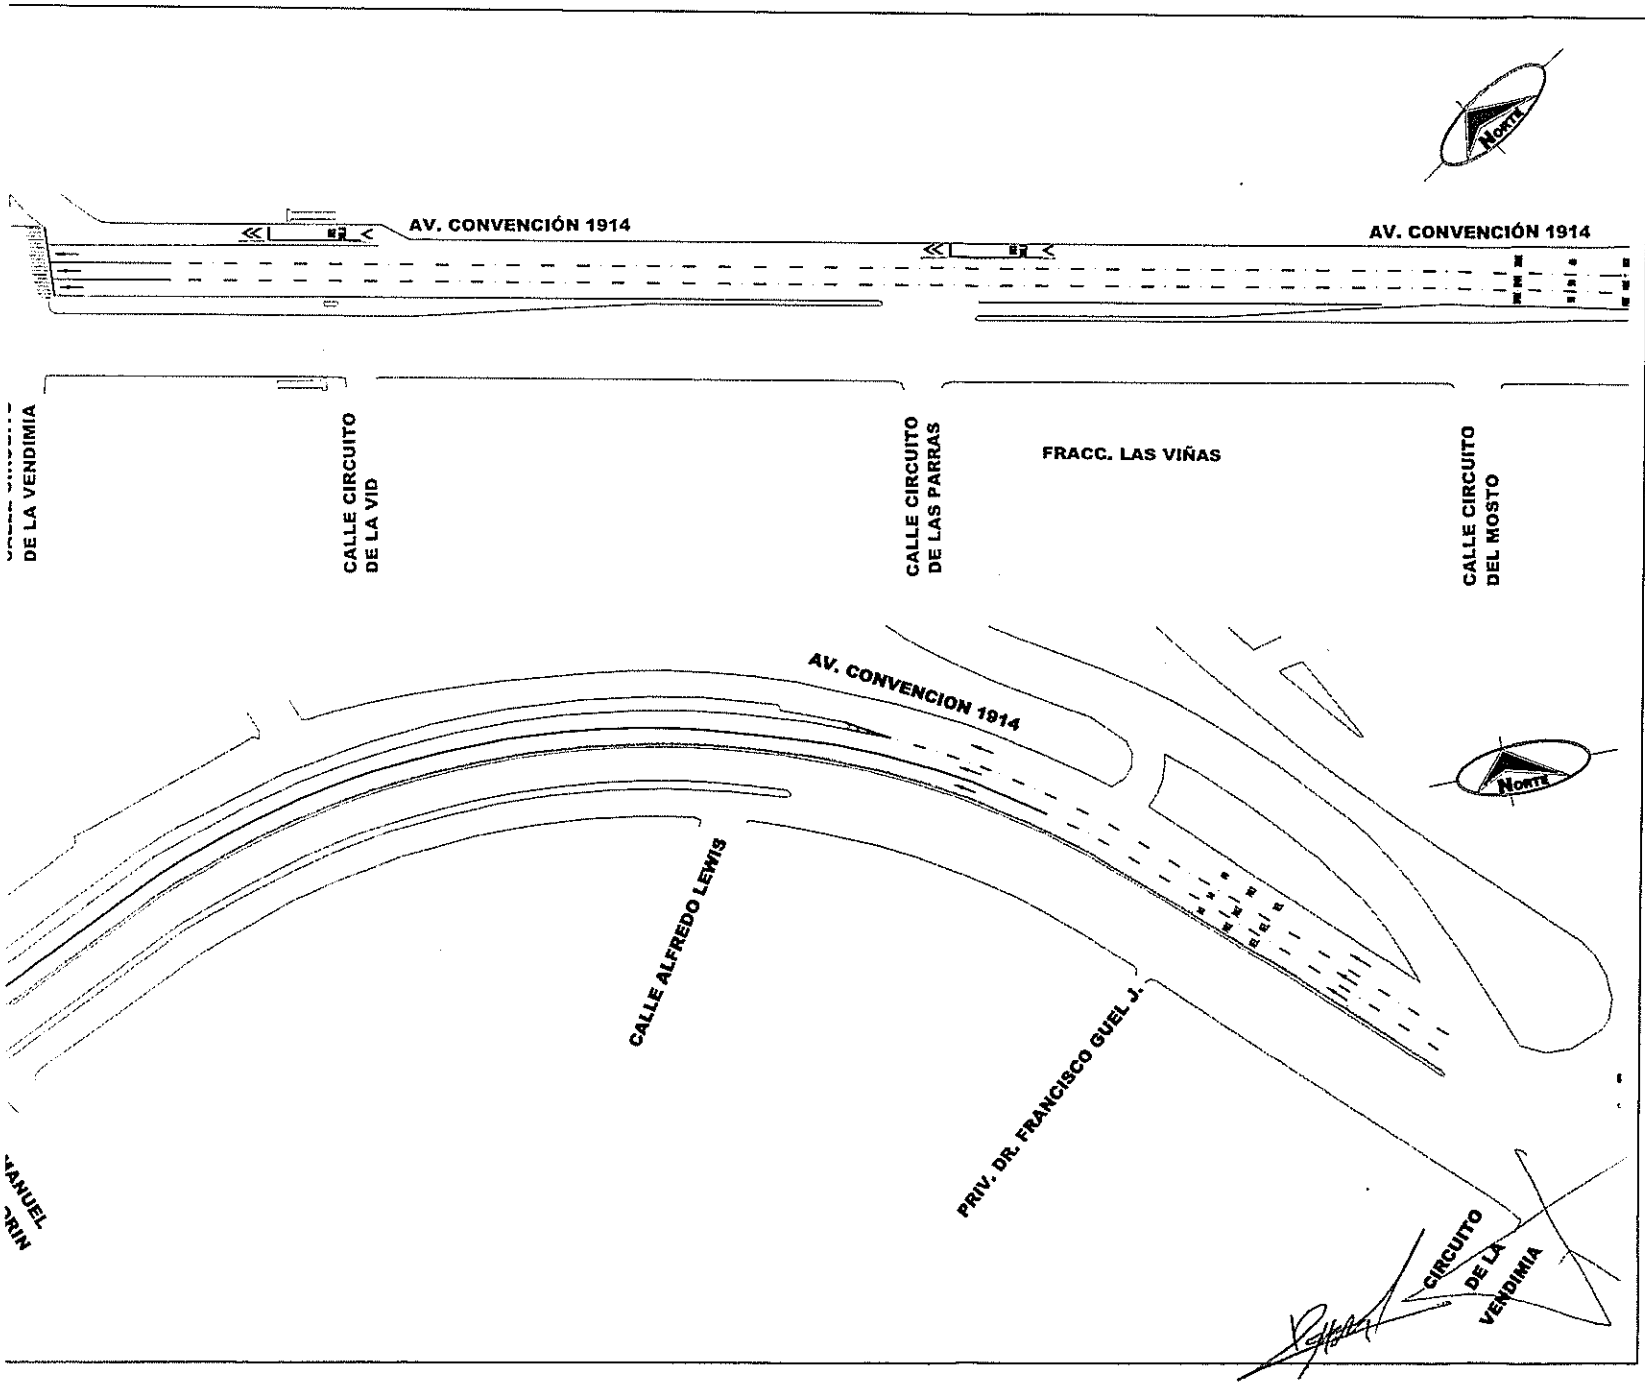


LOCALIZACIÓN:



CONTRATISTA:


ATECO

**SIMBOLOGÍA**


- BANQUETAS
- PARAMENTO
- VIALETA ESTANDAR
- VIALETA SOLAR
- FLECHA DE SENTIDO
- LINEAS AMARILLAS DE CRUCE PEATONAL
- LINEA DE ALTO
- POZO DE VISITAS
- CAJA DE VÁLVULAS
- CAMÁN
- PARADA DE AUTOBUS

| | |
|---|---|
| PROYECTO: | OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. CIRCUNVALACIÓN 1914 (CALZADA ORIENTE) |
| UBICACIÓN: | AV. CIRCUNVALACIÓN 1914 (CALZADA ORIENTE) TRAMO ENTRE BLVD. A ZACATECAS Y AV. JOSÈ H. ESCOBEDO |
| CONTRATO: | DM-0055-2022 |
| CONTRATISTA: | ATECO S.A. DE C.V. |
| SUPERVISOR: | ING. RICARDO MACÍAS MERCADO |
| CONTENIDO: | SEÑALIZACIÓN 03 |
| ESCALA: | SIN ESCALA |
| FECHA: | JULIO 2022 |

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

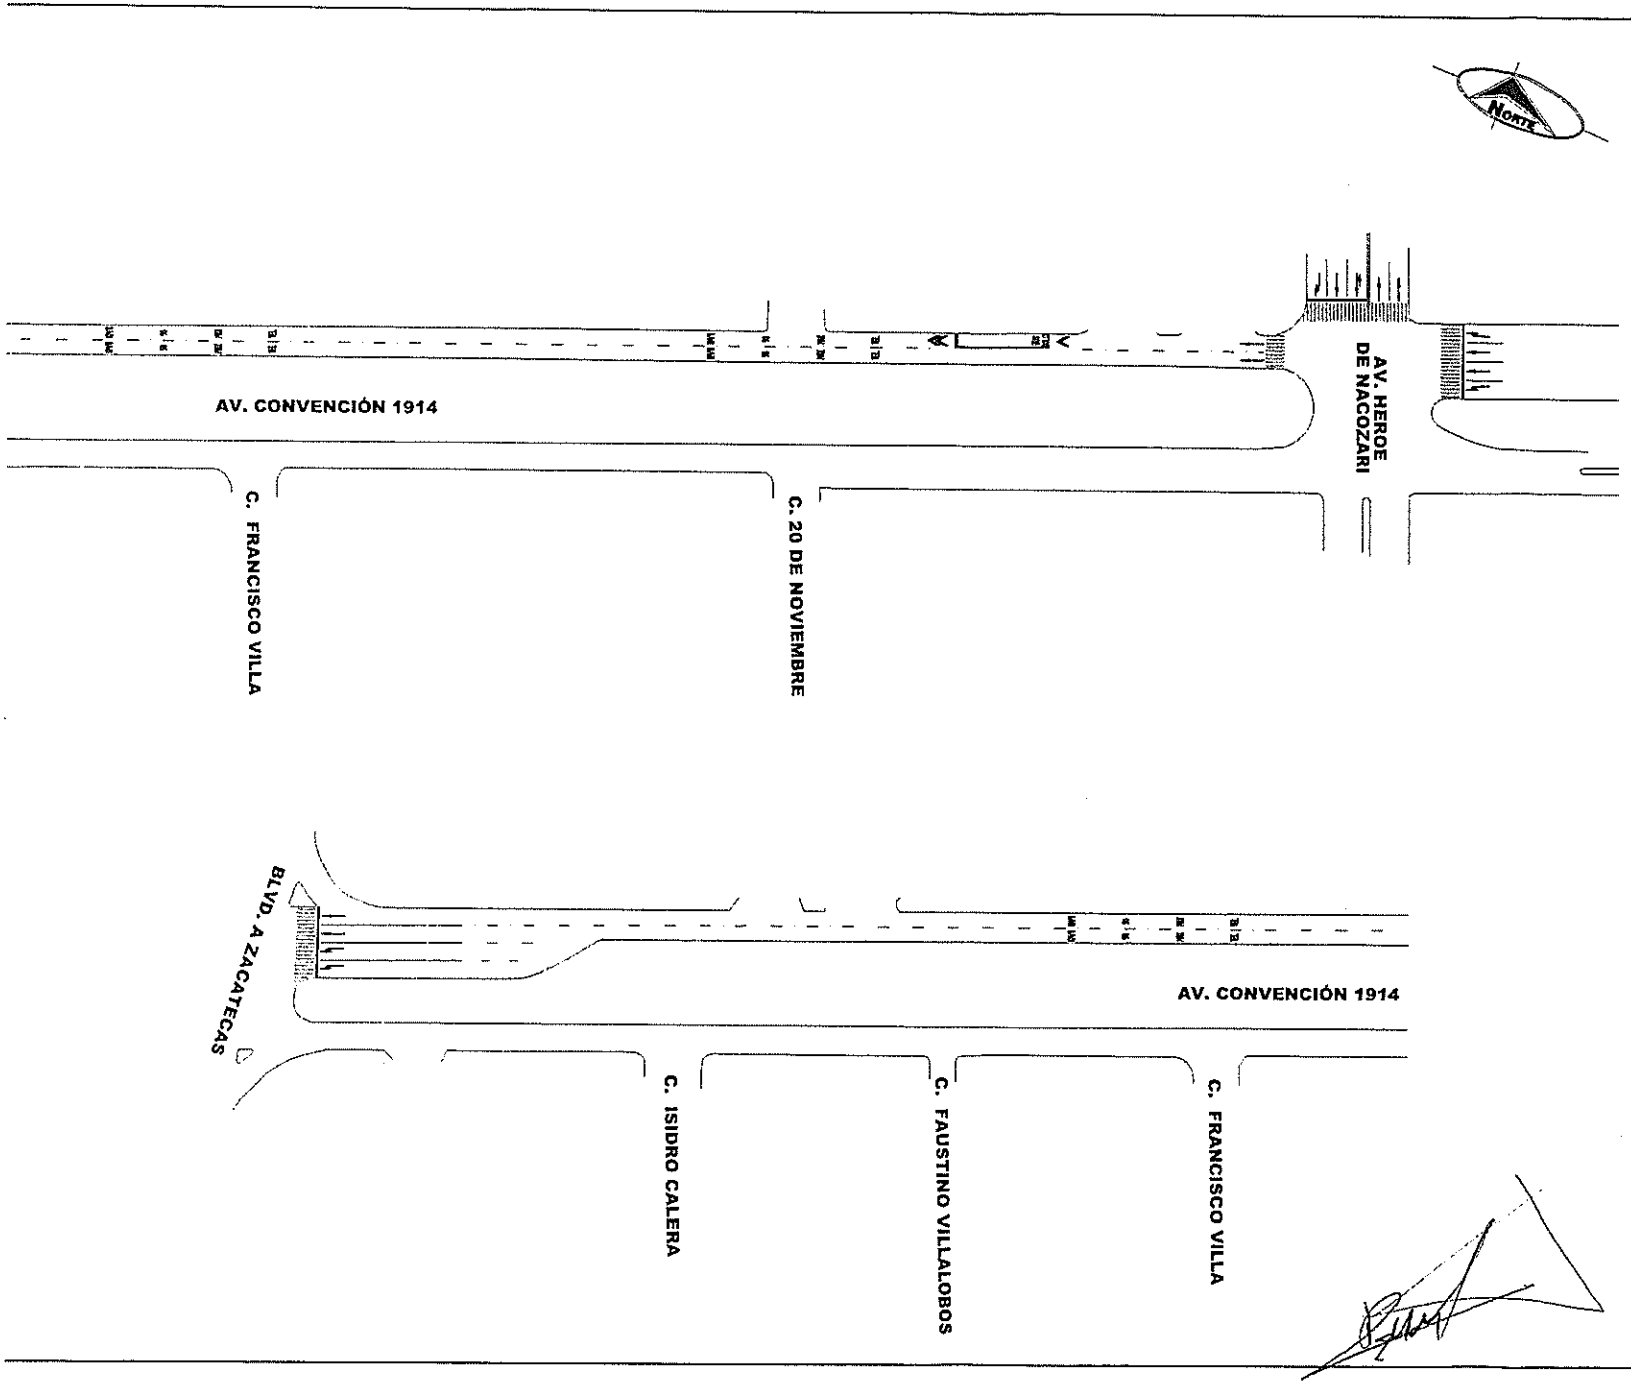


LOCALIZACIÓN

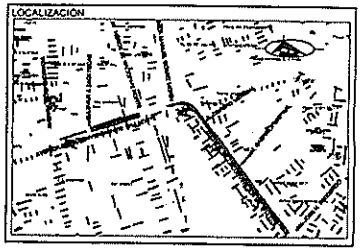

CONTRATISTA:

ATECO

**SIMBOLOGÍA**

- BANQUETAS
- PAVIMENTO
- VIALETA ESTANDAR
- VIALETA SOLAR
- FLECHA DE SENTIDO
- LINEAS AMARILLAS DE CRUCE PEATONAL
- LINEA DE ALTO
- POZO DE VISITAS
- CAJA DE VÁLVULAS
- CAMIÓN
- PARADA DE AUTOBUS

PROYECTO:
OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. CIRCUNVALACIÓN 1914 (CALZADA ORIENTE)

UBICACIÓN:
AV. CIRCUNVALACIÓN 1914 (CALZADA ORIENTE) TRAMO ENTRE BLVD. A ZACATECAS Y AV. JOSÉ H. ESCOBEDO

CONTRATO:
DM-0055-2022

CONTRATISTA:
ATECO S.A. DE C.V.

SUPERVISOR:
ING. RICARDO MACÍAS MERCADO

CONTENIDO:
SEÑALIZACIÓN 04

| ESCALA: | FECHA: |
|---|---|
| SIN ESCALA | JULIO 2022 |

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

PARTIDAS O CONCEPTOS QUE NO SE REALIZARÍAN

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **ALCANTARILLADO** | **$ 589,020.31** |
| 2 | **AGUA POTABLE** | **$ 260,405.57** |
| 3 | **BANQUETAS Y RAMPAS** | **$ 545,900.75** |
| 4 | **KM SUBSECUENTES** | **$ 321,025.21** |

SE CONSIDERARON 30 KM DE ACARREO ORIGINALMENTE, CON EL CAMBIO DE TIRADERO SOLO SE **CONSIDERAN 4 KM**

| VOLUMENES CONSIDERADOS INCIALMENTE KM SUBSECUENTES | |
|---|---|
| CONCEPTO 5 | 336.24 |
| CONCEPTO 14 | 37912.50 |
| CONCEPTO 22 | 90.00 |
| CONCEPTO 88 | 900.00 |
| | **39238.74 M3** |

VOLUMEN A CONSIDERAR REALMENTE **5231.83 M3**

| | |
|---|---|
| IMPORTE INICIAL | $ 370,413.71 |
| IMPORTE CORREGIDO | $ 49,388.49 |
| **AHORRO** | **$ 321,025.21** |

**IMPORTE QUE NO SE EJECURÍA $ 1,716,351.85**

VOLUMEN QUE SE PUEDE REALIZAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PRECIO APROXIMADO DE TERRACERÍA POR M2 =** | $ 674,251.07 / 1685.00 | = | $ 400.15/M² |
| **PRECIO APROXIMADO DE PAVIMENTO POR M2 =** | $ 1,035,333.24 / 1685.00 | = | $ 614.44/M² |
| **PRECIO APROXIMADO DE GUARNICIÓN POR M2 =** | $ 184,453.42 / 1685.00 | = | $ 109.47/M² |
| | **PRECIO TOTAL** | = | **$ 1,124.06/M²** |

**VOLUMEN QUE SE PUEDE REALIZAR = $ 1,716,351.85 / 1124.06 = 1526.92 M2**

LA CALLE CUENTA CON UNA LONGITUD TOTAL DE 330.00 ML, CONSIDERANDO UN ANCHO DE CALZADA DE 9.00 MTS, TENEMOS UN ÁREA TOTAL DE **2970.00 M2**, EN PROYECTO SOLO TENEMOS CONSIDERADOS 1685.00 M2, RESTANDO UN AREA POR CUBRIR DE 1285.00 M2, **POR LO QUE SI SE PODRÍA LLEVAR ACABO EL PAVIMENTO DE TODA LA CALLE.**

NOTAS:

- SE CONSIDERA NO REALIZAR NADA REFERENTE A AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y BANQUETAS.
