Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

Dirección de Programación Presupuestal
Núm. Oficio AMPP/0558/22
Aguascalientes, Ags. 6 de Diciembre del 2022
Asunto: Validación de Expediente Técnico

C.P. SERGIO ARTURO LOZANO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 17 fracción XV, 60 fracción XVI y 76 fracción VI del Reglamento del Sistema Integral de Desarrollo Municipal y del Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes, hago referencia al oficio SOPMA/2687/2022 recibido por este Instituto el día 5 de Diciembre del 2022 por parte de la Secretaría de Obras Públicas Municipales, mediante el cual remiten el expediente técnico original de la siguiente obra para su análisis, registro y priorización, conforme al Programa Anual de Obra Pública y Programas Sociales para el ejercicio presupuestal 2022:

| | |
|---|---|
| DEPENDENCIA EJECUTORA: | SOPMA |
| NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO: | CONSTRUCCIÓN DE 06 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA BAJA. ZONA 04 - PB |
| UBICACIÓN: | TODO EL MUNICIPIO, VARIAS COLONIAS, AGUASCALIENTES, AGS. |
| FONDO DE INVERSIÓN: | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |
| IMPORTE: | $899,519.21 (ET FINAL) |
| No. DE OBRA: | 2022-FISMDF-0092-08-3003 |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | CONTRATO |
| EJE: | MUNICIPIO SOLIDARIO |
| ESTRATEGIA: | FAMILIA |
| POLITICA: | 2.7.3.MEJORAR MI HOGAR. (COMP. CAMP..) |

Al respecto, hago de su conocimiento que dicho expediente ha sido analizado en su integración técnica y documental, con base en el artículo 168 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Asimismo, le comento que este Instituto valida dicha obra acorde a lo establecido en los artículos 14, 22 párrafo segundo y 23 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la cual se encuentra alineada al Plan de Desarrollo Municipal vigente, para dar cumplimiento a las metas establecidas en el mismo, y a los Lineamientos Generales para la Operación de este Fondo de Inversión, toda vez que la misma cuente con la autorización del CODEMUN. De igual manera, se hace de su conocimiento que deberá cumplir con lo establecido en los ordenamientos aplicables en lo que respecta al ejercicio, control e información de los recursos de este Fondo. Cabe hacer mención que los recursos solicitados para este proyecto de inversión, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal para el presente ejercicio fiscal que determine la Secretaría a su digno cargo. Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ARQ. AUSTRIA GABRIELA DÁVILA DE LA LLAVE
DIRECTORA GENERAL DEL IMPLAN

CAAR / JDBC
C.c.p. I.C. ING. MIGUEL ÁNGEL HUIZAR BOTELLO .- Secretaría de Obras Públicas Municipales .Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes

Antonio Acevedo Escobedo 103 A, Col. Centro
Aguascalientes, Ags. C.P. 20000

(449) 9101010 Ext. 3117

www.implanags.gob.mx

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

IMPLAN

## ANÁLISIS INTEGRAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE OBRA (PAOP 2020): | 2022-FISMDF-0092-08-3003 | REGISTRO No. | 258 |
| OFICIO DE VALIDACIÓN: | AMPP/0558/22 | FECHA RECIBIDO PARA REVISIÓN: | 6 de Diciembre del 2022 |
| PROGRAMA: | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | LOCALIDAD O COLONIA: | VARIAS COLONIAS |
| SUB-PROGRAMA: | 0830- Vivienda | DELEGACIÓN: | Aguascalientes |
| DEPENDENCIA: | Secretaría de Obras Públicas Municipales | MOD. DE EJECUCIÓN: | CONTRATO |
| NOMBRE DE LA OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE 06 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA BAJA. ZONA 04 - PB, TODO EL MUNICIPIO | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, FISMDF | | |
| INVERSIÓN: | $899,519.21 | CLASIFICACIÓN DE OBRA: | BIENES DE DOMINIO PUBLICA |

| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | BENEFICIARIOS | OTROS | DIFERENCIA ENTRE MOD. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $899,519.21 | $899,519.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | *$43.603,57* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TIPO DE EXPENDIENTE: | ET FINAL | AÑO: 2022 | AÑO: | AÑO: |
| AVANCES: | Financiero: 5 % | Físico: 5 % | | |
| FECHA DE INICIO: | 8 de Noviembre del 2022 | FECHA DE TÉRMINO: | 22 de Diciembre del 2022 | REGISTRO SIMA: 92 |

## CHEK LIST DE LOS ANEXOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

| | |
|---|---|
| CÉDULA DE REGISTRO DE OBRA | ✓ |
| DICTAMEN DE FACTIBILIDAD | ✓ |
| MEMORIA DESCRIPTIVA | ✓ |
| PRESUPUESTO BASE | ✓ |
| FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO | ✓ |
| CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO) | ✓ |
| CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO) | ✓ |
| PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES | ✓ |
| PLANOS O ESTUDIOS TÉCNICOS | N/A |
| PADRÓN DE BENEFICIARIOS | N/A |
| ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO | N/A |
| DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL | N/A |
| CONVENIO DE CONCERTACIÓN | N/A |
| ACTA CONSTITUTIVA | N/A |

| METAS | | BENEFICIARIOS | | PERIODO DE EJECUCION | | OBRA PROPUESTA | | CLAVE SISCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD DE MEDIDA | CANT | TIPO DE BENEFICIARIOS | CANTIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | CONCEPTO | JORNALES A GENERAR | |
| VIVIENDA | 6 | Familias | 6 | 2022-11-08 | 2022-12-22 | Recámaras Adicionales Planta Baja | 2338 | 2362 |

## INCLUIDO EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES

RECIBIO: ING. JOSÉ DAVID BURGUETE CLAUSTRO
Analista de Programación e Inversión de Obra Pública

6 de Diciembre del 2022
Fecha de validación

6 de Diciembre del 2022
Fecha de validación Expediente

PROCEDE Si ✓ No

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

# AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

## CEDULA DE REGISTRO POR OBRA

Aguascalientes

**050400-001E00E05-05-2-2-5-00-1-E-0508-0-17-0092-21-2502-6112**

| | |
|---|---|
| **2022-FISMDF-0092-08303-046** | Obra **CONSTRUCCIÓN DE 06 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA BAJA. ZONA 04 - PB** |
| Tipo DEFINITIVO 1 2022<br>Folio SISCO **2362** | Ubic. VARIAS COMUNIDADES, AGUASCALIENTES Mpio. |

Ent. Ejecutora : **050400001E00E05**

| | |
|---|---|
| Eje: **05** | MUNICIPIO SOBRESALIENTE |
| Finalidad: **2** | DESARROLLO SOCIAL |
| Función: **2** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| Subfunción: **5** | VIVIENDA |
| Tema: **00** | SIN TEMA |
| Cuenta del Gasto **1** | GASTO PROGRAMABLE |
| Clasif. Programatica: **E** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS |
| Programa: **0508** | Obra Pública Inteligente |
| SubPrograma: **0** | SUBPROGRAMA GENÉRICO |
| Proyecto: **17** | |
| Tipo de Gasto: **21** | GASTO INVERSIÓN / OBRA PÚBLICA |

### I N V E R S I O N 2022

| | | | |
|---|---|---|---|
| Municipal | 2502 | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022 | $899,519.21 |

Folio SIMA 92 Total $899,519.21

### M E T A S

| Unidad de Medida | Cantidad | Descripción |
|---|---|---|
| VIVIENDA | 6 | OBRA CONSTRUCCIÓN DE 06 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA BAJA. ZONA 04 - PB |

Inversión Ejercida Total al 31 de Diciembre de 2021 $0.00

Avance Fisico Acumulado al 31 de Diciembre de 2021

Avance Fisico Acumulado Programado al 31 de Diciembre de 2022 100 %

Fecha de Inicio 08 Nov 2022 Fecha de Terminación 22 Dic 2022

Jornales a Generar en 2022 2338

Modalidad de ejecución CONTRATO

Clasificación de la Obra Bienes de Dominio Público

Registro del Patrimonio: Obras transferibles

OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

GENERALES

Nombre del Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 06 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA BAJA. ZONA 04 - PB VARIAS COMUNIDADES, AGUASCALIENTES Mpio.

Programa : 08 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Subprograma : 30 Vivienda (083.- Construcción)

Clave del Municipio : AGUASCALIENTES

Localidad :

Barrio, Colonia o Ejido : AGUASCALIENTES Mpio.

Tipo de Obra : NUEVA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE 06 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA BAJA. ZONA 04 - PB

Beneficiarios ( No. y Tipo ) :

| 6 | PERSONAS |
|---|---|

Hombres: 1 Mujeres: 5

OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

Los abajo firmantes, hacen constar que el presente proyecto :

CONSTRUCCIÓN DE 06 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA BAJA. ZONA 04 - PB

VARIAS COMUNIDADES, AGUASCALIENTES Mpio.

cumple con los Requisitos y Normas Técnicas establecidas por la Dependencia Normativa, por lo que es viable su ejecución. Comprometiéndose la misma a proporcionar la supervisión y asistencia técnica necesaria durante el proceso administrativo.

Por la Dependencia Ejecutora

Ing. Miguel Angel Huizar Botello
Secretario de Obras Públicas

Mtro. Edson Rubén Camarillo Rodríguez
Secretario de Desarrollo Social

LUGAR :AGUASCALIENTES, AGS.



Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

# AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

## FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

LOCALIZACION: VARIAS COMUNIDADES, AGUASCALIENTES Mpio.

PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

SUBPROGRAMA: Vivienda (083.- Construcción)

OBRA A REALIZAR: CONSTRUCCIÓN DE 06 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA BAJA. ZONA 04 - PB

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

FORMA DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA: NUEVA

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE 06 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA BAJA. ZONA 04 - PB

CARACTERISTICAS DE LA OBRA: Bueno

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE REQUIERE PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

PROCEDE: SI [X] NO [ ]

REVISÓ: Jefa del Departamento de Expedientes Tecnicos y Costos

NOMBRE: Arq. Blanca Margarita Martinez Amador

FIRMA:

FECHA: 28 Nov 2022

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09


www.ags.gob.mx

No. Folio SISCO 2362

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

# H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
## SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
## DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA
# LOCALIZACION

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | FISMDF-0092-2022 CONSTRUCCIÓN DE 06 RECÁMARAS ADICIONALES PLANTA BAJA VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES Mpio. | | | | | |
| NO. DE CONTR | FISMDF-0092-2022 | | CONTRATISTA: | CONSTRUCTORA 31-20, S.A. DE C.V. | | |

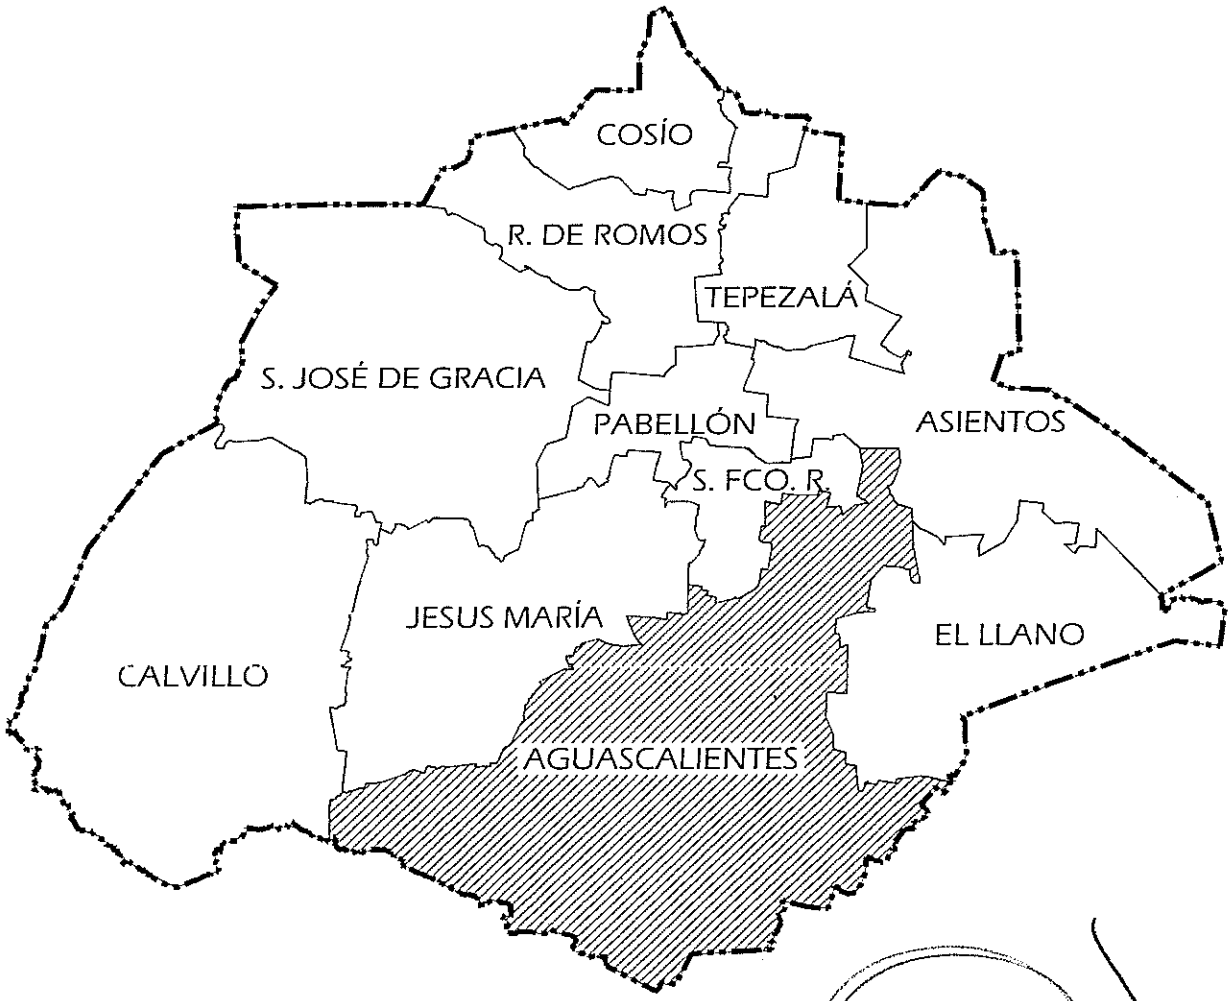



ARQ. Celio MURO CORNEJO
SUPERVISOR DE OBRA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

# H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
## SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
## DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA
# LOCALIZACION

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | FISMDF-0092-2022 CONSTRUCCIÓN DE 06 RECÁMARAS ADICIONALES PLANTA BAJA VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES Mpio. | | | | | |
| NO. DE CONTR | FISMDF-0092-2022 | | CONTRATISTA: | CONSTRUCTORA 31-20, S.A. DE C.V. | | |

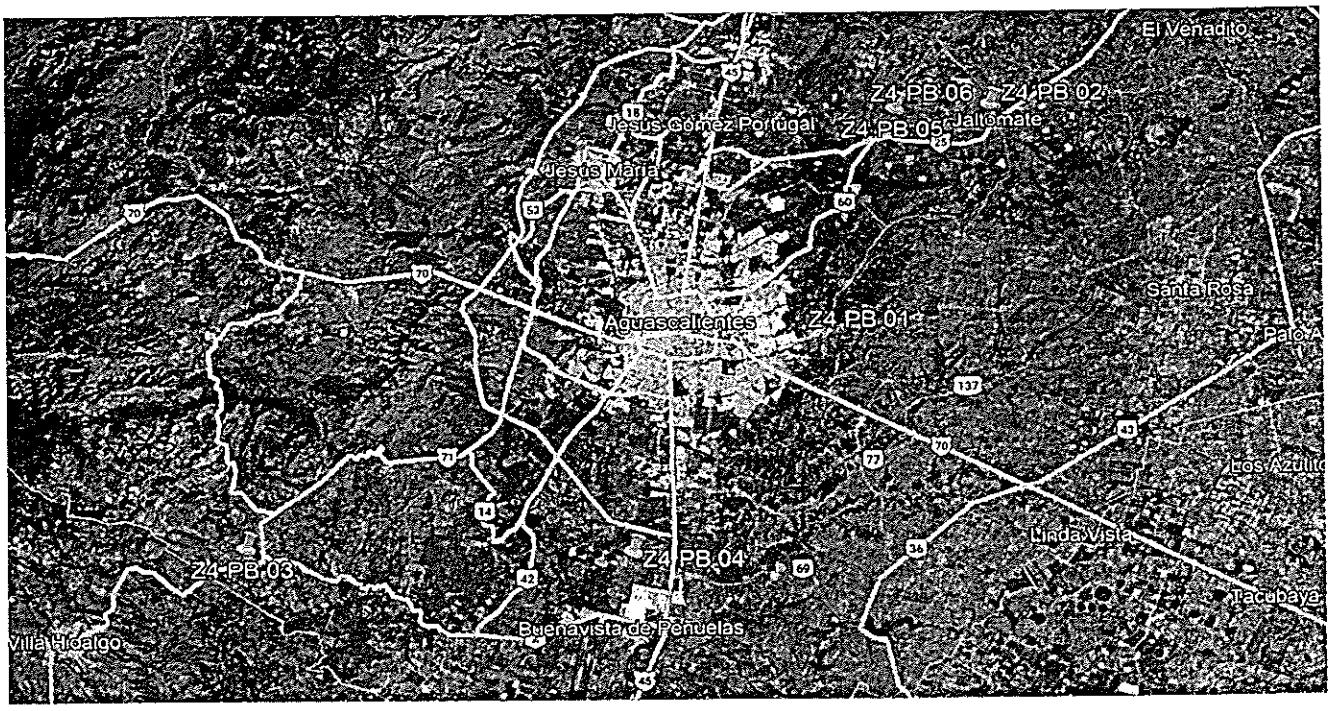


ARQ. Celio MURO CORNEJO
SUPERVISOR DE OBRA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

| RO3-POS-SOS-7.5.1-04 | |
|---|---|
| REVISION: | 00 |
| FECHA DE REVISION: | |
| RESPONSABLE: | SUPERVISOR DE OBRA |
| TIEMPO DE RET: | 02 AÑOS |

# PROGRAMA DE OBRA DEFINITIVO

No. DE CONTRATO : FISMDF-0092-2022

PROGRAMA: 08-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INICIO VIGENTE: 08-noviembre-22

No. OBRA Y NOMBRE DE LA OBRA: FISMDF-0092-2022 CONSTRUCCIÓN DE 06 RECAMARAS ADICIONALES PLANTA BAJA VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES Mpio.

TERMINO REAL: 22-diciembre-22

RECURSO: 2022

| CONCEPTO | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | PONDERACIÓN % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | FINANCIERO | FÍSICO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | % |
| DESCRIPCION | INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FISMDF-0092-2022 CONSTRUCCIÓN DE 06 RECAMARAS ADICIONALES PLANTA BAJA VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES Mpio. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRELIMINARES | $ 7,925.13 | 100 | | | | | | | | | | | 90 10 | | | | | | 0.88 | 8.70 |
| CIMENTACION | $ 121,719.89 | 100 | | | | | | | | | | | 60 10 | | | | | | 13.53 | 8.70 |
| MUROS CADENAS Y CASTILLOS | $ 134,130.11 | 100 | | | | | | | | | | | 80 10 | | | | | | 14.91 | 8.70 |
| CUBIERTA DE AZOTEA | $ 242,295.48 | 100 | | | | | | | | | | | 60 20 20 | | | | | | 26.94 | 13.04 |
| INSTALACION ELECTRICA | $ 36,327.02 | 100 | | | | | | | | | | | | 40 40 20 | | | | | 4.04 | 13.04 |
| HERRERIA, CANCELERIA Y CARP | $ 85,427.70 | 100 | | | | | | | | | | | | 20 40 40 | | | | | 9.50 | 13.04 |
| ACABADOS PLAFON Y MUROS | $ 80,737.88 | 100 | | | | | | | | | | | | 20 60 20 | | | | | 8.98 | 13.04 |
| LIMPIEZA GRUESA Y FINAL | $ 7,748.97 | 100 | | | | | | | | | | | | 50 50 | | | | | 0.86 | 8.70 |
| MEJORAS A RECAMARA ADICI | $ 183,207.02 | 100 | | | | | | | | | | | | 20 60 20 | | | | | 20.37 | 13.04 |
| SUBTOTAL SIN IVA | $ 899,519.21 | 23 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 2 4 6 | 5 5 1 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | | |
| AVANCE SEMANAL % | | | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 3% 17% 25% | 25% 42% 4% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | | |
| AVANCE SEMANAL ACUMULADO % | | | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 3% 20% 45% | 70% 87% 91% 91% | 100% 100% 100% 100% | 100% 100% 100% 100% | 100% 100% 100% 100% | 100% 100% 100% 100% | 100.00 | 100.00 |
| EJERCIDO SEMANAL $ | | | | | | | | | | | | | 116,680.52 279,058.88 146,277.44 | 255,527.92 98,099.05 3,874.49 | | | | | 899,519.21 | |
| EJERCIDO MENSUAL $ | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $542,016.84 | $357,502.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $ - | IVA |
| EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO $ | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542,016.84 | 899,519.20 | 899,519.20 | 899,519.20 | 899,519.20 | 899,519.20 | | |
| EJERCIDO SEMANAL % | | | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 13% 31% 16% | 28% 11% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | | |
| EJERCIDO MENSUAL % | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | GRAN TOTRAL EJERCIDO | |
| EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO % | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | $ | 899,519.21 |

ARQ. Celia MURO CORNEJO
SUPERVISOR

# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

## FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

**GENERALES**

EJERCICIO: 2022 APROBACION No: **2022-FISMDF-0092-08303-046**

LOCALIDAD: AGUASCALIENTES, MPIO.

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES, AGS

TIPO DE INVERSION: **FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

PROGRAMA: **08-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**

SUB-PROGRAMA:

OBRA A REALIZARSE: **FISMDF-0092-2022 CONSTRUCCIÓN DE 06 RECÁMARAS ADICIONALES PLANTA BAJA VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES Mpio.**

DEPENDENCIA EJECUTORA: **SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)**

FORMACIÓN DE EJECUCION: **CONTRATO** NO. DE CONTRATO: **FISMDF-0092-2022**

NOMBRE CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA 31-20, S.A. DE C.V.**

REPRESENTANTE: **ING. IRVING MORALES M.** **RESIDENTE: ING. IRVING MORALES M.**

MONTO CONT. ORIGEN **$899,519.21** ANTICIPO: **$269,855.76**

1A AMPLIACION $: **N/A** 1 AMPL DIAS **N/A** PLAZO **45 DIAS**

2A AMPLIACION $: **N/A** 2 AMPL DIAS **N/A**

FIRMA CONTRATO: 21 de octubre de 2022

INICIO CONT: dd/mm/aa 22 de octubre de 2022 TERMINO CONT: 5 de diciembre de 2022

INICIO REAL: dd/mm/aa 8 de noviembre de 2022 TERMINO REAL: 22 de diciembre de 2022

**TIPO DE OBRA PROPUESTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NUEVA CREACIÓN | | CONSOLIDACIÓN | |
| COMPLEMENTARIA | | AMPLIACIÓN | X |
| REHABILITACIÓN | | EQUIPAMIENTO | |

**CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:**

CONSTRUCCION DE 06 RECAMARAS ADICIONALES EN PLANTA BAJA , EN IGUAL NUMERO DE VIVIENDAS, SUPERFICIE CONSTRUIDA POR RECAMARA 12.00 M², A BASE DE CADENA DE DESPLANTE MUROS DE BLOCK, LOSA DE SEMIVIGUETA Y BOVEDILLA DE POLIESTIRENO, ACABADOS INTERIORES Y EXTERIORES, PISO CERAMICO, PUERTAS Y VENTANAS CON PROTECCION.

**CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA: (SELECCIONAR UNO OBLIGATORIO)**

BUEN ESTADO X REGULAR PESIMO ESTADO

**FACTIBILIDAD DE LA OBRA: (CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA)**

FACTIBLE

**PROCEDE:** SI: **X** NO:

MARQUE SOLO UNA

ARQ. Celio MURO CORNEJO

**SUPERVISOR**

# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

## FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

**GENERALES**

LOCALIDAD: AGUASCALIENTES, MPIO.
MUNICIPIO: AGUASCALIENTES, AGS
PROGRAMA: 08-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
SUB-PROGRAMA: 0
OBRA A REALIZARSE: FISMDF-0092-2022 CONSTRUCCIÓN DE 06 RECÁMARAS ADICIONALES PLANTA BAJA VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES Mpio.

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)
FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO

**TIPO DE OBRA PROPUESTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NUEVA CREACIÓN | | CONSOLIDACIÓN | |
| COMPLEMENTARIA | | AMPLIACIÓN | X |
| REHABILITACIÓN | | EQUIPAMIENTO | |

**CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:**

CONSTRUCCION DE 06 RECAMARAS ADICIONALES EN PLANTA BAJA , EN IGUAL NUMERO DE VIVIENDAS, SUPERFICIE CONSTRUIDA POR RECAMARA 12.00 M², A BASE DE CADENA DE DESPLANTE MUROS DE BLOCK, LOSA DE SEMIVIGUETA Y BOVEDILLA DE POLIESTIRENO, ACABADOS INTERIORES Y EXTERIORES, PISO CERAMICO, PUERTAS Y VENTANAS CON PROTECCION.

**CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:**

| BUEN ESTADO: | | REGULAR: | | PESIMO ESTADO: | |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | | | | |

**FACTIBILIDAD DE LA OBRA:**

LA OBRA ESTA ENTREGADA Y EN FUNCIONAMIENTO

| PROCEDE | SI: | | NO: | |
|---|---|---|---|---|
| | | X | | |

ARQ. Celia MURO CORNEJO
SUPERVISOR

Obra: CONSTRUCCIÓN DE 06 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA BAJA. ZONA 04 - PB

Ubicación: VARIAS COMUNIDADES, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: CONSTRUCTORA 31-20, S.A. DE C.V. (624)

| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | GRUPO: CONSTRUCCION DE 06 RECAMARAS ADICIONALES EN PLANTA BAJA. ZONA 04-PB. VARIAS COMU | | | | |
| | PARTIDA: PRELIMINARES | | | | |
| 1 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, INCLUYE: COLOCACION DE PUENTES Y REFERENCIAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO TOPOGRAFICO. | M2 | 74.28 | $11.32 | $840.85 |
| 2 | EXCAVACION A MANO EN CEPA, DE 30 CM. DE ANCHO MÁXIMO Y 20 CM. DE ALTO, PARA ALOJAR DENTELLON DE CONCRETO DE 12x 20 CM., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, CONSERVACIÓN DE LA MISMA HASTA LA ETAPA DE COLADO DE PLATAFORMA, INCLUYE MANO DE OBRA, ACARREOS LOCALES A 20.00 M., MEDIDO COMPACTO. | M3 | 4.5 | $377.28 | $1,697.76 |
| 3 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO AL 85 % DE SU P.V.S.M., EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM., INCLUYE : SELECCION DEL MATERIAL Y HUMEDAD NECESARIA. | M3 | 4.8 | $85.26 | $409.25 |
| 4 | SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN ZONA DE EDIFICACION, HOMBROS Y TALUDES, COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. CON EQUIPO MECANICO (COMPACTADOR DE IMPACTO), EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., INCLUYE: SELECCION DEL MATERIAL, ACARREOS LOCALES, HUMEDAD NECESARIA, MEDIDO COMPACTADO. | M3 | 12.24 | $406.64 | $4,977.27 |
| | | | | Totales por Partida | $7,925.13 |
| | PARTIDA: CIMENTACION | | | | |
| 5 | CIMENTACION A BASE DE DENTELLON DE CONCRETO PERIMETRAL Y FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 10 cm. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/6-6 EN LECHO SUPERIOR Y FRANJAS DE MALLA 6x6-6/6 EN ZONAS DE MUROS, CONCRETO HECHO EN OBRA, F'c=200 kg/cm2, T.M.A. 3/4", R.N., REV.10+/- 2cm., VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, ACABADO REGLEADO, INCLUYE: DENTELLÓN PERIMETRAL DE 15x30 cm. DE SECCIÓN, ARMADO EN LECHO SUPERIOR CON 2 VS. No. 5 Y LECHO INFERIOR CON 2 Vs. NO. 4 COLADO MONOLITICAMENTE CON EL FIRME, COMO PREVENCIÓN A LAS POSIBLES SOCAVACIONES QUE PUDIERAN PRESENTARSE EN LA PLATAFORMA, INCLUYE ADEMAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNA CAPA DE POLIETILENO NEGRO C-600 EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO, CIMBRADO, ARMADO, CRUCES DE VARILLAS, MALLA, SILLETAS, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DESPERDICIOS, ELABORACION, ACARREOS, VACIADO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO CON CURACRETO BASE AGUA APLICADO POR ASPERSIÓN, DESCIMBRADO, LIMPIEZA, PROTECCION DE LA MISMA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO, LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA TIRADERO OFICIAL, TRABAJO TERMINADO. | M2 | 73.2 | $1,662.84 | $121,719.89 |
| | | | | Totales por Partida | $121,719.89 |
| | PARTIDA: MUROS CADENAS Y CASTILLOS | | | | |
| 6 | MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO PESADO DE 12 x 20 x 40 cm., EN ESPESOR DE 12 cm. JUNTEADO CON MEZCLA DE MORTERO HIDRAULICO - ARENA 1:4, ACABADO APARENTE 1 O DOS CARAS SEGÚN SEA EL CASO, JUNTA RAYADA DE 0.7 A 1.0 cm. MAXIMO, A PLOMO Y NIVEL, REFUERZO TIPO ESCALERILLA A CADA 3 HILADAS, INICIANDO A PARTIR DE LA PRIMERA HILADA, INCLUYE CORTE DE PIEZAS EN MURO CON CORTADORA DE DISCO, LIMPIEZA Y CONSERVACION DEL MISMO HASTA LA ENTREGA PARA CONSERVAR LA CARACTERISTICA DE APARENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, CRUCES DE ACERO DE REFUERZO, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO OFICIAL, TRABAJO TERMINADO. | M2 | 163.5 | $603.62 | $98,691.87 |

Obra: CONSTRUCCIÓN DE 06 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA BAJA. ZONA 04 - PB

Ubicación: VARIAS COMUNIDADES, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: CONSTRUCTORA 31-20, S.A. DE C.V. (624)

| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO: | CONSTRUCCION DE 06 RECAMARAS ADICIONALES EN PLANTA BAJA. ZONA 04-PB. VARIAS COMU | | | | |
| PARTIDA: | MUROS CADENAS Y CASTILLOS | | | | |
| 7 | CASTILLO AHOGADO EN UNA CELDA DEL BLOCK, PARA MURO DE 12cm. DE ESPESOR, CON CONCRETO F'c=150 kg/cm2, TMA 3/4", HECHO EN OBRA, R.N., REV. 14+/-2 CM., INCLUYE: 1 VARILLA DE 3/8", ANCLAJES, CRUCES DE VARILLA Y TRASLAPES DE LA MISMA, ACARREOS, ELEVACIONES, ELABORACIÓN, ASI COMO PICADO DEL CONCRETO, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO OFICIAL, TRABAJO TERMINADO. IMPORTANTE : CONSIDERAR ACERO EN ANCLAJE CON LA CIMENTACION, ESCUADRA, CRUCES CON CERRAMIENTOS, ASI COMO LA LONGITUD NECESARIA PARA ANCLAR A LOSA DE CUBIERTA, CONFORME A PROYECTO. | ML | 228.06 | $155.39 | $35,438.24 |
| | | | Totales por Partida | | $134,130.11 |
| PARTIDA: | CUBIERTA DE AZOTEA | | | | |
| 8 | LOSA HORIZONTAL A BASE DE SEMIVIGUETA DE CONCRETO 12x15 Y BOVEDILLA DE POLIESTIRENO 68x250x13, ESPESOR TOTAL DE 17 cm., CONC. H.EN O., F'c = 200 kg/cm2, T.M.A. 3/4", R.N., REV.10+/-2cm., CAPA DE COMPRESIÓN DE 8 CM., (SOBRECARGA DE 645 KG/M2, SEGÚN ESPECIF. Y DISEÑO DEL FABRICANTE EL CUAL PROPORCIONARÁ LA REVISIÓN DE LA MISMA), VACIADO CON BOTES, ARMADA POR TEMPERATURA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10, CERRAMIENTO DE 12X29 CM PARA DAR AJUSTE DE 9 CM EN CADENA DE CERRAMIENTO PARA DAR UNA ALTURA DE 2.40 M MAS EN MURO INTERIOR AHOGADO EN LOSA CON ARMEX 12x20-4, INCLUYE: OBRA FALSA (APUNTALAMIENTO) Y CIMBRA COMUN PARA FRONTERAS, AJUSTES Y SALIDAS DE CENTRO, RAMPA PARA COLADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, ELABORACION, ACARREO, VACIADO, COLADO, EXTENDIDO, VIBRADO, LECHADEADO DE CEMENTO GRIS-AGUA 3 HORAS POSTERIORES AL ACABADO CERRADO A PLANA, CURADO CON CURACRETO BASE AGUA A RAZON DE 0.50 LT/M2, SE INCLUIRA TAMBIEN UNA FRANJA DE CELOTEX DE 13mm. DE ESPESOR Y 20 cm. DE ANCHO PARA FORJAR LA JUNTA CONSTRUCTIVA ENTRE VIVIENDAS, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO OFICIAL, TRABAJO TERMINADO. | M2 | 73.2 | $2,220.27 | $162,523.76 |
| 9 | PRETIL DE 20 cm. DE ALTURA Y 12 cm. DE ESPESOR, A BASE DE BLOCK PESADO DE CONCRETO DE 12x20x40cm., JUNTEADO CON MEZCLA DE MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:4, RELLENO CON PEDACERA DE BLOCK Y MEZCLA DE MORTERO, INCLUYE : CHAFLAN DE MORTERO DE 5 cm. DE ALTURA EN PARTE INTERIOR DE PRETIL, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, ELABORACIÓN, ACARREOS, VIBRADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO OFICIAL, TRABAJO TERMINADO. | ML | 81 | $173.73 | $14,072.13 |
| 10 | RELLENO DE AZOTEAS PARA DAR PENDIENTES, A BASE DE TEPETATE, EN ESPESOR PROMEDIO DE 5 CM., INCLUYE: SUMINISTROS, MATERIALES EN LA OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, MUESTREO, TRABAJO TERMINADO. | M3 | 5.1 | $623.58 | $3,180.26 |
| 11 | ENTORTADO EN AZOTEAS, EN ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM, A BASE DE MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES EN OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS, ELEVACIONES, MUESTREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO. | M2 | 79.08 | $207.79 | $16,432.03 |
| 12 | ENLADRILLADO EN AZOTEA, CON LADRILLO DE BARRO ROJO COMUN DE 2 x 12 x 24 CM. (CUÑA), ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, EN JUNTAS MÁXIMAS DE 0.50 CM., PETATILLO O CUATRAPEADO, ACABADO CHALPAQUEADO CON CEMENTO-ARENA CERNIDA O FINA , INC. MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, VACIADO, EXTENDIDO, TERMINADO Y ACARREO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO OFICIAL, TRABAJO TERMINADO. | M2 | 79.08 | $502.43 | $39,732.16 |

Obra: CONSTRUCCIÓN DE 06 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA BAJA. ZONA 04 - PB

Ubicación: VARIAS COMUNIDADES, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: CONSTRUCTORA 31-20, S.A. DE C.V. (624)

| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | GRUPO: CONSTRUCCION DE 06 RECAMARAS ADICIONALES EN PLANTA BAJA. ZONA 04-PB. VARIAS COMU | | | | |
| | PARTIDA: CUBIERTA DE AZOTEA | | | | |
| 13 | FORJADO DE CHAFLAN SOBRE PRETILES DE COLINDANCIA EN CAMBIOS DE NIVEL Y BASES DE TINACOS, A BASE DE MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:4 DE12 CM. DE ANCHO Y 5 CM DE ALTO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, ELABORACION, ACARREOS, ELEVACION, ACOMODO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y ACARREOS DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO OFICIAL, TRABAJO TERMINADO. | ML | 42 | $72.29 | $3,036.18 |
| 14 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GÁRGOLA PREFABRICADA DE CONCRETO, DE 12x50 CM. | PZA | 6 | $553.16 | $3,318.96 |
| | | | Totales por Partida | | $242,295.49 |
| | PARTIDA: INSTALACION ELECTRICA | | | | |
| 15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR DOBLE (MARCA BTICINO. DESCRIPCION DE LINEA QUINZIÑO EVOLUCION. CODIGO QN5800. INCLUYE: BASE PARA APAGADOR MISMA LINEA, CAJA PARA EMPOTRAR MISMA MARCA Y TAPA DE LA MISMA LINEA CON DOS VENTANAS, MATERIAL DE FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | SAL | 6 | $503.45 | $3,020.70 |
| 16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DOBLE (MARCA BTICINO. DESCRIPCION DE LINEA QUINZIÑO EVOLUCION. CODIGO QN28D. INCLUYE: CAJA PARA EMPOTRAR MISMA MARCA Y TAPA DE LA MISMA LINEA CON DOS VENTANAS, MATERIAL DE FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | SAL | 12 | $541.37 | $6,496.44 |
| 17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO EN MURO Y/O TECHO. INCLUYE: PORTALAMPARA MARCA BTICINO. DESCRIPCION DE LINEA: OVAL CODIGO P21B, CAJA CUADRADA DE 4" X 4" PARA EMPOTRAR, MATERIAL DE FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | SAL | 12 | $427.71 | $5,132.52 |
| 18 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE TIPO THW-LS, 75ºC, CALIBRE 12 AWG, PARA 600 V, DE COBRE, MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: COCAS, PUNTAS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, MEDIDO DE CENTRO DE REGISTRO A CENTRO DE REGISTRO. MATERIAL Y MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO. | ML | 88.2 | $39.70 | $3,501.54 |
| 19 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE TIPO THW-LS, 75ºC, CALIBRE 14 AWG, PARA 600 V, DE COBRE, MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: COCAS, PUNTAS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, MEDIDO DE CENTRO DE REGISTRO A CENTRO DE REGISTRO. MATERIAL Y MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO. | ML | 44.5997077732 | $34.22 | $4,948.20 |
| 20 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALIZACIÓN DE 1 VIA EN PISO Y/O LOSA DE POLIDUCTO TIPO MACH DE 19MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, CORTE CON DISCO, DEMOLICIÓN DE MURO DE TABIQUE Y/O CONCRETO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN; SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TENDIDO DE MANGUERA POLIDUCTO TIPO MACH DE 19 MM (3/4") SERVICIO PESADO, GUIADO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16; RESANE DE RANURAS CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:5, PREPARACION DE APARATOS EN MURO (ACABADO IGUAL AL EXISTENTE), MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO, TRABAJO TERMINADO. | ML | 73.2 | $109.11 | $7,986.85 |

Obra: CONSTRUCCIÓN DE 06 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA BAJA. ZONA 04 - PB

Ubicación: VARIAS COMUNIDADES, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: CONSTRUCTORA 31-20, S.A. DE C.V. (624)

| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO: | CONSTRUCCION DE 06 RECAMARAS ADICIONALES EN PLANTA BAJA. ZONA 04-PB. VARIAS COMU | | | | |
| PARTIDA: | INSTALACION ELECTRICA | | | | |
| 21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TELEVISION MARCA BTICINO. DESCRIPCION DE LINEA: QUINZIÑO EVOLUCION. INCLUYE: GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO. TAPA PILOTO No. DE CODIGO QN100R/CB. CAJA PARA EMPOTRAR MISMA MARCA. MOD 503MS MATERIAL DE FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | SAL | 6 | $447.83 | $2,686.98 |
| 22 | REHABILITACIÓN Y REVISIÓN DE SALIDA DE CENTRO PARA LUMINARIA. INCLUYE: CABLE TIPO THW-LS, 90ºC CALIBRE 14 AWG PARA 600 V DE COBRE MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD, CABLEADO, CAJA DE REGISTRO, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZAS. | SAL | 6 | $425.63 | $2,553.78 |
| | | | | Totales por Partida | $36,327.01 |
| PARTIDA: | HERRERIA, CANCELERIA Y CARPINTERIA | | | | |
| 23 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TIPO VALSAPANEL LISA (1-1/2" de espesor) O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y APARIENCIA, COLOR BLANCO OSTION DE 0.90 x 2.10 m. INCLUYE: CHAPA PHILLIPS RECAMARA CON LLAVE, LATON BRILLANTE COD.GAMA 81144, 3 BISAGRAS DE LATON DE 3" TIPO LIBRO, MARCO DE PERFIL TUBULAR PROLAMSA M-225 Y M-103 EN ANTEPECHOS CALIBRE 18, FIJADO CON TAQUETES Y PIJAS DEL No. 3 Y TERMINADO CON PINTURA DE ESMALTE A 2 MANOS (COLOR POR DEFINIR EN OBRA) , ACRILASTIC PARA SELLADO PERIMETRAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DESPERDICIOS, TRABAJO TERMINADO. INCLUYE ADEMAS PREPARACION PARA FIJAR ANTEPECHO Y COLOCACION DE VIDRIO TIPO GOTA DE AGUA Y/O CHINO. | PZA | 6 | $7,876.40 | $47,258.40 |
| 24 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 1.20 x 1.20 M., UN FIJO Y UN CORREDIZO, VALSA O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y APARIENCIA, INCLUYE: VIDRIO MEDIO DOBLE DE 3 MM. DE ESPESOR, SILICON Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU FIJACION, ACRILASTIC PARA SELLADO PERIMETRAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA FINAL, TRABAJO TERMINADO. (DISEÑO CONFORME A PROYECTO DE CANCELERIA DEL PROGRAMA "VIVIENDA DIGNA" 2014). | PZA | 6 | $6,361.55 | $38,169.30 |
| | | | | Totales por Partida | $85,427.70 |
| PARTIDA: | ACABADOS PLAFON Y MUROS EXTERIORES | | | | |
| 25 | APLANADO FINO EN MUROS Y PRETILES DE FACHADAS, A BASE DE MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6 HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M., TERMINADA CERRADO CON PLANA, REMATES RECTOS, PERFILADO DE ARISTAS VIVAS A PLOMO Y REGLA, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO OFICIAL, TRABAJO TERMINADO. | M2 | 190.2 | $286.22 | $54,439.04 |
| 26 | APLANADO DE YESO EN PLAFONES, A TIRON Y REGLA, ACABADO PULIDO, INCLUYE: METAL DESPLEGADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO OFICIAL, TRABAJO TERMINADO. | M2 | 61.08 | $223.88 | $13,674.59 |

Obra: CONSTRUCCIÓN DE 06 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA BAJA. ZONA 04 - PB

Ubicación: VARIAS COMUNIDADES, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: CONSTRUCTORA 31-20, S.A. DE C.V. (624)

| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | GRUPO: CONSTRUCCION DE 06 RECAMARAS ADICIONALES EN PLANTA BAJA. ZONA 04-PB. VARIAS COMU | | | | |
| | PARTIDA: ACABADOS PLAFON Y MUROS EXTERIORES | | | | |
| 27 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL-ACRILICA COLOR BLANCO SOBRE PLAFONES DE YESO DEBIENDO CUMPLIR LA PINTURA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PINTURA PARA USO DE INTERIORES Y EXTERIORES, NO DEBE CONTENER PLOMO, ACABADO SATINADO, SOLIDOS EN VOLUMEN 30+-3%, LAVABILIDAD MAYOR A 5000 CICLOS CON SOLUCION ABRASIVA Y DURABILIDAD DE 8 AÑOS, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y MANOS DE PINTURA SUFICIENTES PARA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, LIMPIEZAS GRUESAS, CLASIFICACION VINIL-ACRILICAS ANTES DE LA APLICACION DE LA PINTURA EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA SUPERVISION DE LA SECRETARIA LA FICHA TECNICA DE LA PINTURA ASI COMO LA CERTIFICACION DE LA MARCA Y MODELO DE LA PINTURA EMITIDA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO. | M2 | 91.5 | $137.97 | $12,624.25 |
| | | | Totales por Partida | | $80,737.89 |
| | PARTIDA: LIMPIEZA GRUESA Y FINAL | | | | |
| 28 | LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA. INCLUYE: SACAR ESCOMBRO, ACARREO Y TIRO DEL MISMO HASTA EL SITIO AUTORIZADO O INDICADO POR SUPERVISION SOPMA, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN. | M2 | 72.54 | $68.74 | $4,986.40 |
| 29 | LIMPIEZA FINAL DE CUARTO ADICIONAL. INCLUYE:PISOS, VIDRIOS, HERRERIA, CON AGUA Y JABON. | M2 | 73.2 | $37.74 | $2,762.57 |
| | | | Totales por Partida | | $7,748.97 |
| | PARTIDA: MEJORAS A RECAMARA ADICIONAL | | | | |
| 30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA CERAMICA DE 1a. 33X33 CM MARCA PORCELANITE FALCON COLOR HUESO Y BEIGE. ASENTADO CON PEGAPISO GRIS PERDURA CON BOQUILLA DE 1/4" MARCA PERDURA COLOR NUEZ. INCLUYE: ALINEADO, NIVELADO, CORTES CON CORTADORA DE DISCO, AJUSTES, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS. | M2 | 67.62 | $523.66 | $35,409.89 |
| 31 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO CERAMICO DE 8cm. DE ALTO MARCA INTERCERAMIC FORMADO CON EL CORTE DE PIEZA DE LA LOSETA CERAMICA LINEA DESERT DUBAI SECCION 33X33CM. ASENTADO CON ADHESIVO GRIS INTERCERAMIC CON BOQUILLA DE 1/4" MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR. INCLUYE: ALINEADO, NIVELADO, CORTES CON CORTADORA DE DISCO, AJUSTES, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS. | ML | 72.3 | $138.90 | $10,042.47 |
| 32 | APLANADO FINO EN MUROS INTERIORES, A BASE DE STUCO OBRA HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M., TERMINADA CERRADO CON PLANA, REMATES RECTOS, PERFILADO DE ARISTAS VIVAS A PLOMO Y REGLA, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO OFICIAL, TRABAJO TERMINADO. | M2 | 171 | $220.75 | $37,748.25 |
| 33 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION METALICA SECCION 1.40X1.40M. A BASE DE CUADRADO DE 1/2" PARA VENTANA. INCLUYE: FIJACION A MURO, BARRAR, ARMARSE, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 6 | $5,810.82 | $34,864.92 |


Obra: CONSTRUCCIÓN DE 06 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA BAJA. ZONA 04 - PB

Ubicación: VARIAS COMUNIDADES, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: CONSTRUCTORA 31-20, S.A. DE C.V. (624)

| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | GRUPO: CONSTRUCCION DE 06 RECAMARAS ADICIONALES EN PLANTA BAJA. ZONA 04-PB. VARIAS COMU | | | | |
| | PARTIDA: MEJORAS A RECAMARA ADICIONAL | | | | |
| 34 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL-ACRILICA COLOR BLANCO SOBRE MUROS DE APLANADO FINO DEBIENDO CUMPLIR LA PINTURA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PINTURA PARA USO DE INTERIORES Y EXTERIORES, NO DEBE CONTENER PLOMO, ACABADO SATINADO, SOLIDOS EN VOLUMEN 30+-3%, LAVABILIDAD MAYOR A 5000 CICLOS CON SOLUCION ABRASIVA Y DURABILIDAD DE 8 AÑOS, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y MANOS DE PINTURA SUFICIENTES PARA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, LIMPIEZAS GRUESAS, CLASIFICACION VINIL-ACRILICAS ANTES DE LA APLICACION DE LA PINTURA EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA SUPERVISION DE LA SECRETARIA LA FICHA TECNICA DE LA PINTURA ASI COMO LA CERTIFICACION DE LA MARCA Y MODELO DE LA PINTURA EMITIDA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO. | M2 | 358.8 | $137.97 | $49,503.64 |
| 35 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOGOTIPO DE SECCION DE 15X30 CM. Y 1.0 CM. DE ESPESOR A BASE DE TALAVERA CON LA LEYENDA "AGUASCALIENTES, LA CIUDAD DE TU VIDA" (VER DISEÑO EN PLANOS). INCLUYE: FIJACION A MURO, MATERIALES, MANO DE OBRA, CARGAS, ACARREOS, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 6 | $948.48 | $5,690.88 |
| 36 | DEMOLICION DE LOSAS DE CIMENTACION Y AZOTEA EXISTENTES DE LA VIVIENDA PARA ANCLAJES DE LAS NUEVAS DEL CUARTO ADICIONAL DE 20 CM DE ANCHO Y 7 CM DE ESPESOR | M3 | 0.9 | $796.37 | $716.73 |
| 37 | DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE PARA ADAPTAR PUERTA DE ACCESO A CUARTO ADICIONAL. | M2 | 11.88 | $461.11 | $5,477.99 |
| 38 | CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 KG/CM2 TMA 3/4", DE 15X15 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON ARMEX 15X15X4. INCLUYE: ACARREOS, SUMINISTROS, HABILITADO, COLADO, CURADO BASE AGUA, CIMBRADO COMÚN, DESCIMBRADO, TRABAJO TERMINADO. | ML | 7.5 | $328.94 | $2,467.05 |
| 39 | IMPERMEABILIZACION DE LA JUNTA CONSTRUCTIVA ENTRE LA LOSA DE AZOTEA DEL CUARTO Y LA VIVIENDA, A BASE DE ACRITON. | ML | 18 | $71.40 | $1,285.20 |

| | | |
|---|---|---|
| Totales por Partida | | $183,207.01 |
| Totales por Grupo | | $899,519.21 |
| Totales Presup. | | $899,519.21 |
| Anticipo | + | $269,855.76 |
| Amortizac. Ant. | - | $269,855.76 |
| SubTotal. Ant. | = | $899,519.21 |
| IVA | + | $0.00 |
| Total | = | $899,519.21 |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

# PRESUPUESTO MODIFICADO

Aguascalientes

Obra: CONSTRUCCIÓN DE 06 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA BAJA. ZONA 04 - PB

Ubicación: VARIAS COMUNIDADES, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: CONSTRUCTORA 31-20, S.A. DE C.V. (624)

| Grupo | Partida | Importe |
|---|---|---|
| CONSTRUCCION DE 06 RECAMARAS ADICIONALES EN PLANTA BAJA. ZONA 04-PB. VARIAS COMU | | |
| | PRELIMINARES | $7,925.13 |
| | CIMENTACION | $121,719.89 |
| | MUROS CADENAS Y CASTILLOS | $134,130.11 |
| | CUBIERTA DE AZOTEA | $242,295.49 |
| | INSTALACION ELECTRICA | $36,327.01 |
| | HERRERIA, CANCELERIA Y CARPINTERIA | $85,427.70 |
| | ACABADOS PLAFON Y MUROS EXTERIORES | $80,737.89 |
| | LIMPIEZA GRUESA Y FINAL | $7,748.97 |
| | MEJORAS A RECAMARA ADICIONAL | $183,207.01 |
| | Subtotal por Grupo | $899,519.21 |

| | | |
|---|---|---|
| Totales Presup. | | $899,519.21 |
| Anticipo | + | $269,855.76 |
| Amortizac. Ant. | - | $269,855.76 |
| SubTotal. Ant. | = | $899,519.21 |
| IVA | + | $0.00 |
| Total | = | $899,519.21 |


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES


H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**
**DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA**


# MEMORIA FOTOGRAFICA


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | FISMDF-0092-2022 CONSTRUCCIÓN DE 06 RECÁMARAS ADICIONALES PLANTA BAJA VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES Mpio. | | | | | |
| NO. DE CONTRATO: | FISMDF-0092-2022 | | CONTRATISTA: | CONSTRUCTORA 31-20, S.A. DE C.V. | | |


## INICIO.

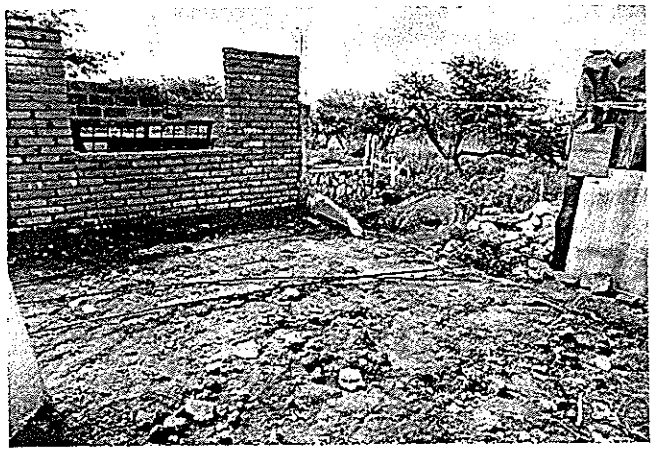


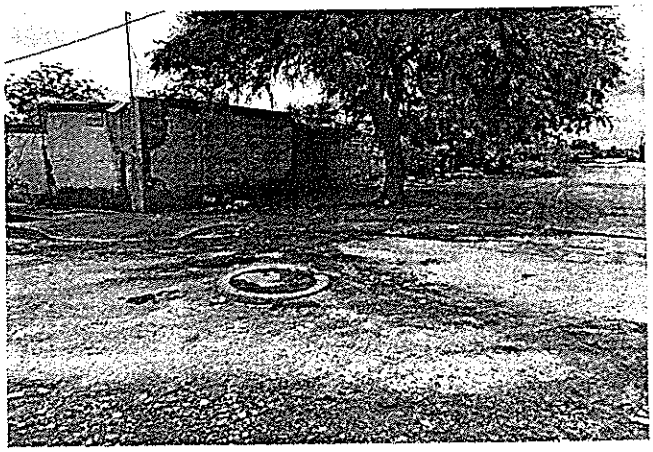

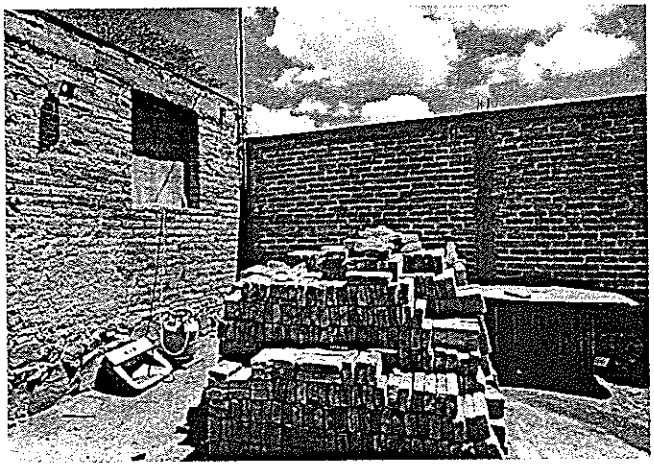

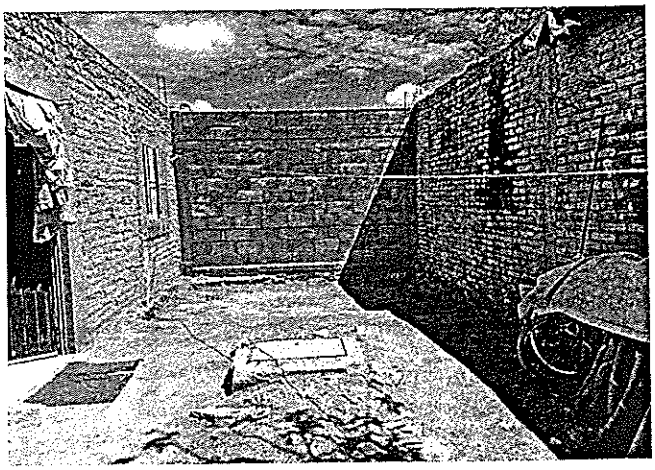

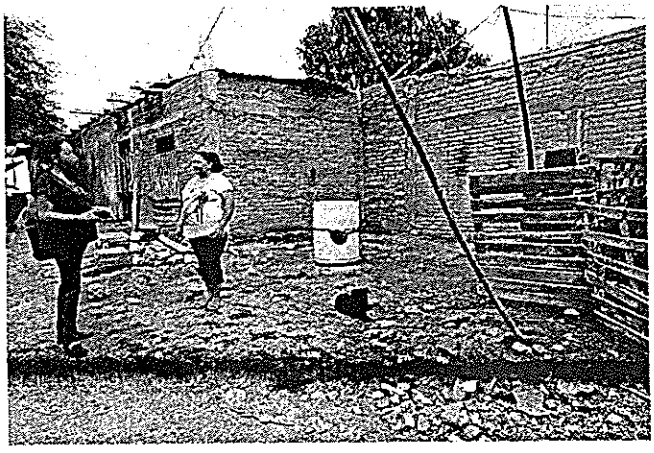

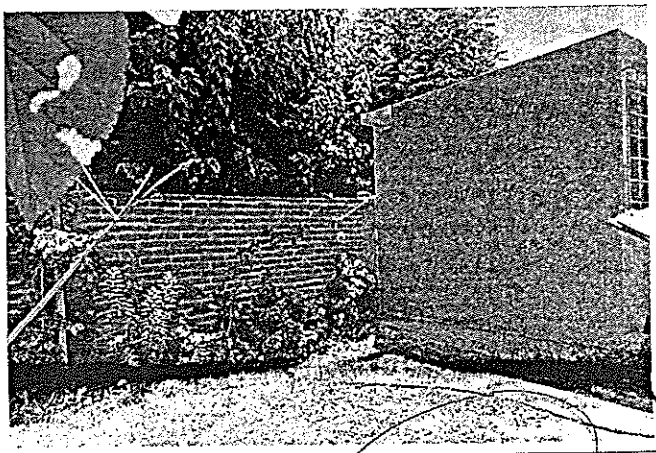

ARQ. Celio MURO CORNEJO
SUPERVISOR DE OBRA.


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES


# H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
## SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
## DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

# MEMORIA FOTOGRAFICA


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | FISMDF-0092-2022 CONSTRUCCIÓN DE 06 RECÁMARAS ADICIONALES PLANTA BAJA VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES Mpio. | | | | | |
| NO. DE CONTRATO: | FISMDF-0092-2022 | | CONTRATISTA: | CONSTRUCTORA 31-20, S.A. DE C.V. | | |


## PROCESO

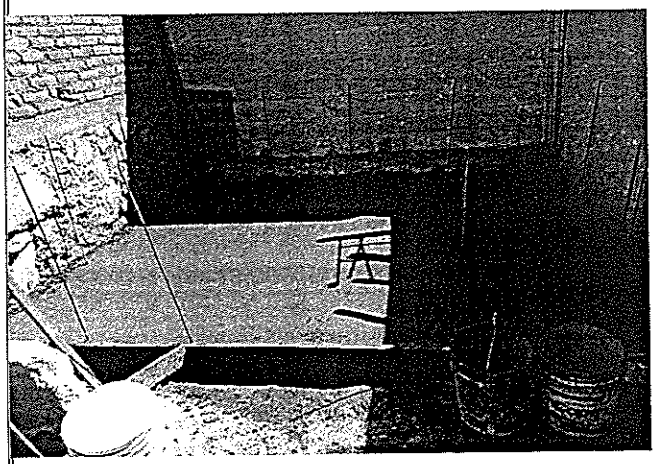


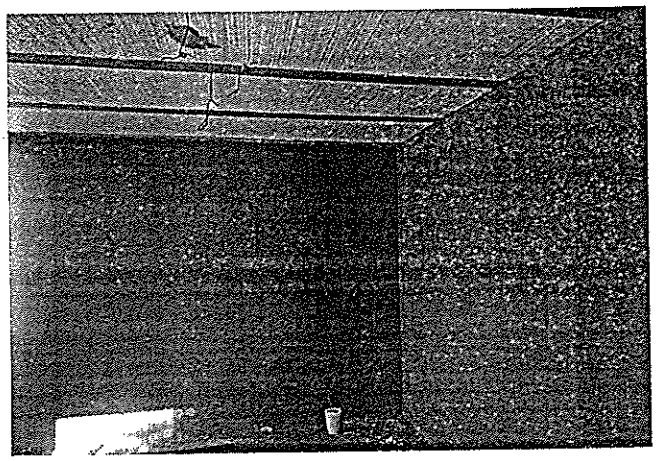




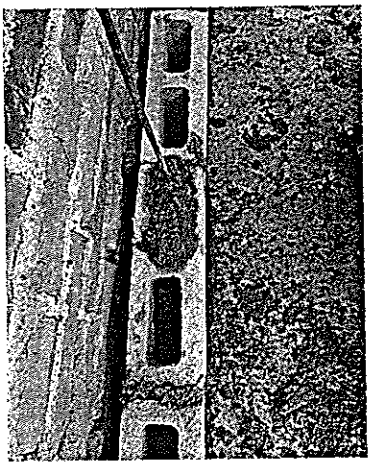

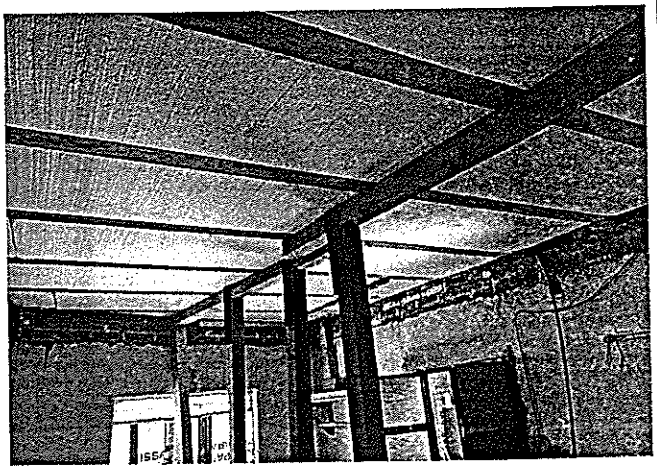

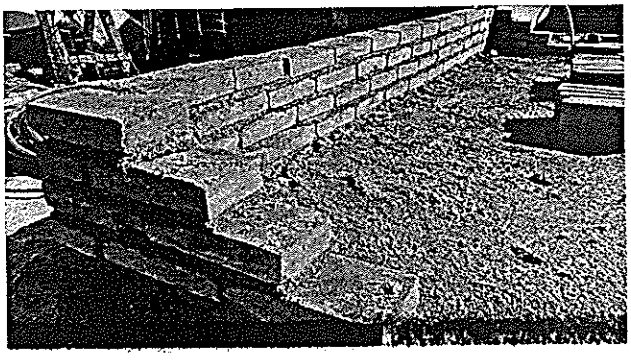

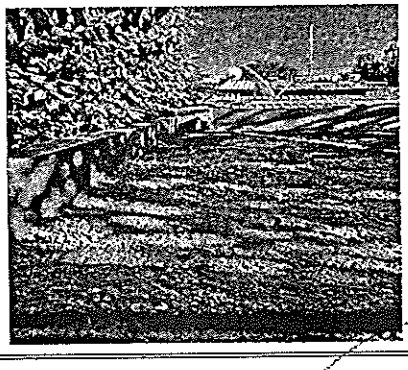

ARQ. Celio MURO CORNEJO
SUPERVISOR DE OBRA.


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

# H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
## SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
## DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


# MEMORIA FOTOGRAFICA


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | FISMDF-0092-2022 CONSTRUCCIÓN DE 06 RECÁMARAS ADICIONALES PLANTA BAJA VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES Mpio. | | | | | |
| NO. DE CONTRATO: | FISMDF-0092-2022 | | CONTRATISTA: | CONSTRUCTORA 31-20, S.A. DE C.V. | | |


## TERMINO

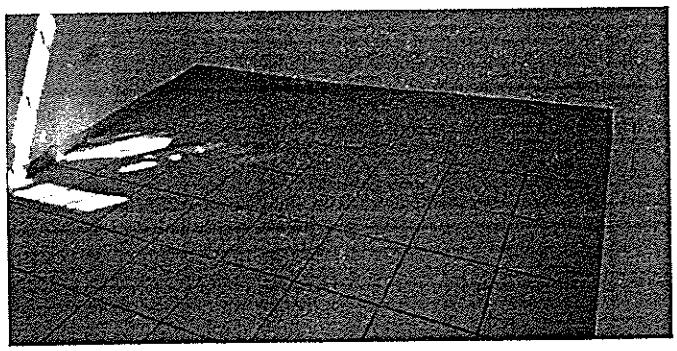




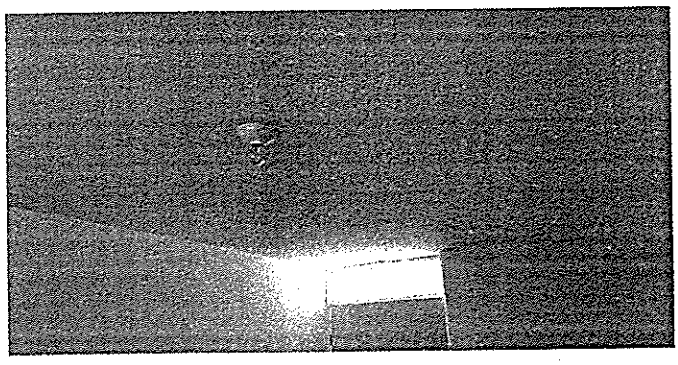

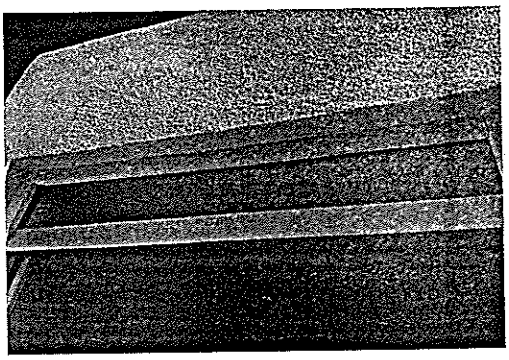



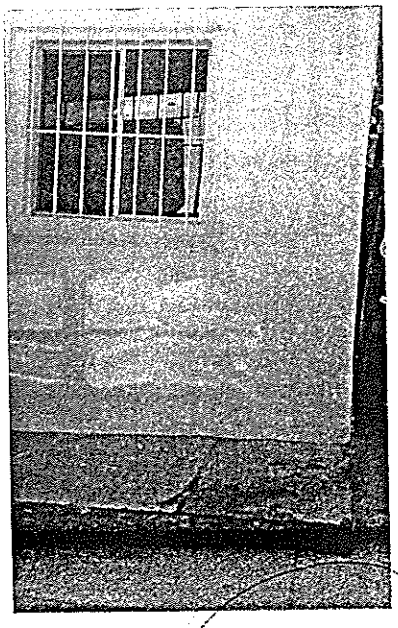

ARQ. Celio MURO CORNEJO
SUPERVISOR DE OBRA

# MODIFICADO

## SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

### DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

## EJERCICIO 2022

**N° DE CONTRATO:** FISMDF-0092-2022

**NOMBRE DE LA OBRA:** FISMDF-0092-2022 CONSTRUCCIÓN DE 06 RECÁMARAS ADICIONALES PLANTA BAJA VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES Mpio.

**MONTO MODIFICADO FINAL:** $899,519.21

| VOLUMEN | UNIDAD | COMPONENTE DE LA OBRA | MONTO |
|---|---|---|---|
| 73.20 | m² | CIMENTACION A BASE DE DENTELLON DE CONCRETO PERIMETRAL Y | $ 129,645.02 |
| 163.50 | m² | MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO PESADO DE 12 x 20 x 40 cm., | $ 134,130.11 |
| 73.20 | m² | LOSA HORIZONTAL A BASE DE SEMIVIGUETA DE CONCRETO 12x15 Y | $ 242,295.48 |
| 12.00 | Pieza | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA | $ 36,327.02 |
| 6.00 | Pieza | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TIPO VALSAPANEL LISA (1- | $ 80,737.88 |
| 190.20 | m² | APLANADO FINO EN MUROS Y PRETILES DE FACHADAS, A BASE DE | $ 93,176.67 |
| 358.80 | m² | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL-ACRILICA COLOR | $ 183,207.02 |
| | | TOTAL PRESUP. | $ 899,519.21 |
| | | IVA | $ - |
| | | TOTAL | $ 899,519.21 |

**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** ARQ. Celio MURO CORNEJO

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

## SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS


## DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

# LISTA DEFINITIVA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | FISMDF-0092-2022 CONSTRUCCIÓN DE 06 RECÁMARAS ADICIONALES PLANTA BAJA VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES Mpio. | | | | | |
| CONTR | FISMDF-0092-2022 | | CONTRATISTA: | CONSTRUCTORA 31-20, S.A. DE C.V. | | |


| cvo | FOLIO | NOMBRE COMPLETO PROPIETARIO | CALLE | No EXT | No INT | COLONIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P BAJA | MARIA ISABEL CASTORENA DE LUNA | CARR AL HOTELITO | 1283 | 0 | EL COLORADO (EL SOYATAL) |
| 2 | P BAJA | MARIA ENEDINA DE LIRA RODRIGUEZ | 14 DE AGOSTO | 306 | 0 | JALTOMATE |
| 3 | P BAJA | RUBEN PEREZ RUVALCABA | IGNACIO ZARAGOZA | 417 | 0 | EL TARAY |
| 4 | P BAJA | REBECA MEZA REYES | RIO YAQUI | 15 | 0 | MONTORO |
| 5 | P BAJA | M BARTOLA FLORES REYES | 20 DE NOVIEMBRE | 316 | 0 | ESTACION CAÑADA HONDA |
| 6 | P BAJA | MARIEL MARTINEZ CABALLERO | BENITO JUAREZ | 115 | 0 | JALTOMATE |

ARQ. Celio MURO CORNEJO
SUPERVISOR DE OBRA.

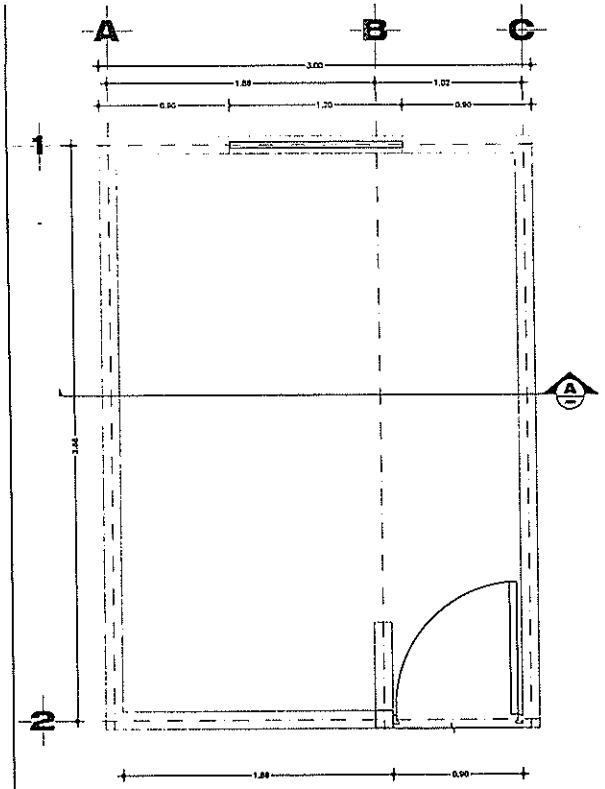



## PLANTA ARQUITECTONICA

ESCALA 1:15

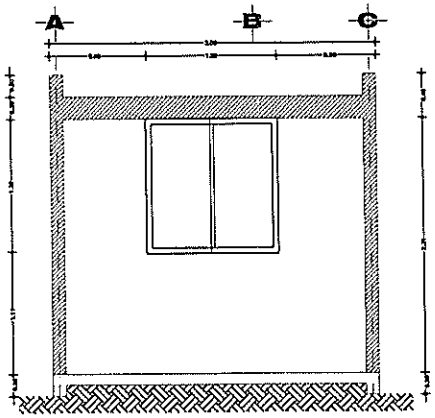


## CORTE

ESCALA 1:20

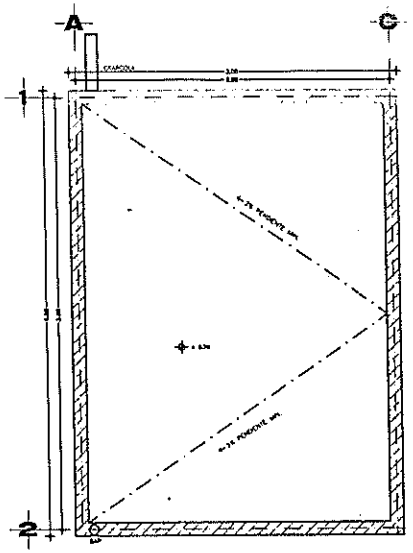


## PLANTA DE AZOTEA

ESCALA 1:20

**SIMBOLOGIA:**

PRESIDENTE MUNICIPAL
Lic. Leonardo Montañez Castro.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS.
ARQ. GLORIA GUADALUPE CASTILLO GONZALEZ

REV. FECHA: OBSERVACIONES:


DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA

TITULO
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN PLANTA BAJA

CONTENIDO:
PLANTA ARQUITECTONICA
PLANTA DE AZOTEA


UBICACION:
VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD

CLAVE:
AR-01

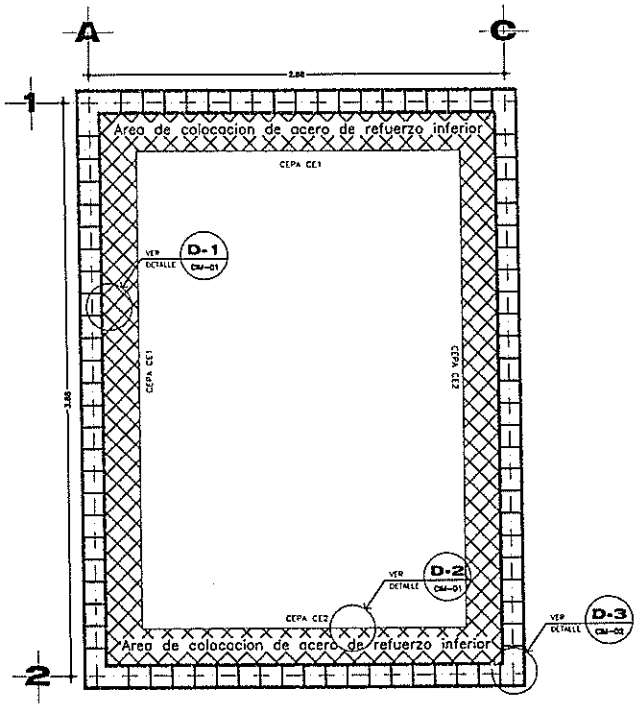



## LOSA DE CIMENTACION

ESCALA 1:15

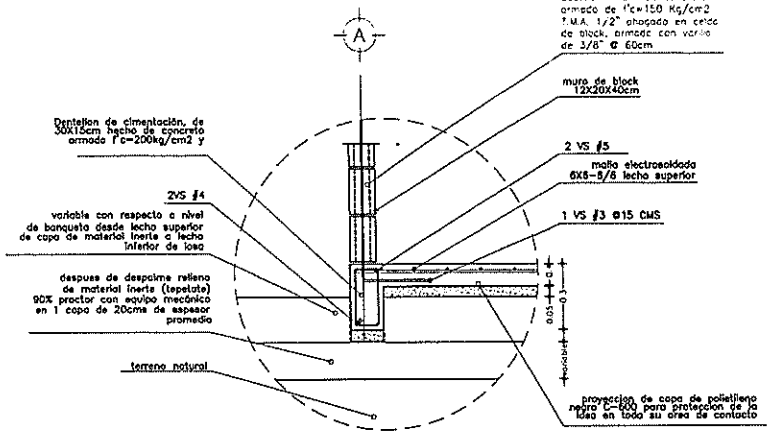


**DETALLE** 1 (CIM-1)

CEPA CE1 ESCALA 1:10

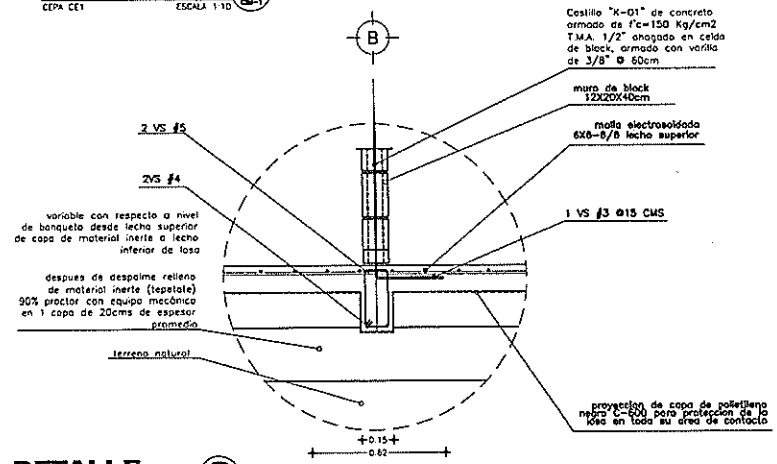


**DETALLE** 2 (CIM-1)

CEPA CE2 ESCALA 1:10

**LOCALIZACION:**

**SIMBOLOGIA:**

PRESIDENTE MUNICIPAL
Lic. Leonardo Montañez Castro.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. GLORIA GUADALUPE CASTILLO GONZALEZ

| REV. | FECHA | OBSERVACIONES: |
|---|---|---|

DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA


TITULO: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN PLANTA BAJA

CONTENIDO: PLANO DE CIMENTACION DETALLES

UBICACION: VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD


0

CLAVE: CIM-01

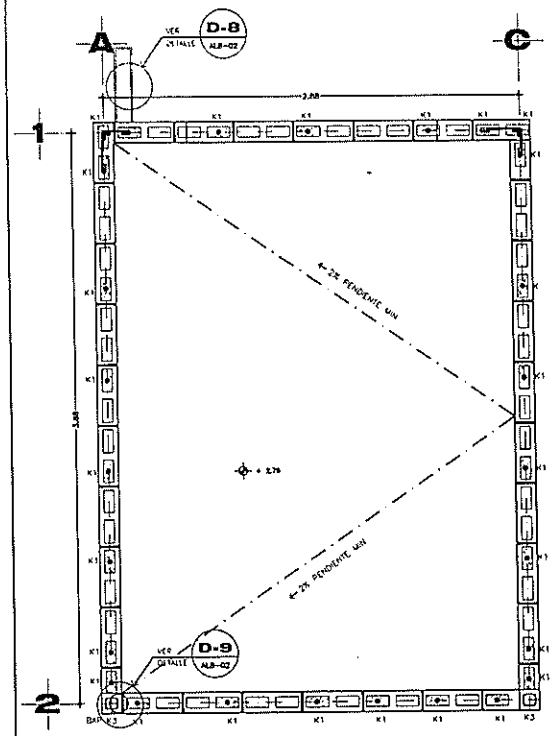


## PLANTA DE ALBAÑILERIA AZOTEA


ESCALA 1:15





Frente


## DETALLE 8

ESCALA 1:10

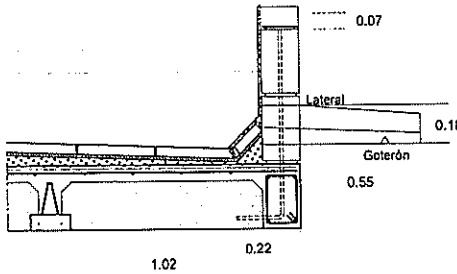

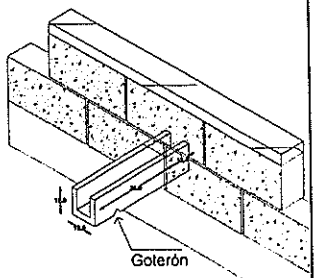
GARGOLA
Gargola prefabricada de concreto de 12X12X50cms

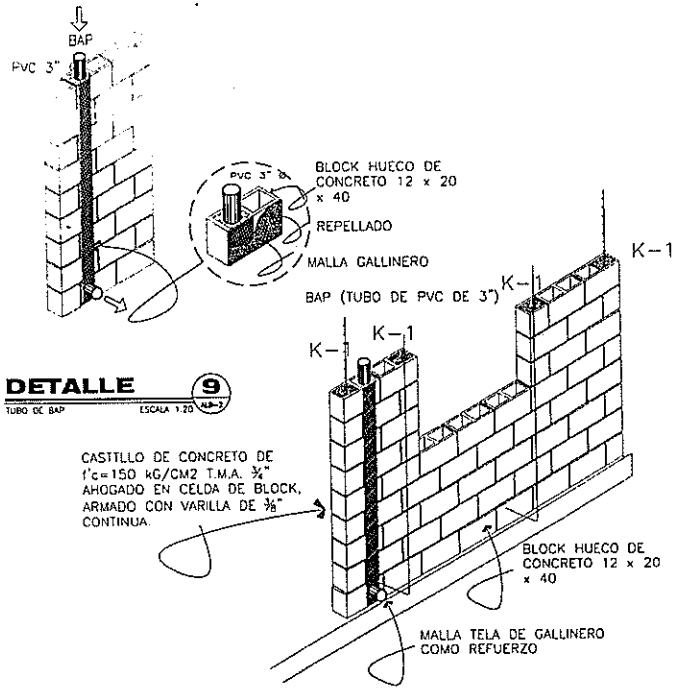


## DETALLE 9

TUBO DE BAP ESCALA 1:20

**LOCALIZACION:**

**SIMBOLOGIA:**

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

PRESIDENTE MUNICIPAL
Lic. Leonardo Montañez Castro.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. GLORIA GUADALUPE CASTILLO GONZALEZ

| REV. | FECHA | OBSERVACIONES: |
|---|---|---|

DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA


TITULO: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN PLANTA BAJA

CONTENIDO: PLANO DE ALBAÑILERIA PLANTA DE AZOTEA Y DETALLES

UBICACION: VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD


0


CLAVE: AL8-02

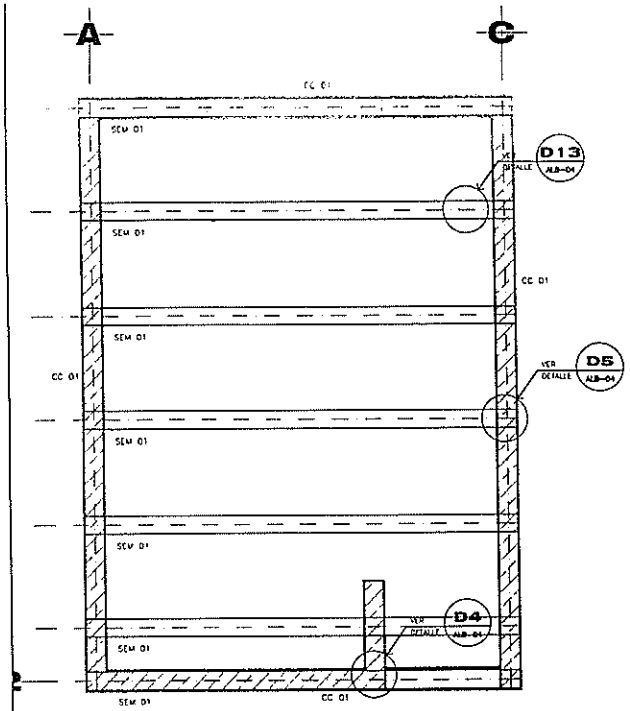



## COLOCACION DE SEMIVIGUETAS

ESCALA 1:15








**DETALLE 4**
SEMIVIGUETA — ESCALA 1:10

**DETALLE 13**
SEMIVIGUETA 01 — ESCALA 1:5




DISTRIBUCION TIPO




**DETALLE 5**
SEMIVIGUETA — ESCALA 1:10

**SIMBOLOGIA:**

SEM 01
SEMIVIGUETA 12CMSX15CMS
PATIN DE CONCRETO

CC 01
CADENA DE CERRAMIENTO
ARMEX 12X20-4

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

PRESIDENTE MUNICIPAL
Lic. Leonardo Montañez Castro.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. GLORIA GUADALUPE CASTILLO GONZALEZ


REV. | FECHA: | OBSERVACIONES:

DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA.

TITULO: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN PLANTA BAJA
CONTENIDO: PLANO DE ALBAÑILERIA COLOCACION SEMIVIGUETA Y DET.
UBICACION: VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD


0

CLAVE: ALB-04

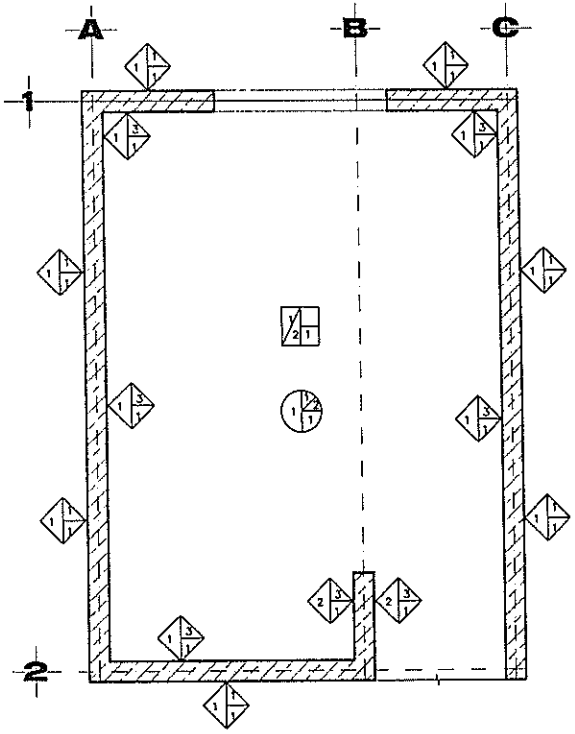


## PLANTA DE ACABADOS

ESCALA 1:15

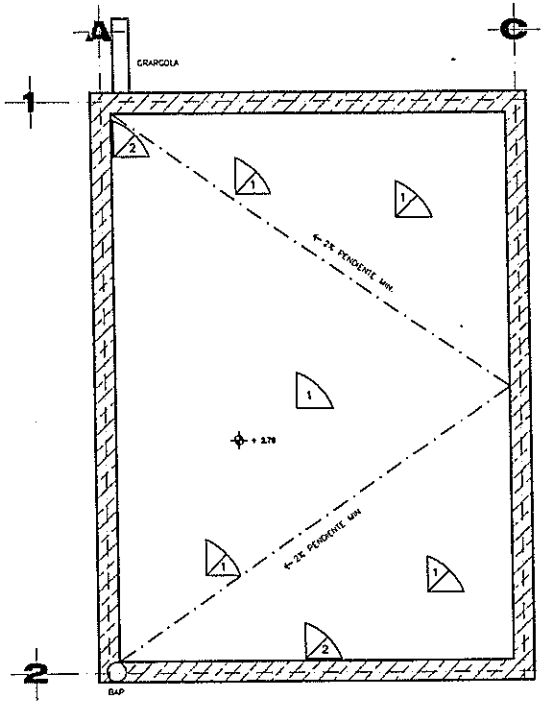


## PLANTA DE AZOTEA

ESCALA 1:15

**SIMBOLOGIA:**

ACABADOS

PISOS INICIAL FINAL

MUROS INICIAL INTERMEDIO FINAL

PLAFONES INICIAL INTERMEDIO FINAL

AZOTEA INICIAL INTERMEDIO FINAL

PRESIDENTE MUNICIPAL
Lic. Leonardo Montañez Castro.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. GLORIA GUADALUPE CASTILLO GONZALEZ

REV. FECHA OBSERVACIONES:


DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA

TITULO: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN PLANTA BAJA

CONTENIDO: PLANO DE ACABADOS

UBICACION: VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD

CLAVE: ACA-01

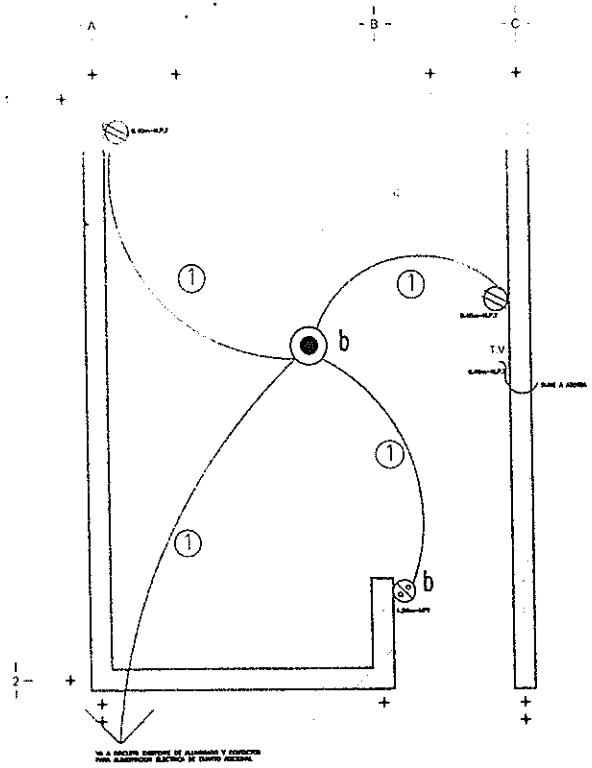
A
B
C
1
2
b
b
T.V
BAJA A ARDEA
1
2
1
1
1
